

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
 MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022



DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22125	
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	
EMPRESA	ZARATE	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	04/10/2022	12/10/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	04/10/2022	12/10/2022

ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$178,336.63
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$178,336.63

NUMERO DE BENEFICIARIOS	
HOMBRES	24
MUJERES	36
TOTAL	60

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	SANTA CRUZ AJAJALPAN
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	610105.43 - 2095860.37

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

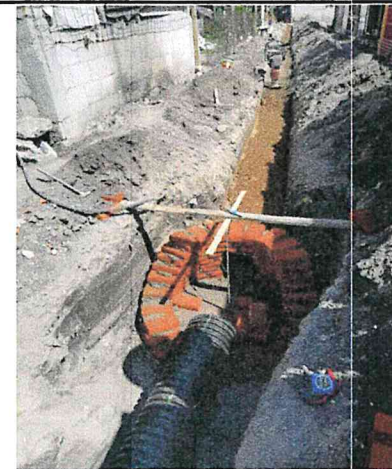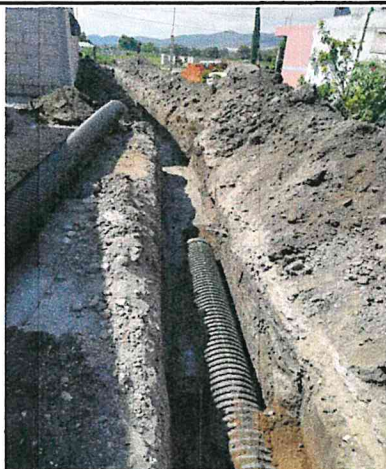

Municipio de SANTA CRUZ AJAJALPAN
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
