






TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: ENERO 2023
FECHA DE ELABORACION: 07 DE FEBRERO DE 2023

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NUMERO DE OBRA (22229), NOMBRE DE LA OBRA (RECONSTRUCCION CON ADOQUIN DE LA CALLE 2 PONIENTE DE LA CABECERA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA), EMPRESA (GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V.), PROGRAMAS (FORTAMUN 2022), and NUMERO DE BENEFICIARIOS (HOMBRES: 3,133; MUJERES: 2,971; TOTAL: 6,104).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: OBSERVACIONES (OBRA TERMINADA), AVANCE FISICO % (100%), and LOCALIDAD (TECALI CABECERA, POBREZA MODERADA, URBANO).

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

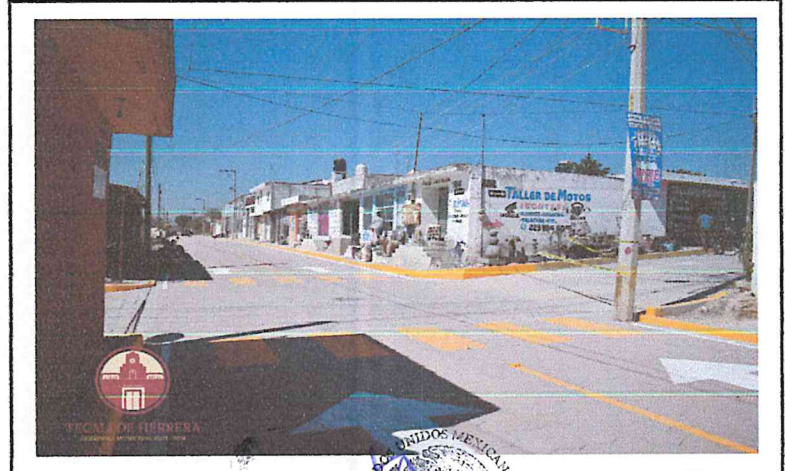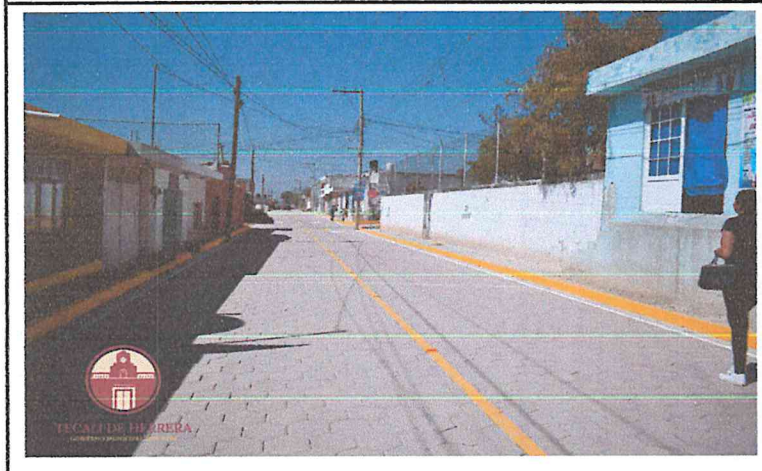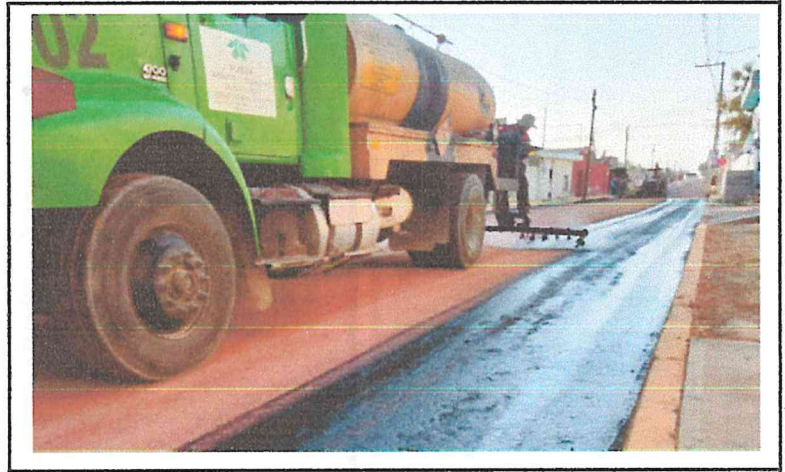

ING. FABIAN ADOLFO ROJAS OLIVARES
RESIDENTE DOPYDU

ING. IRVING VERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: ENERO 2023
FECHA DE ELABORACION: 02 DE ENERO DE 2023


Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NUMERO DE OBRA (22131), NOMBRE DE LA OBRA (MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE EN ESCUELA SECUNDARIA AMBROSIO HERRERA C.C.T. 21EES0175R, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA), EMPRESA (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ZARATE S.A. DE C.V.), PROGRAMAS/FONDO (FISM 2022), and a table for PROGRAMAS (CONTRACTUAL, DIFERIDO, CONVENIO REAL) with INICIO and TERMINACION dates.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: AREA TECNICA RESPONSABLE (OBSERVACIONES: OBRA EN PROCESO), AVANCE FISICO % (90%), and a table for IMPORTE CONTRATADO (A) \$168,392.69, (B) \$0.00, (C) \$0.00, TOTAL CONTRATADO \$168,392.69.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NUMERO DE BENEFICIARIOS (HOMBRES 3,133, MUJERES 2,971, TOTAL 6,104).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: LOCALIDAD (TECALI CABECERA, POBREZA MODERADA, URBANO), NOMBRE DE LA LOCALIDAD, REZAGO SOCIAL, ZAP, GEOLOCALIZACION (X 18.898894 - Y 97.967823).

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

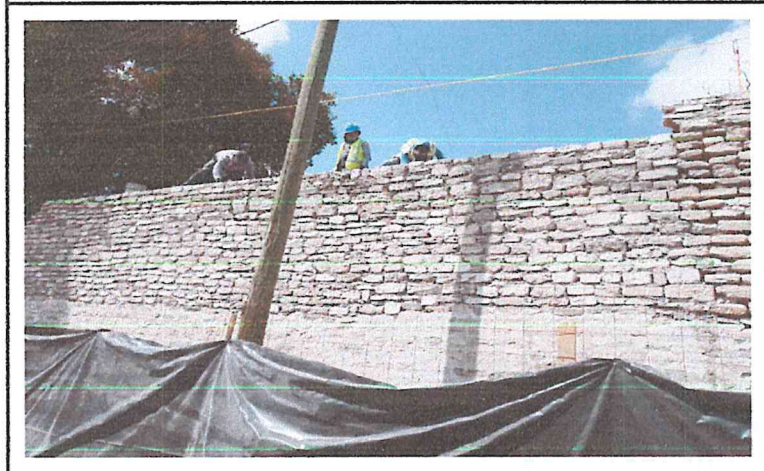

ING. FABIAN ADOLFO ROJAS OLIVARES
RESIDENTE DOPYDU

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MEXICO
MAYRA CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO



TECALI DE HERRERA

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

## REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS


### MES DE REPORTE: ENERO 2023

FECHA DE ELABORACION: 02 DE ENERO DE 2023

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22132	
NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN RANCHO LOS LAURELES, PERTENECIENTE AL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA	
EMPRESA	EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE CV.	
PROGRAMA/FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	30/11/2022	13/01/2023
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	30/11/2022	13/01/2023
NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES		28
MUJERES		24
TOTAL		52

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$748,353.49
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$748,353.49
LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECALI CABECERA
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	X 18.925174 - Y 97.960065

### REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

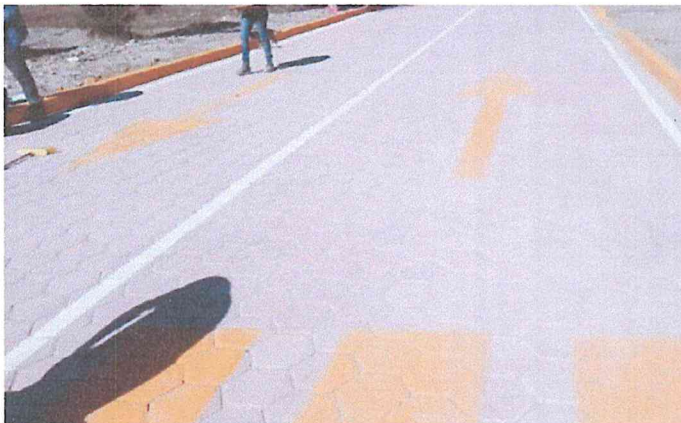

ING. FABIAN ADOLFO ROJAS OLIVARES  
RESIDENTE DOPYDU

ING. IRVING VERA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2022-2024  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Y DESARROLLO URBANO



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: ENERO 2023
FECHA DE ELABORACION: 07 DE FEBRERO DE 2023

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Sub-fields. Includes sections for 'DATOS GENERALES' and 'NÚMERO DE BENEFICIARIOS'.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes sections for 'ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE', 'OBSERVACIONES', 'OBRA TERMINADA', and 'LOCALIDAD'.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



ING. FABIAN ADOLFO ROJAS OLIVARES
RESIDENTE DOPYDU

ING. IRVING VERDE ENOZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO





TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: ENERO 2023
FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE FEBRERO DE 2023

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NUMERO DE OBRA (22336), NOMBRE DE LA OBRA (RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS...), EMPRESA (COMPAÑÍA PAVIMENTADORA...), PROGRAMAS (CONTRACTUAL, DIFERIDO, CONVENIO REAL), and a table for PROGRAMAS and RECURSOS PROPIOS.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: OBSERVACIONES (OBRA EN PROCESO) and AVANCE FISICO % (20%).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: (A) IMPORTE CONTRATADO (\$2,544,550.47), (B) ANTICIPO (\$763,365.14), (C) CONVENIO (\$0.00), and TOTAL CONTRATADO (\$2,544,550.47).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: HOMBRES (85), MUJERES (60), and TOTAL (145).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NOMBRE DE LA LOCALIDAD (AHUATEPEC), REZAGO SOCIAL (POBREZA MODERADA), ZAP (URBANO), and GEOLOCALIZACION (18.857608, -97.919386).

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



ING. IRVING VERA CRUZ
RESIDENTE CD/PyDU

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

ING. IRVING VERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
Ayuntamiento de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: ENERO 2023
FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE FEBRERO DE 2023



Table with project details: NUMERO DE OBRA (22437), NOMBRE DE LA OBRA, EMPRESA, PROGRAMAS, and a table for INICIO and TERMINACION.

Table with technical details: AREA TECNICA RESPONSABLE, OBSERVACIONES (OBRA EN PROCESO), AVANCE FISICO % (80%), and financial summary (TOTAL CONTRATADO \$1,946,470.40).

Table for NUMERO DE BENEFICIARIOS: HOMBRES (2,062), MUJERES (3,094), TOTAL (5,156).

Table for LOCALIDAD: BARRIO DE ANALCO, POBREZA MODERADA, ZAP, RURAL, GEOLOCALIZACION (18.901033, -97.978841).

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

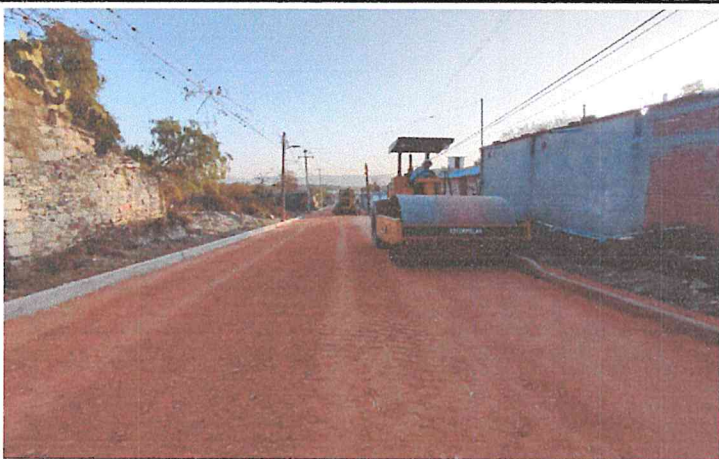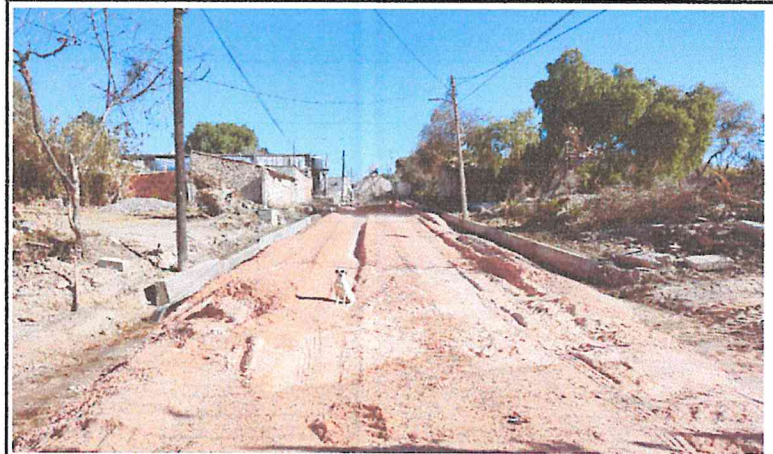

ING.FABIAN ADOLFO ROJAS OLIVARES
RESIDENTE DOPYDU

ING.IRVING VERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
