

00000



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: FEBRERO 2023
 FECHA DE ELABORACIÓN: 06 DE MARZO DE 2023


ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA EN PROCESO
AVANCE FÍSICO %	91%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$2,544,550.47
(B) ANTICIPO	\$763,365.14
(C) ESTIMACIÓN 1	\$246,160.40
(D) ESTIMACIÓN 2	\$599,662.97
TOTAL CONTRATADO	\$2,544,550.47

DATOS GENERALES	
NÚMERO DE OBRA	22336
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE AVENIDA REFORMA PUENTE Y CARRETERA TECALI-AHUATEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA
EMPRESA	COMPANÍA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V.
PROGRAMA/FONDO	RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA	TERMINACION
CONTRACTUAL	3/27/2023
DIFERIDO	
CONVENIO	
REAL	3/27/2023

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	AHUATEPEC
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	URBANO
GEOLOCALIZACION	18.857608, -97.919386

NÚMERO DE BENEFICIARIOS	
HOMBRES	85
MUJERES	60
TOTAL	145

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

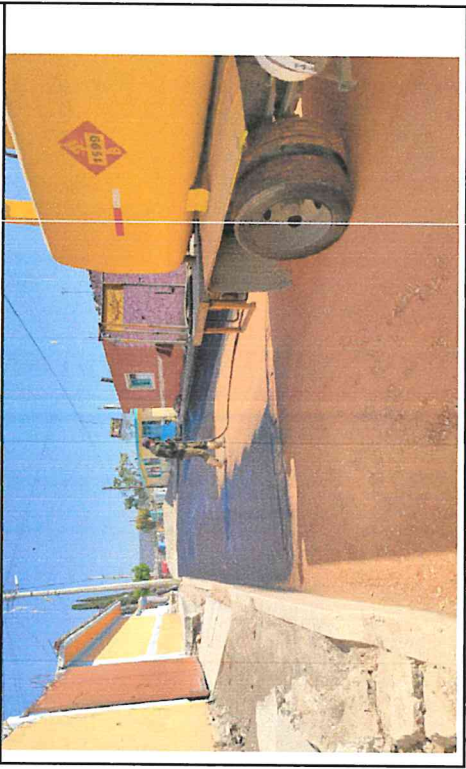

ING. IRVING VERA CRUZ
 PRESIDENTE DOPYDU

ING. IRVING VERA CRUZ
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Ayuntamiento 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
