

000002



TECALI DE HERRERA

**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**  
**REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS**  
**MES DE REPORTE: MARZO 2022**


FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ABRIL DE 2023

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE OBRA	22336		
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE AVENIDA REFORMA PUENTE Y CARRETERA TECALI-AHUATEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA		
EMPRESA	COMPANIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V.		
PROGRAMA/FONDO	RECURSOS PROPIOS		
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION	
CONTRACTUAL	28/12/2022	27/03/2023	
DIFERIDO			
CONVENIO			
REAL	28/12/2022	27/03/2023	
<b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>			
HOMBRES	85		
MUJERES	60		
TOTAL	145		

<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE:</b>	
OBSERVACIONES:	OBRA EN PROCESO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$2,544,550.47
(B) ANTICIPO	\$763,365.14
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$2,544,550.47
<b>LOCALIDAD</b>	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	AHUATEPEC
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	URBANO
GEOLocalización	18.857606, -97.919386

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO**

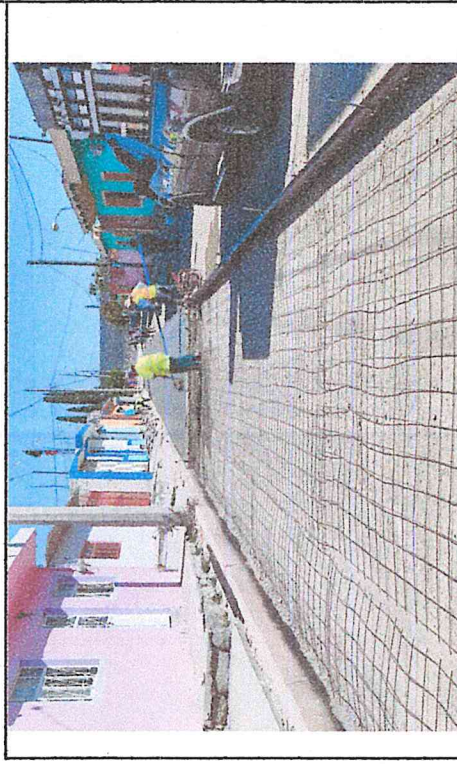

ING. JUAN CARLOS CRUZ  
RESIDENTE DOBYDU

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
Y DESARROLLO URBANO



000003



TECALI DE HERRERA

**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**  
**REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS**




MES DE REPORTE: MARZO 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ABRIL DE 2023



<b>DATOS GENERALES</b>	
NUMERO DE OBRA	23006
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA CABECERA DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.
EMPRESA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PROGRAMA/FONDO	FAISUN2023
CONTRACTUAL	INICIO 17/07/2023 TERMINACIÓN 26/04/2023
CONVENIO	27/03/2023
REAL	26/04/2023
<b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>	
HOMBRES	27
MUJERES	41
TOTAL	68
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE</b>	
OBSERVACIONES:	OBRA EN PROCESO
AVANCE FÍSICO %	85%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$429,987.55
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$429,987.55
<b>LOCALIDAD</b>	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECALI CABECERA
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	URBANA
GEOLOCALIZACIÓN	18.908334, -97.971945

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO**

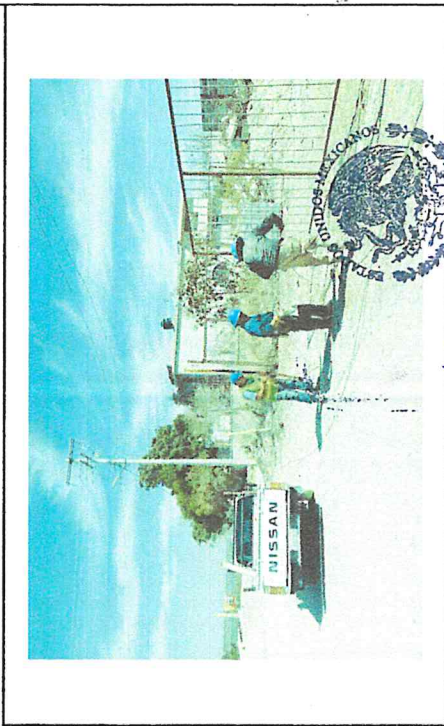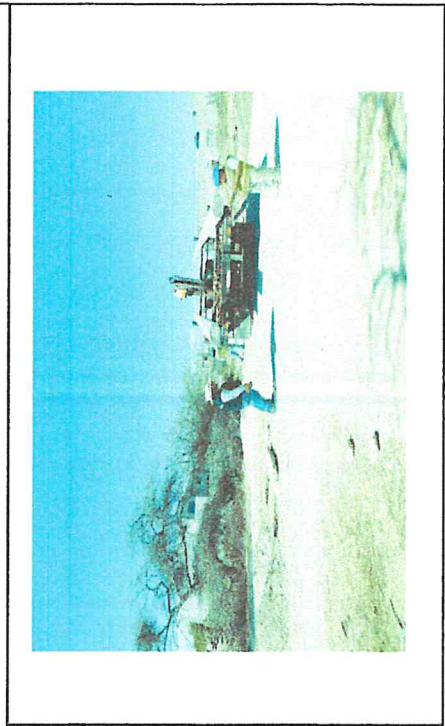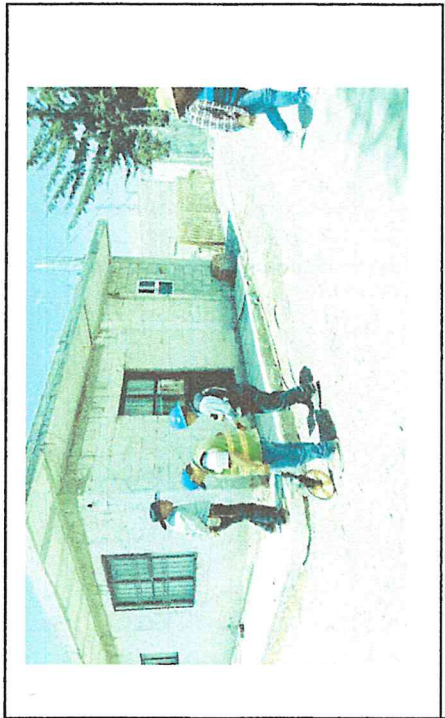

ING. JAVIER LÓPEZ FARMOS  
 RESIDENTE DOPDYU

Municipio de Tecali de Herrera  
 INSDA INGENIERÍA DE PLANEAMIENTO 2021-2023  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



000004




TECALI DE HERRERA

**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**  
**REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS**  
**MES DE REPORTE: MARZO 2023**  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE ABRIL DE 2023

<b>DATOS GENERALES</b>	
NUMERO DE OBRA	<b>23007</b>
NOMBRE DE LA OBRA	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1ro DE JULIO EN EL BARRIO DE TZOCUILIAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA
EMPRESA	GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V.
PROGRAMA/FONDO	FAISMUN2023
CONTRACTUAL	INICIO 06/03/2023 TERMINACION 18/04/2023
DIFERIDO	06/03/2023 18/04/2023
CONVENIO REAL	
HOMBRES	36
MUJERES	54
TOTAL	90
<b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>	
<b>AVANCE FISICO %</b>	
<b>74.66%</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>OBRA EN PROCESO</b>	
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,781,538.00
(B) ANTICIPO	\$534,461.40
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,781,538.00
<b>LOCALIDAD</b>	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	BARRIO DE TZOCUILIAC
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	URBANA
GEOLOCALIZACION	18.098543, -97.992344

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO**

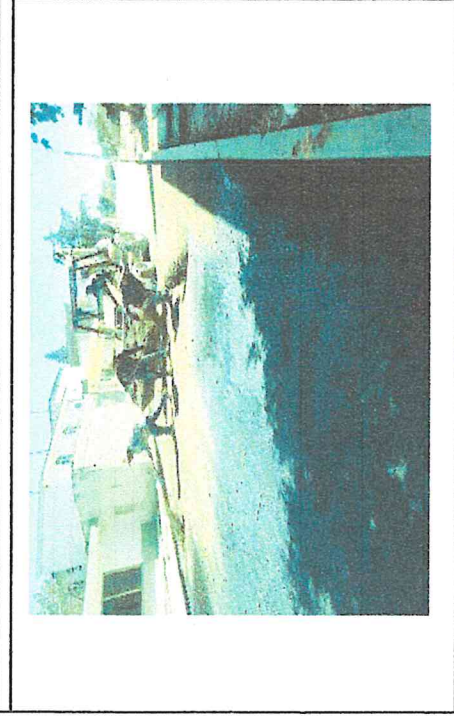

ING. JAVIER LÓPEZ RAMOS  
 RESIDENTE DOPYDU

Municipio de Tecali de Herrera  
 INSTRUMENTO DE REGISTRO 2021-7  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 DESARROLLO URBANO



000005



**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**  
**REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS**  
**MES DE REPORTE: MARZO 2023**

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE OBRA	<b>23008</b>		
NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA		
EMPRESA	SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION OPOP SA DE CV		
PROGRAMA FONDO	FAISMUN 2023		
PROGRAMA CONTRACTUAL	INICIO	TERMINACION	
DIFERICO	30/03/2023	18/04/2023	
CONVENIO REAL	30/03/2023	18/04/2023	
<b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>			
HOMBRES	96		
MUJERES	144		
TOTAL	240		

<b>AREA TECNICA RESPONSABLE:</b>	
OBSERVACIONES:	<b>OBRA EN PROCESO</b>
AVANCE FISICO %	<b>5%</b>
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,071,809.89
(B) ANTIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,071,809.89
<b>LOCALIDAD</b>	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECALI CABECERA
REZAGO SOCIAL	BAJA
ZAP	URBANA
GEOLOCALIZACION	X 18.80911 - Y 97.86687

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO**



ING. FABIAN ADOLFO ROJAS OLIVARES  
 RESIDENTE DOPYDU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 TECALI DE HERRERA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

