

BM - Boletim de
Medição

Contratante	CONTRATO	Objeto	Nº BM
PREFEITURA ALCANTARAS/CE	MUNICIPAL DE 2105.02/2025-01	OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS	02



GOVERNO MUNICIPAL DE
Alcântaras
Ceará

Secretaria	Contratada	Valor da Medição	Período
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	F.S.M. DA COSTA	R\$ 25.257,91	NOVEMBRO/2025

Local	Coord. Geo
MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CE	

Data do BM	Percentual Executado no Período	Percentual Executado Acumulado	VI - R\$	Período de
04/11/2025	51,24%	71,36%	R\$ 49.294,86	01/10/25 a 04/11/25

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por
GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317

FRANCISCO
SAVIO
MARQUES DA
COSTA:0693958537
585370

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO SAVIO
MARQUES DA
COSTA:0693958537

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
Engenheiro Civil CREA-CE 56358

Dados: 2025.11.05
10:31:24 -03'00'

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

CONTRATO: 2105.02/2025-01

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 28.1 DESONERADA

BDI SERVIÇOS: 25,44%
BDI MATERIAL: Não se aplica

Nº MEDIÇÃO: 02

EMPRESA: F.S.M. DA COSTA

PERÍODO MEDIÇÃO: NOVEMBRO/2025

VALOR DO CONTRATO C/ DECONTO: R\$ 49.294,86

R\$ 0,00

0,00%

VALOR ADITIVO: R\$ 49.294,86

VALOR TOTAL: R\$ 49.294,86

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$	ACUMULADO FÍSICO ANTERIOR	QTD. DA MEDIÇÃO	ACUMULADO FÍSICO POSTERIOR	ACUMULADO FÍSICO POSTERIOR	VALOR DA MEDIÇÃO	ACUMULADO FINANCEIRO	SALDO FINANCEIRO (R\$)	%SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.015,51					R\$ 376,72	R\$ 564,22	R\$ 451,30	
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	UN	77,52	R\$ 13,10	R\$ 1.015,51	14,16	28,91	43,07	34,45	R\$ 376,72	R\$ 564,22	R\$ 451,30	44,44%
2		REVESTIMENTOS				R\$ 4.189,96					R\$ 1.562,58	R\$ 2.327,93	R\$ 1.862,03	
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	UN	77,52	R\$ 8,88	R\$ 688,38	14,16	28,91	43,07	34,45	R\$ 255,72	R\$ 382,46	R\$ 305,82	44,44%
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	UN	77,52	R\$ 45,17	R\$ 3.501,58	14,16	28,91	43,07	34,45	R\$ 1.305,86	R\$ 1.945,47	R\$ 1.556,11	44,44%
3		PINTURA				R\$ 44.089,39					R\$ 23.316,61	R\$ 32.284,59	R\$ 11.804,80	
3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	251,87	R\$ 6,54	R\$ 1.647,23	29,11	164,54	193,65	58,22	R\$ 1.076,09	R\$ 1.266,47	R\$ 380,75	23,11%
3.2	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	1547,28	R\$ 27,43	R\$ 42.442,16	320,00	810,81	1.130,81	416,48	R\$ 22.240,52	R\$ 31.018,12	R\$ 11.424,05	26,92%
TOTAL GERAL C/ BDI						R\$ 49.294,86					R\$ 25.257,91	R\$ 35.176,74	R\$ 14.118,13	
											51,24%	71,36%	28,64%	
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO														

GABRIEL WALLACE MOREIRA
Assinado de forma digital por
GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
Engenheiro Civil CREA-CE 58358

Assinado de forma digital por
FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:069395853
COSTA:06939 70
585370
Dados: 2025.11.05 10:31:34 -03'00'

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

CONTRATO: 2105.02/2025-01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	VARIÁVEIS					SUBTOTAL	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	UN	QTD.					SUBTOTAL	28,91
		PRAÇA GREGORIO CUNHA - SEDE		8,5					28,91	
		SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - SEDE - SEDE		12,16						
		PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE		4,1						
		PRAÇA COHAB		4,15						
2		REVESTIMENTOS								
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	UN	QTD.					SUBTOTAL	28,91
		PRAÇA GREGORIO CUNHA - SEDE		8,5					28,91	
		SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - SEDE - SEDE		12,16						
		PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE		4,1						
		PRAÇA COHAB		4,15						
2.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	UN	QTD.					SUBTOTAL	28,91
		PRAÇA GREGORIO CUNHA - SEDE		8,5					28,91	
		SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - SEDE - SEDE		12,16						
		PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE		4,1						
		PRAÇA COHAB		4,15						
3		PINTURA								
3.1	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	QTD.					SUBTOTAL	164,54
		PRAÇA GREGORIO CUNHA - SEDE		85,28					164,54	
		SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - SEDE - SEDE		65,4						
		PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE		3,86						
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	QTD.					SUBTOTAL	810,81
		PRAÇA GREGORIO CUNHA - SEDE		208					810,81	
		SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - SEDE - SEDE		455,11						
		PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE		58,3						
		PRAÇA COHAB		87,4						

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por
 GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
 Engenheiro CIVIL CREA-CE 56358

FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939 70 585370

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:069395853

Dados: 2025.11.05 10:31:42 -03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS



CONTRATO Nº: 2105.02/2025-01
 VALOR CONTRATUAL:
 R\$ 49.294,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE

F I N A N C E I R O

Nº MEDIÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
	PERÍODO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
1	25/06/25 a 08/07/25	9.918,83	9.918,83	39.376,03
2	01/10/25 a 04/11/25	25.257,91	35.176,74	14.118,12
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
TOTAL			R\$ 35.176,74	

GABRIEL WALLACE MOREIRA
 Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317 ARCANJO:60326410317

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
 Engenheiro Civil CREA-CE 56358

FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:069395853
 Assinado de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:069395853
 70
 Dados: 2025.11.05 10:32:03 -03'00'
 FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:069395853
 9585370

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

Nº MEDIÇÃO: 02




GREGORIO CUNHA



GREGORIO CUNHA



SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

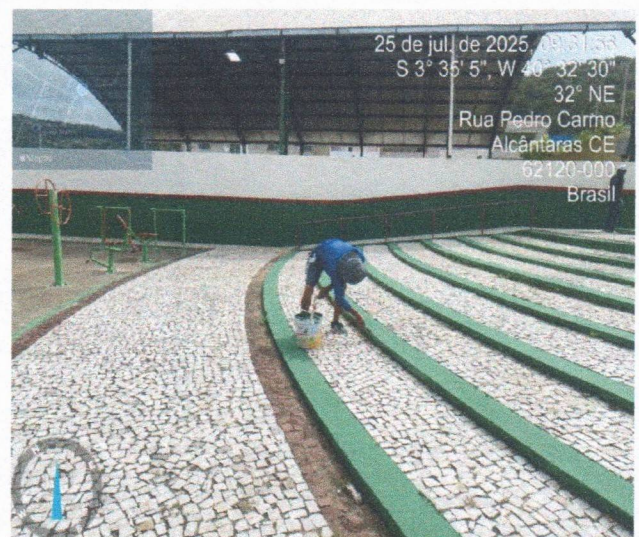

SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO



SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO




SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE


Nº MEDIÇÃO: 02

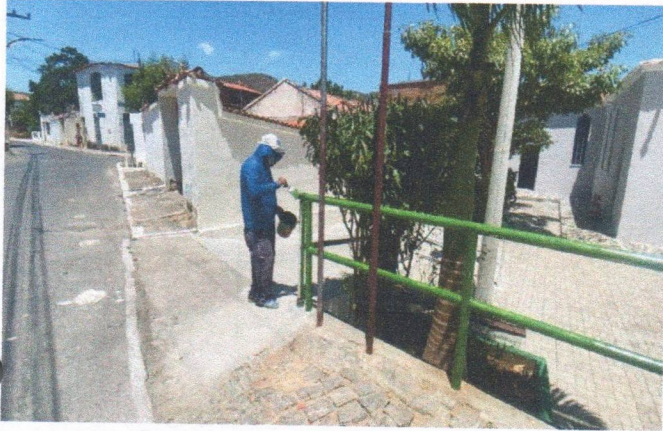

PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE



PRAÇA SÃO VICENTE DE PAULO - SEDE

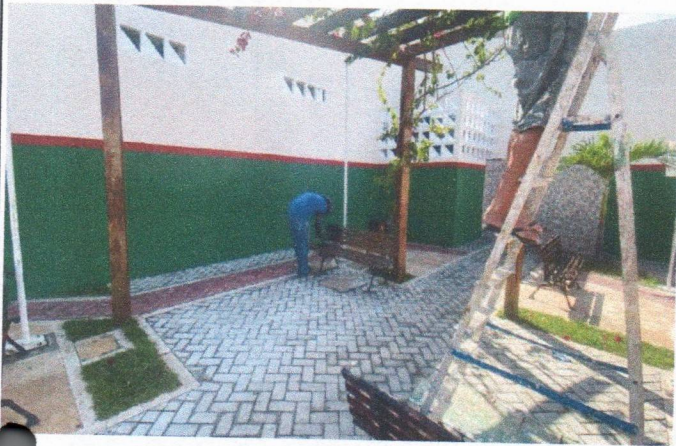

PRAÇA COHAB



PRAÇA COHAB



PRAÇA DO SÍTIO BONFIM



PRAÇA DO SÍTIO BONFIM

GABRIEL WALLACE
MOREIRA
ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por
GABRIEL WALLACE MOREIRA
ARCANJO:60326410317

FRANCISCO
SAVIO
MARQUES DA
COSTA:06939
585370
Assinado de forma digital por
FRANCISCO SAVIO
MARQUES DA
COSTA:069395853
70
Dados: 2025.11.05


DIÁRIO DE OBRA

F.S.M. DA COSTA

OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

CONDIÇÕES DO TEMPO

	DATA:	FOLHA	LIVRO		MANHÃ	TARDE	NOITE
	01/10/2025		1	1	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
	A				<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	09/10/2025				<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
				<input type="checkbox"/> ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> ATIVIDADE	

MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante	4	Engenheiro Residente	1				Retroescavadeira
Roçador	2	Técnico					Placa Vibratoria
Carpinteiro		Encarregado					
Armador		Almoxarife					
Eletricista		Apontador					
Encanador		Ferreiro					
Operador de Betoneira							
		Total	7				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6
 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

- Obra em execução

EMPRESA:

FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370 585370
Assinado de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370
 Dados: 2025.11.05 10:32:30 -03'00'

FISCALIZAÇÃO

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317
Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317

GERENCIAMENTO

DIÁRIO DE OBRA


F.S.M. DA COSTA

OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

CONDIÇÕES DO TEMPO

MANHÃ TARDE NOITE

	DATA:	FOLHA	LIVRO				
	10/10/2025		1	1	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> BOM
	A				<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL	<input type="checkbox"/> INSTÁVEL
	17/10/2025				<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO	<input type="checkbox"/> CHUVOSO
				<input type="checkbox"/> ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> ATIVIDADE	

MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO	
Servente/Ajudante	4	Engenheiro Residente	1				Retroescavadeira
Roçador	2	Técnico					Placa Vibratoria
Carpinteiro		Encarregado					
Armador		Almoxarife					
Eletricista		Apontador					
Encanador		Ferreiro					
Operador de Betoneira							
		Total	7				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6
 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

- Obra em execução

EMPRESA:

FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370
Assinado de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370
 Dados: 2025.11.05 10:32:41 -03'00'

FISCALIZAÇÃO

GABRIEL WALLACE MOREIRA
Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA
 ARCANJO:60326410317

GERENCIAMENTO


DIÁRIO DE OBRA

F.S.M. DA COSTA

OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

CONDIÇÕES DO TEMPO

	MANHÃ	TARDE	NOITE
 SERVMARQUES <small>SERVIÇOS E CONSULTORIA</small>	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> ATIVIDADE

DATA:	FOLHA	LIVRO
20/10/2025	1	1
A		
27/10/2025		

MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante	4	Engenheiro Residente	1	EQUIPAMENTOS		Retroescavadeira
Roçador	2	Técnico				Placa Vibratoria
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador		Ferreiro				
Operador de Betoneira						
		Total	7			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6
 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

- Obra em execução

EMPRESA:

FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370 585370

Assinado de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370 Dados: 2025.11.05 10:32:50 -03'00'

FISCALIZAÇÃO

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317

Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317

GERENCIAMENTO


DIÁRIO DE OBRA

F.S.M. DA COSTA

OBRA DE REFORMA DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CE

CONDIÇÕES DO TEMPO

	MANHÃ	TARDE	NOITE
	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> ATIVIDADE

DATA:	FOLHA	LIVRO	
28/10/2025	1	1	1
A			
04/11/2025			

MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.	EQUIPAMENTOS	QUANT.	DESCRIÇÃO
Servente/Ajudante	4	Engenheiro Residente	1	EQUIPAMENTOS		Retroescavadeira
Roçador	2	Técnico				Placa Vibratória
Carpinteiro		Encarregado				
Armador		Almoxarife				
Eletricista		Apontador				
Encanador		Ferreiro				
Operador de Betoneira						
		Total	7			

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6
 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL
 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

- Obra em execução

<p>EMPRESA:</p> <p>FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370 585370</p> <p style="font-size: small;">Assinado de forma digital por FRANCISCO SAVIO MARQUES DA COSTA:06939585370 Dados: 2025.11.05 10:33:00 -03'00'</p>	<p>FISCALIZAÇÃO</p> <p>GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317</p> <p style="font-size: small;">Assinado de forma digital por GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO:60326410317</p>	<p>GERENCIAMENTO</p>
--	--	-----------------------------
