



TECALI DE HERRERA


DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS

MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES			ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE:	
NUMERO DE OBRA	22319			
NOMBRE DE LA OBRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANLCO, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA		OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
EMPRESA	EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE C.V.		AVANCE FISICO %	100%
PROGRAMA/ FONDO	RECURSOS FISCALES		(A) IMPORTE CONTRATADO	\$291,869.89
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION	(B) ANTICIPO	\$0.00
CONTRACTUAL	24/06/2022	13/07/2022	(C) CONVENIO	\$0.00
DIFERIDO			TOTAL CONTRATADO	\$291,869.89
CONVENIO				
REAL	24/06/2022	13/07/2022		
NUMERO DE BENEFICIARIOS			LOCALIDAD	
HOMBRES		777	NOMBRE DE LA LOCALIDAD	LA TRINIDAD TIANGUISMANLCO
MUJERES		1,165	REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
TOTAL		1,942	ZAP	RURAL
			GEOLocalIZACION	X602517.669, Y2089593.319

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

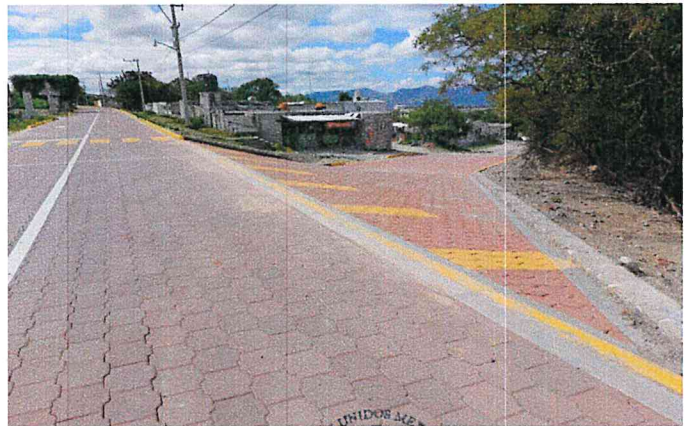

Municipio de Tecali de Herrera
ING. IRVING VERACRUZ 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
