




TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22116	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON C.C.T. 21DPR03801 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	
EMPRESA	EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE C.V.	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	23/06/2022	24/06/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	23/06/2022	24/06/2022
NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES	75	
MUJERES	113	
TOTAL	188	

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,022,797.26
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,022,797.26
LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	SAN BUENAVENTURA TETLANANCA
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	X613024.9, Y2090758

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

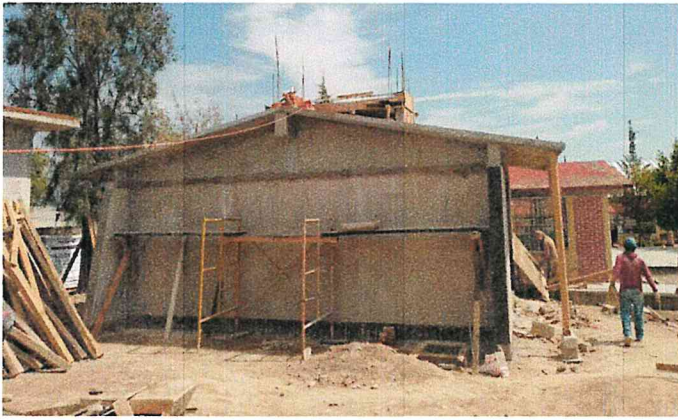

Municipio de Tecali de Herrera
 Ejercicio Financiero 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 Y DESARROLLO URBANO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
