



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO



REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS

MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22211	
NOMBRE DE LA OBRA	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA PRIMERA ETAPA	
EMPRESA	TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.	
PROGRAMA/ FONDO	FORTAMUN 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	13/04/2022	26/04/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	13/04/2022	26/04/2022
NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES		487
MUJERES		730
TOTAL		1,217

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$414,816.81
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$414,816.81
LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	VARIAS LOCALIDADES
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	18.934556, -97.937534

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

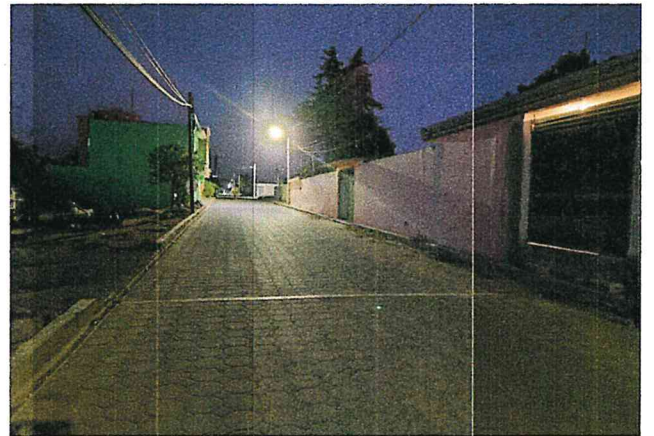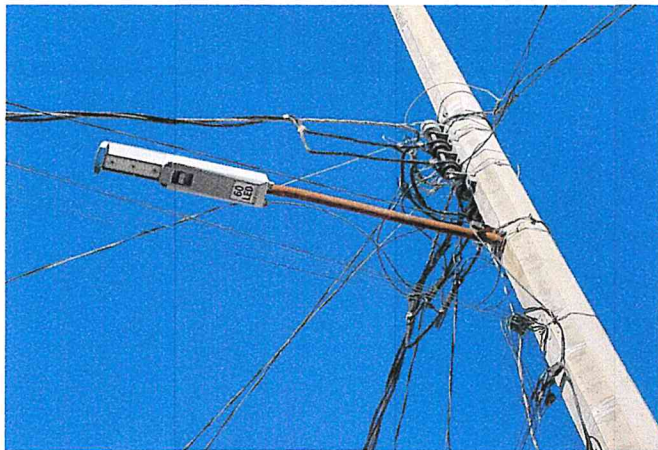

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
INSERVING VERA CRUZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
