



TECALI DE HERRERA  
MUNICIPIO MUNICIPAL 2019-2024

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

## REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS

MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022


DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22113	
NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y BARRANCA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	
EMPRESA	GILBERTO ALEXIS ANCANTARA ORTIZ	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	30/05/2022	18/05/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	30/05/2022	18/05/2022

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,907,416.68
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,907,416.68

NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES		50
MUJERES		76
TOTAL		126

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECALI DE HERRERA
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	URBANA
GEOLOCALIZACION	X608832.79, Y2089688.88

### REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

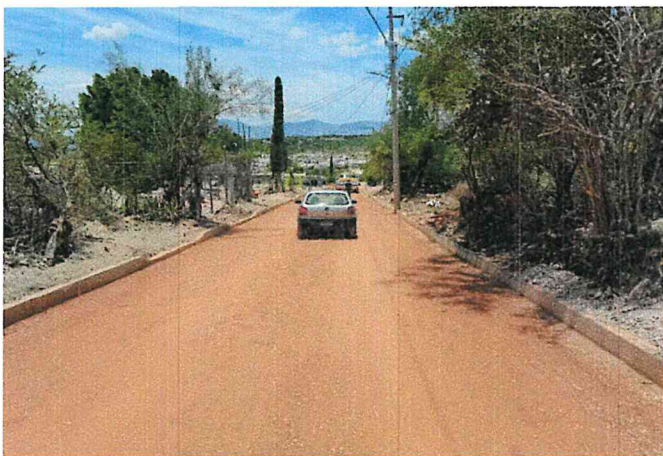

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
