



TECALI DE HERRERA  
GOBIERNO MUNICIPAL, 2011 - 2014

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS  
MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022


DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22126	
NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	
EMPRESA	MAC	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
<b>PROGRAMA</b>	<b>INICIO</b>	<b>TERMINACION</b>
CONTRACTUAL	06/10/2022	06/12/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	06/10/2022	06/12/2022

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA EN PROCESO
AVANCE FISICO %	60%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,239,144.24
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,239,144.24

NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES		250
MUJERES		375
TOTAL		625

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	CONCEPCION CAUTKA
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	X 606855.94 - Y 2086497.31

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

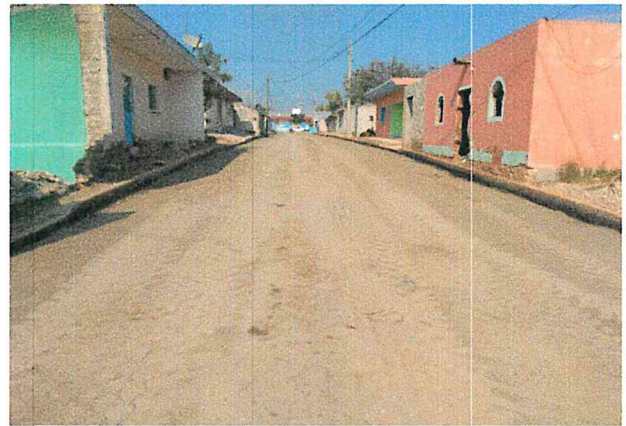

Municipio de Tecali de Herrera  
ING. IRVING VERA CRUZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
