



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO


REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS

MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

| DATOS GENERALES | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| NUMERO DE OBRA | 22109 | |
| NOMBRE DE LA OBRA | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 2 ORIENTE-PONIENTE, ENTRE CALLE 4 NORTE Y CARRETERA TECALI-TEPEACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA | |
| EMPRESA | COMPANIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC | |
| PROGRAMA/ FONDO | FISM 2022 | |
| PROGRAMA | INICIO | TERMINACION |
| CONTRACTUAL | 25/03/2022 | 07/04/2022 |
| DIFERIDO | | |
| CONVENIO | | |
| REAL | 25/03/2022 | 07/04/2022 |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS | | |
| HOMBRES | 46 | |
| MUJERES | 69 | |
| TOTAL | 115 | |

| AREA TECNICA RESPONSABLE: | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO |
| AVANCE FISICO % | 100% |
| (A) IMPORTE CONTRATADO | \$490,662.77 |
| (B) ANTICIPO | \$0.00 |
| (C) CONVENIO | \$0.00 |
| TOTAL CONTRATADO | \$490,662.77 |
| LOCALIDAD | |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD | SAN LUIS AJAJALPAN |
| REZAGO SOCIAL | POBREZA TOTAL |
| ZAP | RURAL |
| GEOLOCALIZACION | X612133.38 Y2093936.88 |

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

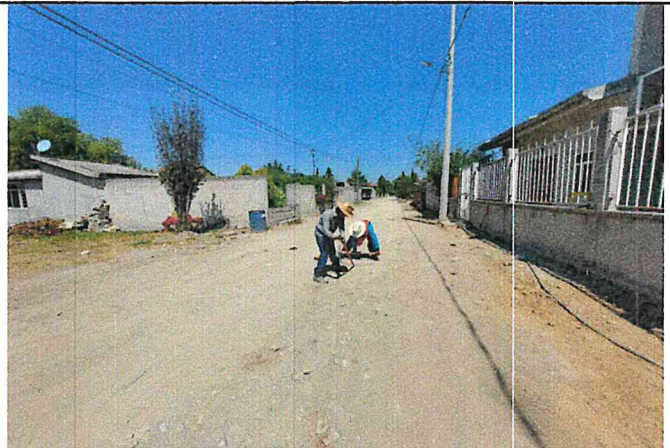

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2023-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
ING. IRVING VERA CRUZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
