



Palu, 21 Juni 2025
Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN											
Nama Paket : Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn.54 - BGKn.59)						BULAN : KE-23					
Pemberi Tugas : Balai Wilayah Sungai Sulawesi III						MINGGU : KE-99					
Lokasi : Kabupaten Sigi - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah						PERIODE : 15 JUNI 2025 - 21 JUNI 2025					
PPK : Irigasi dan Rawa I											
Tahun Anggaran : 2023 - 2025											
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						PROSENTA ST
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			2.1355		2.1293		0.0045		2.1337	99.92%
I.1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1.00	0.5372	0.99	0.5310	0.91	0.0045	1.00	0.5354	99.67%
I.2	Survey Pengukuran dan Penggambaran	ha	40.35	0.3553	40.35	0.3553	-	-	40.35	0.3553	100.00%
I.3	Laporan dan Foto	ls	1.00	0.0884	1.00	0.0884	-	-	1.00	0.0884	100.00%
I.4	Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja dan Gudang	ls	1.00	0.7144	1.00	0.7144	-	-	1.00	0.7144	100.00%
I.5	Pemantauan Perlindungan Lingkungan	bulan	4.00	0.1365	4.00	0.1365	-	-	4.00	0.1365	100.00%
I.6	Papan Nama Proyek	Set	1.00	0.0011	1.00	0.0011	-	-	1.00	0.0011	100.00%
I.7	Pengeringan / Dewatering	ls	1.00	0.3026	1.00	0.3026	-	-	1.00	0.3026	100.00%
II.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI			0.8601		0.8601		-		0.8601	100.00%
II.1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	ls	1.00	0.8601	1.00	0.8601	-	-	1.00	0.8601	100.00%
III.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER B.GKn.54-B.GKn.57.2 (B.GKn.50-B.GKn.52)			22.9199		22.9199		-		22.9199	100.00%
III.1	PEKERJAAN TANAH										
III.1.a	Kupas Top Soil Menggunakan Bulldozer (Kupasan 20 Cm)	m2	20,522.65	0.2477	20,522.65	0.2477	-	-	20,522.65	0.2477	100.00%
III.1.a1	Kupas Top Soil Menggunakan Bulldozer (Kupasan 20 Cm) (Negosiasi)	m2	395.13	0.0021	395.13	0.0021	-	-	395.13	0.0021	100.00%
III.1.b	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	15,520.15	0.7379	15,520.15	0.7379	-	-	15,520.15	0.7379	100.00%
III.1.c	Timbunan Tanah Material Sekitar, kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	1,737.35	0.1131	1,737.35	0.1131	-	-	1,737.35	0.1131	100.00%
III.1.d	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3	25,986.03	3.1493	25,986.03	3.1493	-	-	25,986.03	3.1493	100.00%
III.1.d.1	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km (Negosiasi)	m3	32,942.28	3.9924	32,942.28	3.9924	-	-	32,942.28	3.9924	100.00%
III.1.e	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	11,917.13	2.0345	11,917.13	2.0345	-	-	11,917.13	2.0345	100.00%
III.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
III.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	471.77	0.0367	471.77	0.0367	-	-	471.77	0.0367	100.00%
III.2.b	Bongkar Beton	m3	47.87	0.0108	47.87	0.0108	-	-	47.87	0.0108	100.00%
III.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	15,571.86	1.2206	15,571.86	1.2206	-	-	15,571.86	1.2206	100.00%
III.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
III.3.a	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran)	m3	284.45	0.0435	284.45	0.0435	-	-	284.45	0.0435	100.00%
III.3.b	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	253.00	0.2316	253.00	0.2316	-	-	253.00	0.2316	100.00%
III.3.b.1	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	845.53	0.7741	845.53	0.7741	-	-	845.53	0.7741	100.00%
III.3.c	Bronjong Batu Kali	m3	1,540.00	1.2893	1,540.00	1.2893	-	-	1,540.00	1.2893	100.00%
III.3.d	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	280.22	0.0224	280.22	0.0224	-	-	280.22	0.0224	100.00%
III.3.d.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	2,603.72	0.1950	2,603.72	0.1950	-	-	2,603.72	0.1950	100.00%
III.3.e	Pekerjaan Acian	m2	521.66	0.0211	521.66	0.0211	-	-	521.66	0.0211	100.00%
III.4	PEKERJAAN BETON										
III.4.a	Pengadaan Beton Ready Mix K-225 Precast (0,70 x 1,50 x 0,10 m)	bh	4,386.00	1.6660	4,386.00	1.6660	-	-	4,386.00	1.6660	100.00%
III.4.b	Pemasangan Beton Ready Mix K-225 Precast (0,70 x 1,50 x 0,10 m)	bh	4,386.00	0.3582	4,386.00	0.3582	-	-	4,386.00	0.3582	100.00%
III.4.c	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Sepatu Lining 0,30 x 0,40)	m3	361.59	0.4054	361.59	0.4054	-	-	361.59	0.4054	100.00%
III.4.d	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Capping + Saluran, b=2m, h=1,36m)	m3	738.53	0.8281	738.53	0.8281	-	-	738.53	0.8281	100.00%
III.4.e	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Lantai Saluran)	m3	136.40	0.1529	136.40	0.1529	-	-	136.40	0.1529	100.00%
III.4.e.1	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	63.19	0.0709	63.19	0.0709	-	-	63.19	0.0709	100.00%
III.4.f	Penulangan D-12 mm	kg									
III.4.g	Penulangan Ø-10 mm	kg	16,943.78	0.2412	16,943.78	0.2412	-	-	16,943.78	0.2412	100.00%
III.4.g.1	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	22,249.01	0.3186	22,249.01	0.3186	-	-	22,249.01	0.3186	100.00%
III.4.h	Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	62.11	0.0586	62.11	0.0586	-	-	62.11	0.0586	100.00%
III.4.i	Wiremesh M3 (Lantai & Capping)	m2	3,399.86	0.2783	3,399.86	0.2783	-	-	3,399.86	0.2783	100.00%
III.4.j	Pekerjaan Bekisting Expose - Capping	m2	1,443.47	0.2128	1,443.47	0.2128	-	-	1,443.47	0.2128	100.00%
III.4.k	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2	3,853.30	0.4025	3,853.30	0.4025	-	-	3,853.30	0.4025	100.00%
III.4.k.1	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2	265.28	0.0277	265.28	0.0277	-	-	265.28	0.0277	100.00%
III.4.l	Penulangan D-12 mm (Negosiasi)	kg	66,035.76	0.9455	66,035.76	0.9455	-	-	66,035.76	0.9455	100.00%
III.4.m	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Side drainase Liquidaksi + Tangga Cuci)	m3	253.33	0.2840	253.33	0.2840	-	-	253.33	0.2840	100.00%
III.4.n	Pekerjaan Beton K-225	m3	17.32	0.0194	17.32	0.0194	-	-	17.32	0.0194	100.00%
III.4.o	Pekerjaan perancah (Negosiasi)	m3	42.90	0.0056	42.90	0.0056	-	-	42.90	0.0056	100.00%
III.5	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN										
III.5.a	Perkerasan Jalan Inspeksi (Sub Base Course)	m2	1,650.00	0.1133	1,650.00	0.1133	-	-	1,650.00	0.1133	100.00%
III.5.a.1	Perkerasan Jalan Inspeksi (Sub Base Course)	m2	3,566.37	0.2449	3,566.37	0.2449	-	-	3,566.37	0.2449	100.00%
III.5.b	Lapisan Elastis/Bitumen	m2									
III.6	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
III.6.a	Pemasangan Geomembrane Tebal 0,75 mm	m2	9,368.20	0.7478	9,368.20	0.7478	-	-	9,368.20	0.7478	100.00%
III.6.a.1	Pemasangan Geomembrane Tebal 0,75 mm (negosiasi)	m2	274.27	0.0186	274.27	0.0186	-	-	274.27	0.0186	100.00%
III.6.b	Gebalan Rumpit	m2									
III.6.c	Pemasangan Geotekstil, Tipe-C, Non-Wovens	m2	17,495.00	0.9955	17,495.00	0.9955	-	-	17,495.00	0.9955	100.00%
III.6.d	Patok Hektometer (Ha)	bh	58.00	0.0384	58.00	0.0384	-	-	58.00	0.0384	100.00%
III.6.e	Patok Kilometer (Km)	bh	6.00	0.0057	6.00	0.0057	-	-	6.00	0.0057	100.00%
III.6.f	Mistar Ukur	bh	6.00	0.0032	6.00	0.0032	-	-	6.00	0.0032	100.00%
III.6.g	Water Stop (Type WSF 20 Cm)	m	165.00	0.0330	165.00	0.0330	-	-	165.00	0.0330	100.00%
III.6.g.1	Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	291.76	0.0583	291.76	0.0583	-	-	291.76	0.0583	100.00%
III.6.h	Pekerjaan Settlement Plate (Negosiasi)	Bh	5.00	0.0119	5.00	0.0119	-	-	5.00	0.0119	100.00%
III.6.i	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Slim Coat (t=2 cm, L =5'cm) (Negosiasi)	m2	202.87	0.0810	202.87	0.0810	-	-	202.87	0.0810	100.00%
III.6.j	Nomenklatur (Negosiasi)	Bh	106.00	0.0214	106.00	0.0214	-	-	106.00	0.0214	100.00%
III.6.k	Papan Eksplotasi (Papan Operasi) (Negosiasi)	Bh	4.00	0.0126	4.00	0.0126	-	-	4.00	0.0126	100.00%
III.6.l	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d < 400 gr/m2) (Negosiasi)	m2	800.00	0.0256	800.00	0.0256	-	-	800.00	0.0256	100.00%
III.6.m	Patok Pengarah (Negosiasi)	Bh	335.00	0.1001	335.00	0.1001	-	-	335.00	0.1001	100.00%
III.6.n	Patok Pembatas (Negosiasi)	Bh	80.00	0.0175	80.00	0.0175	-	-	80.00	0.0175	100.00%
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN SIPHON B.GKn.55a (B.GKn.51a)										
IV.1	PEKERJAAN TANAH										
IV.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
IV.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
IV.1.c	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3									
IV.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
IV.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
IV.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
IV.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
IV.3	PEKERJAAN BETON										
IV.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
IV.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
IV.3.c	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
IV.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90	
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
IV.3.e	Penulangan D-12 mm	kg								
IV.3.f	Penulangan D-19 mm	kg								
IV.3.g	Penulangan Ø-8 mm	kg								
IV.3.h	Penulangan Ø-6 mm	kg								
IV.A	PEKERJAAN BANGUNAN TALANG DAN JEMBATAN B.GKn.55a (B.GKn.51a)			0.4012		0.4012		-	0.4012	100.00%
IV.A.1	PEKERJAAN TANAH									
IV.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	66.28	0.0032	66.28	0.0032	-	-	66.28	0.0032
IV.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	53.02	0.0035	53.02	0.0035	-	-	53.02	0.0035
IV.A.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	13.25	0.0010	13.25	0.0010	-	-	13.25	0.0010
IV.A.1.d	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3	155.57	0.0189	155.57	0.0189	-	-	155.57	0.0189
IV.A.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
IV.A.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3					-	-		
IV.A.2.b	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2					-	-		
IV.A.3	PEKERJAAN BETON									
IV.A.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	120.07	0.1346	120.07	0.1346	-	-	120.07	0.1346
IV.A.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100)	m3	17.93	0.0169	17.93	0.0169	-	-	17.93	0.0169
IV.A.3.c	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	417.16	0.0436	417.16	0.0436	-	-	417.16	0.0436
IV.A.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	3,622.68	0.0519	3,622.68	0.0519	-	-	3,622.68	0.0519
IV.A.3.e	Penulangan Ø-8 mm	kg	7.34	0.0001	7.34	0.0001	-	-	7.34	0.0001
IV.A.3.f	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	4,927.72	0.0706	4,927.72	0.0706	-	-	4,927.72	0.0706
IV.A.3.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	536.58	0.0077	536.58	0.0077	-	-	536.58	0.0077
IV.A.3.h	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,126.83	0.0305	2,126.83	0.0305	-	-	2,126.83	0.0305
IV.A.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	53.44	0.0069	53.44	0.0069	-	-	53.44	0.0069
IV.A.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
IV.A.4.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	25.80	0.0100	25.80	0.0100	-	-	25.80	0.0100
IV.A.4.b	Pemasangan Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	8.64	0.0017	8.64	0.0017	-	-	8.64	0.0017
IV.A.4.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	6.49	0.0003	6.49	0.0003	-	-	6.49	0.0003
IV.B	BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG B.GKn.55a.1			0.0355		0.0355		-	0.0355	100.00%
IV.B.1	PEKERJAAN BETON									
IV.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	10.76	0.0121	10.76	0.0121	-	-	10.76	0.0121
IV.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100)	m3	0.35	0.0003	0.35	0.0003	-	-	0.35	0.0003
IV.B.1.c	Penulangan D-16 mm	kg	113.39	0.0016	113.39	0.0016	-	-	113.39	0.0016
IV.B.1.d	Penulangan Ø-12 mm	kg	446.67	0.0064	446.67	0.0064	-	-	446.67	0.0064
IV.B.1.e	Penulangan Ø-10 mm	kg	117.02	0.0017	117.02	0.0017	-	-	117.02	0.0017
IV.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	71.54	0.0075	71.54	0.0075	-	-	71.54	0.0075
IV.B.1.g	Pekerjaan Perancah	m2	46.20	0.0060	46.20	0.0060	-	-	46.20	0.0060
V.	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.55b (B.GKn.51b)									
V.1	PEKERJAAN TANAH									
V.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3								
V.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3								
V.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3								
V.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
V.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3								
V.2.b	Saran dengan mortar tipe M, f'c' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2								
V.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2								
V.3	PEKERJAAN BETON									
V.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3								
V.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100)	m3								
V.3.c	Penulangan Ø-6 mm	kg								
V.3.d	Penulangan Ø-8 mm	kg								
V.3.e	Penulangan D-12 mm	kg								
V.3.f	Penulangan D-16 mm	kg								
V.3.g	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2								
V.A	PEK. BANGUNAN TALANG DAN JEMBATAN B.GKn.55b (B.GKn.51b)			0.7481		0.7481		-	0.7481	100.00%
V.A.1	PEKERJAAN TANAH									
V.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	33.85	0.0016	33.85	0.0016	-	-	33.85	0.0016
V.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	27.08	0.0018	27.08	0.0018	-	-	27.08	0.0018
V.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3	1,079.33	0.1308	1,079.33	0.1308	-	-	1,079.33	0.1308
V.A.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	6.77	0.0005	6.77	0.0005	-	-	6.77	0.0005
V.A.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
V.A.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	53.15	0.0487	53.15	0.0487	-	-	53.15	0.0487
V.A.2.b	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	47.80	0.0038	47.80	0.0038	-	-	47.80	0.0038
V.A.2.c	Pekerjaan Acian	m2	83.05	0.0038	83.05	0.0038	-	-	83.05	0.0038
V.A.2.d	Saran dengan mortar tipe M, f'c' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	83.05	0.0053	83.05	0.0053	-	-	83.05	0.0053
V.A.3	PEKERJAAN BETON									
V.A.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	187.68	0.2104	187.68	0.2104	-	-	187.68	0.2104
V.A.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100)	m3	14.79	0.0139	14.79	0.0139	-	-	14.79	0.0139
V.A.3.c	Penulangan Ø-6 mm	kg	9.72	0.0001	9.72	0.0001	-	-	9.72	0.0001
V.A.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	2,491.59	0.0357	2,491.59	0.0357	-	-	2,491.59	0.0357
V.A.3.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	3,701.82	0.0530	3,701.82	0.0530	-	-	3,701.82	0.0530
V.A.3.f	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	748.36	0.0107	748.36	0.0107	-	-	748.36	0.0107
V.A.3.g	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	8,734.78	0.1251	8,734.78	0.1251	-	-	8,734.78	0.1251
V.A.3.h	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	756.11	0.0790	756.11	0.0790	-	-	756.11	0.0790
V.A.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	101.19	0.0131	101.19	0.0131	-	-	101.19	0.0131
V.A.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
V.A.4.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	24.00	0.0093	24.00	0.0093	-	-	24.00	0.0093
V.A.4.b	Pemasangan Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	6.07	0.0012	6.07	0.0012	-	-	6.07	0.0012
V.A.4.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	6.49	0.0003	6.49	0.0003	-	-	6.49	0.0003
V.B	BANGUNAN SADAP BGKn 51c.1			0.1636		0.1636		-	0.1636	100.00%
V.B.1	PEKERJAAN BETON									
V.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	25.07	0.0281	25.07	0.0281	-	-	25.07	0.0281
V.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.93	0.0028	2.93	0.0028	-	-	2.93	0.0028
V.B.1.c	Penulangan D-16 mm	kg	1,807.65	0.0259	1,807.65	0.0259	-	-	1,807.65	0.0259
V.B.1.d	Penulangan D-13 mm	kg	1,132.20	0.0162	1,132.20	0.0162	-	-	1,132.20	0.0162
V.B.1.e	Penulangan Ø-10 mm	kg	3.38	0.0000	3.38	0.0000	-	-	3.38	0.0000
V.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	167.57	0.0175	167.57	0.0175	-	-	167.57	0.0175
V.B.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-		
V.B.1.g.1	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	2.75	0.0004	2.75	0.0004	-	-	2.75	0.0004
V.B.2	PEKERJAAN LAIN-LAIN									
V.B.2.a	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0221	1.00	0.0221	-	-	1.00	0.0221
V.B.2.b	Pemasangan Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0072	1.00	0.0072	-	-	1.00	0.0072
V.B.2.C	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434

h

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTA SI
V.C	BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DEPAN GILINGAN PADI			0.0318		0.0318		-		0.0318	100.00%
V.C.1	PEKERJAAN BETON										
V.C.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	8.78	0.0098	8.78	0.0098	-	-	8.78	0.0098	100.00%
V.C.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	0.35	0.0003	0.35	0.0003	-	-	0.35	0.0003	100.00%
V.C.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	101.80	0.0015	101.80	0.0015	-	-	101.80	0.0015	100.00%
V.C.1.d	Penulangan ø-12 mm (Negosiasi)	kg	402.90	0.0058	402.90	0.0058	-	-	402.90	0.0058	100.00%
V.C.1.e	Penulangan ø-10 mm (Negosiasi)	kg	81.87	0.0012	81.87	0.0012	-	-	81.87	0.0012	100.00%
V.C.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	70.05	0.0073	70.05	0.0073	-	-	70.05	0.0073	100.00%
V.C.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-			
V.C.1.g.1	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	45.50	0.0059	45.50	0.0059	-	-	45.50	0.0059	100.00%
VI.	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.54c (B.GKn.51c)										
VI.1	PEKERJAAN TANAH										
VI.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
VI.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
VI.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3									
VI.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
VI.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
VI.2.b	Saran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MP,a (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
VI.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
VI.3	PEKERJAAN BETON										
VI.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
VI.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
VI.3.c	Penulangan D-12 mm	kg									
VI.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									
VI.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
VIA	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG B.GKn.54c (B.GKn.51c)			0.3899		0.3899		-		0.3899	100.00%
VIA.1	PEKERJAAN TANAH										
VIA.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	479.97	0.0228	479.97	0.0228	-	-	479.97	0.0228	100.00%
VIA.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	321.53	0.0209	321.53	0.0209	-	-	321.53	0.0209	100.00%
VIA.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	158.44	0.0124	158.44	0.0124	-	-	158.44	0.0124	100.00%
VIA.2	PEKERJAAN BETON										
VIA.2.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	97.93	0.1098	97.93	0.1098	-	-	97.93	0.1098	100.00%
VIA.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	4.32	0.0041	4.32	0.0041	-	-	4.32	0.0041	100.00%
VIA.2.c	Penulangan D-16 mm	kg	7.748.77	0.1109	7.748.77	0.1109	-	-	7.748.77	0.1109	100.00%
VIA.2.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	3.482.25	0.0499	3.482.25	0.0499	-	-	3.482.25	0.0499	100.00%
VIA.2.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	416.22	0.0435	416.22	0.0435	-	-	416.22	0.0435	100.00%
VIA.2.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	40.13	0.0052	40.13	0.0052	-	-	40.13	0.0052	100.00%
VIA.2.g	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	m3	8.74	0.0001	8.74	0.0001	-	-	8.74	0.0001	100.00%
VIA.2.h	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	m3	47.93	0.0007	47.93	0.0007	-	-	47.93	0.0007	100.00%
VIA.3	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
VIA.3.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	20.52	0.0080	20.52	0.0080	-	-	20.52	0.0080	100.00%
VIA.3.b	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	5.84	0.0002	5.84	0.0002	-	-	5.84	0.0002	100.00%
VIA.3.c	Wire Mesh M8 (Negosiasi)	m2	4.00	0.0003	4.00	0.0003	-	-	4.00	0.0003	100.00%
VIB	BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG B.GKn.54c.1			0.0355		0.0355		-		0.0355	100.00%
VIB.1	PEKERJAAN BETON										
VIB.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	10.76	0.0121	10.76	0.0121	-	-	10.76	0.0121	100.00%
VIB.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.35	0.0003	0.35	0.0003	-	-	0.35	0.0003	100.00%
VIB.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	113.39	0.0016	113.39	0.0016	-	-	113.39	0.0016	100.00%
VIB.1.d	Penulangan ø-12 mm (Negosiasi)	kg	446.67	0.0064	446.67	0.0064	-	-	446.67	0.0064	100.00%
VIB.1.e	Penulangan ø-10 mm (Negosiasi)	kg	117.02	0.0017	117.02	0.0017	-	-	117.02	0.0017	100.00%
VIB.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	71.54	0.0075	71.54	0.0075	-	-	71.54	0.0075	100.00%
VIB.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	46.20	0.0060	46.20	0.0060	-	-	46.20	0.0060	100.00%
VII.	PEK BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.56.a (B.GKn.51d)										
VII.1	PEKERJAAN TANAH										
VII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
VII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
VII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3									
VII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
VII.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
VII.2.b	Saran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MP,a (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
VII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
VII.3	PEKERJAAN BETON										
VII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
VII.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
VII.3.c	Penulangan D-12 mm	kg									
VII.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									
VII.3.e	Pekerjaan Bekisting Biasa (Tanpa perancah)	m2									
VIIA	PEK BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG B.GKn.56.a (B.GKn.51d)			0.3373		0.3373		-		0.3373	100.00%
VIIA.1	PEKERJAAN TANAH										
VIIA.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	129.66	0.0062	129.66	0.0062	-	-	129.66	0.0062	100.00%
VIIA.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	103.73	0.0068	103.73	0.0068	-	-	103.73	0.0068	100.00%
VIIA.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	25.93	0.0020	25.93	0.0020	-	-	25.93	0.0020	100.00%
VIIA.1.d	Timbunan Tanah didatangkan dipedatkan jarak angkut <10 km	m3	33.34	0.0040	33.34	0.0040	-	-	33.34	0.0040	100.00%
VIIA.2	PEKERJAAN BETON										
VIIA.2.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	93.53	0.1049	93.53	0.1049	-	-	93.53	0.1049	100.00%
VIIA.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	4.11	0.0039	4.11	0.0039	-	-	4.11	0.0039	100.00%
VIIA.2.c	Penulangan D-16 mm	kg	7.427.56	0.1064	7.427.56	0.1064	-	-	7.427.56	0.1064	100.00%
VIIA.2.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	3.246.27	0.0465	3.246.27	0.0465	-	-	3.246.27	0.0465	100.00%
VIIA.2.e	Pekerjaan Bekisting Biasa (Tanpa perancah)	m2	406.69	0.0425	406.69	0.0425	-	-	406.69	0.0425	100.00%
VIIA.2.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	38.40	0.0050	38.40	0.0050	-	-	38.40	0.0050	100.00%
VIIA.2.g	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	m3	8.74	0.0001	8.74	0.0001	-	-	8.74	0.0001	100.00%
VIIA.2.h	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	m3	47.93	0.0007	47.93	0.0007	-	-	47.93	0.0007	100.00%
VIIA.3	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
VIIA.3.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	20.52	0.0080	20.52	0.0080	-	-	20.52	0.0080	100.00%
VIIA.3.b	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis planir, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	5.84	0.0002	5.84	0.0002	-	-	5.84	0.0002	100.00%
VIIA.3.c	Wire Mesh M8 (Negosiasi)	m2	4.00	0.0003	4.00	0.0003	-	-	4.00	0.0003	100.00%
VII.B	BANGUNAN SADAP BGKn 56			0.1201		0.1201		-		0.1201	100.00%
VII.B.1	PEKERJAAN BETON										
VII.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	14.48	0.0162	14.48	0.0162	-	-	14.48	0.0162	100.00%
VII.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.76	0.0026	2.76	0.0026	-	-	2.76	0.0026	100.00%
VII.B.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	914.09	0.0131	914.09	0.0131	-	-	914.09	0.0131	100.00%
VII.B.1.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	443.56	0.0064	443.56	0.0064	-	-	443.56	0.0064	100.00%
VII.B.1.e	Penulangan ø-10 mm (Negosiasi)	kg	3.38	0.0000	3.38	0.0000	-	-	3.38	0.0000	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%) PROSENTASI
VII.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	83.11	0.0087	83.11	0.0087	-	-	83.11	0.0087 100.00%
VII.B.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	3.36	0.0004	3.36	0.0004	-	-	3.36	0.0004 100.00%
VII.B.2	PEKERJAAN LAIN-LAIN									
VII.B.2.a	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m)	Bh	1.00	0.0221	1.00	0.0221	-	-	1.00	0.0221 100.00%
VII.B.2.b	Pemasangan Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75)	Bh	1.00	0.0072	1.00	0.0072	-	-	1.00	0.0072 100.00%
VII.B.2.C	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434 100.00%
VIII.	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN B.GKn.57.a (B.GKn.51e)			0.5893		0.5893		-		0.5893 100.00%
VIII.1	PEKERJAAN TANAH									
VIII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	200.50	0.0095	200.50	0.0095	-	-	200.50	0.0095 100.00%
VIII.1.a.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	154.42	0.0073	154.42	0.0073	-	-	154.42	0.0073 100.00%
VIII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	90.40	0.0059	90.40	0.0059	-	-	90.40	0.0059 100.00%
VIII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3								
VIII.1.d	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km (Negosiasi)	m3	160.22	0.0194	160.22	0.0194	-	-	160.22	0.0194 100.00%
VIII.1.e	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	264.52	0.0207	264.52	0.0207	-	-	264.52	0.0207 100.00%
VIII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
VIII.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	62.40	0.0571	62.40	0.0571	-	-	62.40	0.0571 100.00%
VIII.2.b	Saran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2								
VIII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	47.27	0.0038	47.27	0.0038	-	-	47.27	0.0038 100.00%
VIII.2.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	54.73	0.0044	54.73	0.0044	-	-	54.73	0.0044 100.00%
VIII.2.d	Pekerjaan Acian	m2	102.00	0.0047	102.00	0.0047	-	-	102.00	0.0047 100.00%
VIII.3	PEKERJAAN BETON									
VIII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	21.30	0.0239	21.30	0.0239	-	-	21.30	0.0239 100.00%
VIII.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	87.43	0.0980	87.43	0.0980	-	-	87.43	0.0980 100.00%
VIII.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	4.69	0.0044	4.69	0.0044	-	-	4.69	0.0044 100.00%
VIII.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	1.39	0.0013	1.39	0.0013	-	-	1.39	0.0013 100.00%
VIII.3.c	Penulangan Ø-8 mm	kg	5.45	0.0001	5.45	0.0001	-	-	5.45	0.0001 100.00%
VIII.3.d	Penulangan Ø-6 mm	kg								
VIII.3.e	Penulangan D-12 mm	kg								
VIII.3.f	Penulangan D-16 mm	kg	467.38	0.0067	467.38	0.0067	-	-	467.38	0.0067 100.00%
VIII.3.f.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,160.69	0.0309	2,160.69	0.0309	-	-	2,160.69	0.0309 100.00%
VIII.3.g	Penulangan D-19 mm	kg								
VIII.3.h	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2	64.41	0.0067	64.41	0.0067	-	-	64.41	0.0067 100.00%
VIII.3.h.1	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	652.74	0.0682	652.74	0.0682	-	-	652.74	0.0682 100.00%
VIII.3.i	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,797.01	0.0400	2,797.01	0.0400	-	-	2,797.01	0.0400 100.00%
VIII.3.j	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	9,539.96	0.1366	9,539.96	0.1366	-	-	9,539.96	0.1366 100.00%
VIII.3.k	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	704.92	0.0101	704.92	0.0101	-	-	704.92	0.0101 100.00%
VIII.3.l	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	132.56	0.0172	132.56	0.0172	-	-	132.56	0.0172 100.00%
VIII.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
VIII.4.a	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	10.40	0.0021	10.40	0.0021	-	-	10.40	0.0021 100.00%
VIII.4.b	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	25.76	0.0100	25.76	0.0100	-	-	25.76	0.0100 100.00%
VIII.4.C	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	5.19	0.0002	5.19	0.0002	-	-	5.19	0.0002 100.00%
IX.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER B.GKn.57.2 - B.GKn.59a (B.GKn.52 - B.GKn.53t)			1.4330		1.4330		-		1.4330 100.00%
IX.1	PEKERJAAN TANAH									
IX.1.a	Kupas Top Soil Menggunakan Bulldozer (Kupasan 20 Cm)	m2	2,533.75	0.0306	2,533.75	0.0306	-	-	2,533.75	0.0306 100.00%
IX.1.b	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	728.98	0.0202	728.98	0.0202	-	-	728.98	0.0202 100.00%
IX.1.b.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	808.02	0.0223	808.02	0.0223	-	-	808.02	0.0223 100.00%
IX.1.c	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	728.98	0.0690	728.98	0.0690	-	-	728.98	0.0690 100.00%
IX.1.c.1	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m (Negosiasi)	m3	473.64	0.0449	473.64	0.0449	-	-	473.64	0.0449 100.00%
IX.1.d	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	550.96	0.0936	550.96	0.0936	-	-	550.96	0.0936 100.00%
IX.1.d.1	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km (Negosiasi)	m3	194.91	0.0331	194.91	0.0331	-	-	194.91	0.0331 100.00%
IX.1.e	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3								
IX.1.f	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	841.12	0.0659	841.12	0.0659	-	-	841.12	0.0659 100.00%
IX.2	PEKERJAAN BETON									
IX.2.a	Pengadaan Beton Ready Mix K-225 Precast (U-Ditch 1.00x 1.00 x 0.12)	bh	690.00	0.9307	690.00	0.9307	-	-	690.00	0.9307 100.00%
IX.2.b	Pemasangan Beton Ready Mix K-225 Precast (U-Ditch 1.00x 1.00 x 0.12)	bh	690.00	0.0564	690.00	0.0564	-	-	690.00	0.0564 100.00%
IX.2.c	Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	53.79	0.0507	53.79	0.0507	-	-	53.79	0.0507 100.00%
IX.2.d	Lapisan Elastis/Berumen	m2								
IX.2.e	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Skim Coat (b=2 cm, L =5cm) (Negosiasi)	m2	38.92	0.0155	38.92	0.0155	-	-	38.92	0.0155 100.00%
IX.3	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
IX.3.a	Pemasangan Geblan Rumput	m2								
X.	PEKERJAAN BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.57.1a (B.GKn.51f)			1.0194		1.0194		-		1.0194 100.00%
X.1	PEKERJAAN TANAH									
X.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	66.22	0.0018	66.22	0.0018	-	-	66.22	0.0018 100.00%
X.1.a.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	610.06	0.0169	610.06	0.0169	-	-	610.06	0.0169 100.00%
X.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	26.32	0.0025	26.32	0.0025	-	-	26.32	0.0025 100.00%
X.1.b.1	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m (Negosiasi)	m3	412.19	0.0390	412.19	0.0390	-	-	412.19	0.0390 100.00%
X.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3								
X.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	237.77	0.0186	237.77	0.0186	-	-	237.77	0.0186 100.00%
X.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
X.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	26.43	0.0242	26.43	0.0242	-	-	26.43	0.0242 100.00%
X.2.a.1	Pasangan batu kali 1:4 (negosiasi)	m3	262.69	0.2407	262.69	0.2407	-	-	262.69	0.2407 100.00%
X.2.b	Saran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2	44.09	0.0028	44.09	0.0028	-	-	44.09	0.0028 100.00%
X.2.b.1	Saran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (negosiasi)	m2	113.90	0.0073	113.90	0.0073	-	-	113.90	0.0073 100.00%
X.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	16.13	0.0013	16.13	0.0013	-	-	16.13	0.0013 100.00%
X.2.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (negosiasi)	m2	455.44	0.0341	455.44	0.0341	-	-	455.44	0.0341 100.00%
X.2.d	Pekerjaan Acian	m2	471.57	0.0216	471.57	0.0216	-	-	471.57	0.0216 100.00%
X.3	PEKERJAAN BETON									
X.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	13.43	0.0151	13.43	0.0151	-	-	13.43	0.0151 100.00%
X.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	33.71	0.0378	33.71	0.0378	-	-	33.71	0.0378 100.00%
X.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	0.73	0.0007	0.73	0.0007	-	-	0.73	0.0007 100.00%
X.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.28	0.0021	2.28	0.0021	-	-	2.28	0.0021 100.00%
X.3.c	Penulangan D-12 mm	kg								
X.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	697.98	0.0100	697.98	0.0100	-	-	697.98	0.0100 100.00%
X.3.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,257.76	0.0323	2,257.76	0.0323	-	-	2,257.76	0.0323 100.00%
X.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	54.85	0.0057	54.85	0.0057	-	-	54.85	0.0057 100.00%
X.3.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	139.60	0.0146	139.60	0.0146	-	-	139.60	0.0146 100.00%
X.3.f	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	2,703.18	0.0387	2,703.18	0.0387	-	-	2,703.18	0.0387 100.00%
X.3.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	48.77	0.0063	48.77	0.0063	-	-	48.77	0.0063 100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTASI
X.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
X.4.a	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3	122.53	0.0385	122.53	0.0385	-	-	122.53	0.0385	100.00%
X.4.b	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	219.00	0.0485	219.00	0.0485	-	-	219.00	0.0485	100.00%
X.4.b.1	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	255.12	0.0426	255.12	0.0426	-	-	255.12	0.0426	100.00%
X.4.c	Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	7.32	0.0015	7.32	0.0015	-	-	7.32	0.0015	100.00%
X.4.d	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3	123.07	0.0338	123.07	0.0338	-	-	123.07	0.0338	100.00%
X.4.e	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2	628.20	0.0125	628.20	0.0125	-	-	628.20	0.0125	100.00%
X.4.f	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton	86.69	0.1504	86.69	0.1504	-	-	86.69	0.1504	100.00%
X.4.g	Lapis Perekat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2	628.20	0.0138	628.20	0.0138	-	-	628.20	0.0138	100.00%
X.4.h	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton	57.79	0.1035	57.79	0.1035	-	-	57.79	0.1035	100.00%
XI.	PEKERJAAN BANGUNAN SADAP B.Gkn.57.1 (B.Gkn.51)			0.4942		0.4942		-		0.4942	100.00%
XI.1	PEKERJAAN TANAH										
XI.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	212.83	0.0059	212.83	0.0059	-	-	212.83	0.0059	100.00%
XI.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	72.00	0.0068	72.00	0.0068	-	-	72.00	0.0068	100.00%
XI.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-			
XI.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	140.83	0.0110	140.83	0.0110	-	-	140.83	0.0110	100.00%
XI.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XI.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XI.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XI.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XI.3	PEKERJAAN BETON										
XI.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	24.59	0.0276	24.59	0.0276	-	-	24.59	0.0276	100.00%
XI.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	23.24	0.0261	23.24	0.0261	-	-	23.24	0.0261	100.00%
XI.3.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3	1.27	0.0012	1.27	0.0012	-	-	1.27	0.0012	100.00%
XI.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	3.02	0.0028	3.02	0.0028	-	-	3.02	0.0028	100.00%
XI.3.c	Penulangan D-12 mm	kg					-	-			
XI.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	1.185.45	0.0170	1.185.45	0.0170	-	-	1.185.45	0.0170	100.00%
XI.3.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2.497.78	0.0358	2.497.78	0.0358	-	-	2.497.78	0.0358	100.00%
XI.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	90.64	0.0095	90.64	0.0095	-	-	90.64	0.0095	100.00%
XI.3.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	157.08	0.0164	157.08	0.0164	-	-	157.08	0.0164	100.00%
XI.3.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2.095.30	0.0300	2.095.30	0.0300	-	-	2.095.30	0.0300	100.00%
XI.3.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	1.348.93	0.0193	1.348.93	0.0193	-	-	1.348.93	0.0193	100.00%
XI.3.h	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	1.761.19	0.0252	1.761.19	0.0252	-	-	1.761.19	0.0252	100.00%
XI.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	36.22	0.0047	36.22	0.0047	-	-	36.22	0.0047	100.00%
XI.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XI.4.a	Pintu Sorong Baja (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	2.00	0.1090	2.00	0.1090	-	-	2.00	0.1090	100.00%
XI.4.b	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m)	bh	1.00	0.0221	1.00	0.0221	-	-	1.00	0.0221	100.00%
XI.4.c	Pintu Angkat Box (b=0.30 m, h=0.50 m)	bh	1.00	0.0034	1.00	0.0034	-	-	1.00	0.0034	100.00%
XI.4.d	Pintu Angkat Box (b=0.40 m, h=0.50 m)	bh	1.00	0.0036	1.00	0.0036	-	-	1.00	0.0036	100.00%
XI.4.e	Shelter/Pelindung Pintu	unit	2.00	0.0868	2.00	0.0868	-	-	2.00	0.0868	100.00%
XI.4.f	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	2.00	0.0148	2.00	0.0148	-	-	2.00	0.0148	100.00%
XI.4.g	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=0.70 m)	bh	1.00	0.0072	1.00	0.0072	-	-	1.00	0.0072	100.00%
XI.4.h	Pemasangan Pintu Air (b=0.50 m, h=0.50 m)	bh	2.00	0.0049	2.00	0.0049	-	-	2.00	0.0049	100.00%
XI.4.i	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3					-	-			
XI.4.j	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3					-	-			
XI.4.k	Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	15.40	0.0031	15.40	0.0031	-	-	15.40	0.0031	100.00%
XI.4.l	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3					-	-			
XI.4.m	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2					-	-			
XI.4.n	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton					-	-			
XI.4.o	Lapis Perekat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2					-	-			
XI.4.p	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton					-	-			
XII.	PEKERJAAN BANGUNAN SADAP B.Gkn.57.2 (B.Gkn.52)			0.3902		0.3902		-		0.3902	100.00%
XII.1	PEKERJAAN TANAH										
XII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	106.29	0.0029	106.29	0.0029	-	-	106.29	0.0029	100.00%
XII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	37.03	0.0035	37.03	0.0035	-	-	37.03	0.0035	100.00%
XII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-			
XII.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	69.25	0.0054	69.25	0.0054	-	-	69.25	0.0054	100.00%
XII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XII.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XII.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XII.3	PEKERJAAN BETON										
XII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	24.33	0.0273	24.33	0.0273	-	-	24.33	0.0273	100.00%
XII.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	12.12	0.0136	12.12	0.0136	-	-	12.12	0.0136	100.00%
XII.3.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3	1.27	0.0012	1.27	0.0012	-	-	1.27	0.0012	100.00%
XII.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	1.88	0.0018	1.88	0.0018	-	-	1.88	0.0018	100.00%
XII.3.c	Penulangan D-12 mm	kg					-	-			
XII.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	1.160.90	0.0166	1.160.90	0.0166	-	-	1.160.90	0.0166	100.00%
XII.3.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg					-	-			
XII.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	90.60	0.0095	90.60	0.0095	-	-	90.60	0.0095	100.00%
XII.3.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	51.17	0.0053	51.17	0.0053	-	-	51.17	0.0053	100.00%
XII.3.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	486.76	0.0070	486.76	0.0070	-	-	486.76	0.0070	100.00%
XII.3.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	769.26	0.0110	769.26	0.0110	-	-	769.26	0.0110	100.00%
XII.3.h	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	680.51	0.0097	680.51	0.0097	-	-	680.51	0.0097	100.00%
XII.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	17.25	0.0022	17.25	0.0022	-	-	17.25	0.0022	100.00%
XII.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XII.4.a	Pintu Sorong Baja (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	1.00	0.0545	1.00	0.0545	-	-	1.00	0.0545	100.00%
XII.4.b	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=1.00 m, h=0.70 m)	bh					-	-			
XII.4.c	Pintu Angkat Box (b=0.50 m, h=0.50 m)	bh					-	-			
XII.4.d	Pintu Angkat Box (b=0.40 m, h=0.50 m)	bh					-	-			
XII.4.e	Shelter/Pelindung Pintu	unit	2.00	0.0868	2.00	0.0868	-	-	2.00	0.0868	100.00%
XII.4.e.1	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	unit	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434	100.00%
XII.4.f	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	1.00	0.0074	1.00	0.0074	-	-	1.00	0.0074	100.00%
XII.4.g	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=0.70 m)	bh					-	-			
XII.4.h	Pemasangan Pintu Air (b=0.50 m, h=0.50 m)	bh					-	-			
XII.4.i	Pemasangan Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	bh	2.00	0.0144	2.00	0.0144	-	-	2.00	0.0144	100.00%
XII.4.j	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3	7.20	0.0023	7.20	0.0023	-	-	7.20	0.0023	100.00%
XII.4.k	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3	9.60	0.0026	9.60	0.0026	-	-	9.60	0.0026	100.00%
XII.4.l	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	14.38	0.0024	14.38	0.0024	-	-	14.38	0.0024	100.00%
XII.4.m	Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	11.00	0.0022	11.00	0.0022	-	-	11.00	0.0022	100.00%
XII.4.n	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	bh	2.00	0.0442	2.00	0.0442	-	-	2.00	0.0442	100.00%
XI.4.o	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2					-	-			
XI.4.p	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton					-	-			
XI.4.q	Lapis Perekat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2	63.87	0.0014	63.87	0.0014	-	-	63.87	0.0014	100.00%
XI.4.r	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton	5.87	0.0105	5.87	0.0105	-	-	5.87	0.0105	100.00%
XI.4.s	Pekerjaan Marja Jalan	m2	4.10	0.0010	4.10	0.0010	-	-	4.10	0.0010	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-99		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTA SI
XIII.	PEK. BANGUNAN TERJUN 19 BUAH B.GKn.59.a-B.GKn.59.i dan B.GKn.59.k-B.GKn.59.s (B.GKn.53.a-B.GKn.53.i)										
XIII.1	PEKERJAAN TANAH										
XIII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3									
XIII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XIII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
XIII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XIII.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XIII.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XIII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XIII.A	PEK. BANGUNAN TERJUN 6 BUAH			0.0681		0.0681		-		0.0681	100.00%
XIII.A.1	PEKERJAAN TANAH										
XIII.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	34.94	0.0010	34.94	0.0010	-	-	34.94	0.0010	100.00%
XIII.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	16.56	0.0016	16.56	0.0016	-	-	16.56	0.0016	100.00%
XIII.A.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	18.38	0.0014	18.38	0.0014	-	-	18.38	0.0014	100.00%
XIII.A.2	PEKERJAAN BETON										
XIII.A.2.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	29.68	0.0333	29.68	0.0333	-	-	29.68	0.0333	100.00%
XIII.A.2.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.48	0.0023	2.48	0.0023	-	-	2.48	0.0023	100.00%
XIII.A.2.c	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	421.48	0.0060	421.48	0.0060	-	-	421.48	0.0060	100.00%
XIII.A.2.d	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	202.95	0.0029	202.95	0.0029	-	-	202.95	0.0029	100.00%
XIII.A.2.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	186.88	0.0195	186.88	0.0195	-	-	186.88	0.0195	100.00%
XIV.	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG JALAN 4 BUAH B.GKn.59.j dan B.GKn.59.t (B.GKn.53.j dan B.GKn.53.t)										
XIV.1	PEKERJAAN TANAH										
XIV.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3									
XIV.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XIV.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3									
XIV.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XIV.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XIV.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XIV.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XIV.3	PEKERJAAN BETON										
XIV.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
XIV.3.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3									
XIV.3.c	Penulangan D-12 mm	kg									
XIV.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									
XIV.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
XIV.A	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG JALAN 8 BUAH B.GKn.59.j dan B.GKn.59.t (B.GKn.53.j dan B.GKn.53.t)			0.2211		0.2211		-		0.2211	100.00%
XIV.A.1	PEKERJAAN TANAH										
XIV.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	22.55	0.0006	22.55	0.0006	-	-	22.55	0.0006	100.00%
XIV.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	13.80	0.0013	13.80	0.0013	-	-	13.80	0.0013	100.00%
XIV.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	8.75	0.0015	8.75	0.0015	-	-	8.75	0.0015	100.00%
XIV.A.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	8.75	0.0007	8.75	0.0007	-	-	8.75	0.0007	100.00%
XIV.A.2	PEKERJAAN BETON GORONG-GORONG JALAN										
XIV.A.2.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	63.03	0.0707	63.03	0.0707	-	-	63.03	0.0707	100.00%
XIV.A.2.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3	1.96	0.0018	1.96	0.0018	-	-	1.96	0.0018	100.00%
XIV.A.2.c	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	434.52	0.0454	434.52	0.0454	-	-	434.52	0.0454	100.00%
XIV.A.2.d	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	1,706.52	0.0244	1,706.52	0.0244	-	-	1,706.52	0.0244	100.00%
XIV.A.2.e	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	3,318.70	0.0475	3,318.70	0.0475	-	-	3,318.70	0.0475	100.00%
XIV.A.2.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	209.96	0.0272	209.96	0.0272	-	-	209.96	0.0272	100.00%
XV.	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN B.GKn.59a (B.GKn.53u)										
XV.1	PEKERJAAN TANAH										
XV.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3									
XV.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XV.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3									
XV.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XV.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3									
XV.2.b	Bongkar Beton	m3									
XV.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
XV.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XV.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XV.3.b	Siaran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XV.3.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XV.4	PEKERJAAN BETON										
XV.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
XV.4.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3									
XV.4.c	Penulangan D-12 mm	kg									
XV.4.d	Penulangan D-16 mm	kg									
XV.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
XV.A	PEKERJAAN BANGUNAN BOX CULVERT B.GKn.59a (B.GKn.53t)			0.2898		0.2898		-		0.2898	100.00%
XV.A.1	PEKERJAAN TANAH										
XV.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	41.22	0.0011	41.22	0.0011	-	-	41.22	0.0011	100.00%
XV.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	32.98	0.0031	32.98	0.0031	-	-	32.98	0.0031	100.00%
XV.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	52.57	0.0089	52.57	0.0089	-	-	52.57	0.0089	100.00%
XV.A.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XV.A.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	37.73	0.0029	37.73	0.0029	-	-	37.73	0.0029	100.00%
XV.A.2.b	Bongkar Beton	m3	5.49	0.0012	5.49	0.0012	-	-	5.49	0.0012	100.00%
XV.A.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	51.46	0.0040	51.46	0.0040	-	-	51.46	0.0040	100.00%
XV.A.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XV.A.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3					-	-			
XV.A.3.b	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2					-	-			
XV.A.4	PEKERJAAN BETON										
XV.A.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	43.61	0.0491	43.61	0.0491	-	-	43.61	0.0491	100.00%
XV.A.4.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3	3.21	0.0030	3.21	0.0030	-	-	3.21	0.0030	100.00%
XV.A.4.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,970.53	0.0425	2,970.53	0.0425	-	-	2,970.53	0.0425	100.00%
XV.A.4.d	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	151.29	0.0158	151.29	0.0158	-	-	151.29	0.0158	100.00%
XV.A.4.e	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	kg	2.05	0.0005	2.05	0.0005	-	-	2.05	0.0005	100.00%
XV.A.4.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	311.23	0.0045	311.23	0.0045	-	-	311.23	0.0045	100.00%
XV.A.4.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	11.53	0.0002	11.53	0.0002	-	-	11.53	0.0002	100.00%
XV.A.4.h	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	2,070.46	0.0296	2,070.46	0.0296	-	-	2,070.46	0.0296	100.00%
XV.A.4.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	20.23	0.0026	20.23	0.0026	-	-	20.23	0.0026	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTA SI
XV.A.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XV.A.5.a	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	17.29	0.0029	17.29	0.0029	-	-	17.29	0.0029	100.00%
XV.A.5.b	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3	7.10	0.0022	7.10	0.0022	-	-	7.10	0.0022	100.00%
XV.A.5.c	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3	9.47	0.0026	9.47	0.0026	-	-	9.47	0.0026	100.00%
XV.A.5.d	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	12.40	0.0048	12.40	0.0048	-	-	12.40	0.0048	100.00%
XV.A.5.e	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2	239.66	0.0048	239.66	0.0048	-	-	239.66	0.0048	100.00%
XV.A.5.f	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton	33.07	0.0574	33.07	0.0574	-	-	33.07	0.0574	100.00%
XV.A.5.g	Lapis Perelat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2	239.66	0.0053	239.66	0.0053	-	-	239.66	0.0053	100.00%
XV.A.5.h	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton	22.04	0.0395	22.04	0.0395	-	-	22.04	0.0395	100.00%
XV.A.5.i	Pekerjaan Marka Jalan (Negosiasi)	m2	6.03	0.0014	6.03	0.0014	-	-	6.03	0.0014	100.00%
XV.A.5.j	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	3.89	0.0002	3.89	0.0002	-	-	3.89	0.0002	100.00%
XVI.	PEKERJAAN BANGUNAN GORONG - GORONG PENGGANTI SIPHON B.GKn.59.b (B.GKn.53.v)										
XVI.1	PEKERJAAN TANAH										
XVI.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3									
XVI.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XVI.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3									
XVI.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XVI.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3									
XVI.2.b	Bongkar Beton	m3									
XVI.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
XVI.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XVI.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4										
XVI.3.b	Sieran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XVI.3.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XVI.4	PEKERJAAN BETON										
XVI.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
XVI.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
XVI.4.c	Penulangan D-12 mm	kg									
XVI.4.d	Penulangan D-16 mm	kg									
XVI.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
XVI.A	PEKERJAAN BANGUNAN TALANG PENGGANTI SIPHON B.GKn.59.b (B.GKn.53.v)			0.4840		0.4840		-		0.4840	100.00%
XVI.A.1	PEKERJAAN TANAH										
XVI.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	356.42	0.0099	356.42	0.0099	-	-	356.42	0.0099	100.00%
XVI.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	285.14	0.0270	285.14	0.0270	-	-	285.14	0.0270	100.00%
XVI.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	71.18	0.0121	71.18	0.0121	-	-	71.18	0.0121	100.00%
XVI.A.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XVI.A.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	102.76	0.0080	102.76	0.0080	-	-	102.76	0.0080	100.00%
XVI.A.2.b	Bongkar Beton	m3	53.66	0.0121	53.66	0.0121	-	-	53.66	0.0121	100.00%
XVI.A.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	227.70	0.0178	227.70	0.0178	-	-	227.70	0.0178	100.00%
XVI.A.3	PEKERJAAN BETON										
XVI.1.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	152.04	0.1705	152.04	0.1705	-	-	152.04	0.1705	100.00%
XVI.1.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	8.85	0.0083	8.85	0.0083	-	-	8.85	0.0083	100.00%
XVI.1.4.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,282.53	0.0327	2,282.53	0.0327	-	-	2,282.53	0.0327	100.00%
XVI.1.4.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	5,450.14	0.0780	5,450.14	0.0780	-	-	5,450.14	0.0780	100.00%
XVI.1.4.e	Penulangan D-16 mm	kg	2,184.73	0.0313	2,184.73	0.0313	-	-	2,184.73	0.0313	100.00%
XVI.1.4.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	445.01	0.0465	445.01	0.0465	-	-	445.01	0.0465	100.00%
XVI.1.4.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	99.49	0.0129	99.49	0.0129	-	-	99.49	0.0129	100.00%
XVI.1.5.h	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	m2	11.66	0.0002	11.66	0.0002	-	-	11.66	0.0002	100.00%
XVI.1.5.i	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	m2	108.50	0.0016	108.50	0.0016	-	-	108.50	0.0016	100.00%
XVI.1.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XVI.1.5.a	Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	10.80	0.0022	10.80	0.0022	-	-	10.80	0.0022	100.00%
XVI.1.5.b	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	32.80	0.0127	32.80	0.0127	-	-	32.80	0.0127	100.00%
XVI.1.5.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	7.78	0.0003	7.78	0.0003	-	-	7.78	0.0003	100.00%
XVII.	BANGUNAN BOX CULVERT / DEPAN BWS B.GKn.59.I (B.GKn.53.ss)			7.6584		7.6584		-		7.6584	100.00%
XVII.1	PEKERJAAN TANAH										
XVII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	2,677.56	0.0740	2,677.56	0.0740	-	-	2,677.56	0.0740	100.00%
XVII.1.a.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	4,148.49	0.1147	4,148.49	0.1147	-	-	4,148.49	0.1147	100.00%
XVII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XVII.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XVII.2.a	Bongkar Beton	m3	95.10	0.0214	95.10	0.0214	-	-	95.10	0.0214	100.00%
XVII.2.a.1	Bongkar Beton (Negosiasi)	m3	1.60	0.0010	1.60	0.0010	-	-	1.60	0.0010	100.00%
XVII.2.a.2	Bongkar Beton (Negosiasi)	m3	3.38	0.0001	3.38	0.0001	-	-	3.38	0.0001	100.00%
XVII.2.b	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
XVII.2.c	Bongkar Pasangan Batu	m3	56.70	0.0044	56.70	0.0044	-	-	56.70	0.0044	100.00%
XVII.2.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	2,802.86	0.2197	2,802.86	0.2197	-	-	2,802.86	0.2197	100.00%
XVII.2.d.1	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	4,182.97	0.3097	4,182.97	0.3097	-	-	4,182.97	0.3097	100.00%
XVII.2.e	Pembongkaran Paving Blok Trotoar	m2	263.63	0.0100	263.63	0.0100	-	-	263.63	0.0100	100.00%
XVII.2.f	Pembongkaran Kansteeen	m	156.10	0.0061	156.10	0.0061	-	-	156.10	0.0061	100.00%
XVII.2.g	Pemasangan Kembali Papan Reklame	Bh	3.00	0.0088	3.00	0.0088	-	-	3.00	0.0088	100.00%
XVII.2.h	Pembongkaran Papan Reklame	Bh	3.00	0.0033	3.00	0.0033	-	-	3.00	0.0033	100.00%
XVII.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XVII.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XVII.3.b	Sieran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XVII.3.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XVII.4	PEKERJAAN BETON										
XVII.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	485.87	0.5148	485.87	0.5148	-	-	485.87	0.5148	100.00%
XVII.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	69.30	0.0653	69.30	0.0653	-	-	69.30	0.0653	100.00%
XVII.4.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	8.37	0.0079	8.37	0.0079	-	-	8.37	0.0079	100.00%
XVII.4.c	Penulangan D-13 mm	kg	21,790.13	0.3120	21,790.13	0.3120	-	-	21,790.13	0.3120	100.00%
XVII.4.d	Penulangan D-16 mm	kg	33,035.90	0.4730	33,035.90	0.4730	-	-	33,035.90	0.4730	100.00%
XVII.4.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	1,933.15	0.0277	1,933.15	0.0277	-	-	1,933.15	0.0277	100.00%
XVII.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	2,006.52	0.2096	2,006.52	0.2096	-	-	2,006.52	0.2096	100.00%
XVII.4.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	236.32	0.0247	236.32	0.0247	-	-	236.32	0.0247	100.00%
XVII.4.f	Pengadaan Beton K-350 Precast Box Culvert (2.00m x 2.50m x 1.20 m) (Negosiasi)	Bh	101.00	2.7400	101.00	2.7400	-	-	101.00	2.7400	100.00%
XVII.5.g	Pemasangan Beton K-350 Precast Precast Box Culvert (2.00m x 2.50m x 1.20 m) (Negosiasi)	Bh	101.00	0.5610	101.00	0.5610	-	-	101.00	0.5610	100.00%
XVII.4.h	Pengis Dilatasi dengan Mortar Plesteran (L=2 cm, l=30 cm) (Negosiasi)	m2	57.85	0.0224	57.85	0.0224	-	-	57.85	0.0224	100.00%
XVII.4.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	409.86	0.0531	409.86	0.0531	-	-	409.86	0.0531	100.00%
XVII.4.j	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	3,095.00	0.0443	3,095.00	0.0443	-	-	3,095.00	0.0443	100.00%
XVII.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XVII.5.a	Pemasangan Water Stop (Type WSF 20 Cm)	m	143.00	0.0286	143.00	0.0286	-	-	143.00	0.0286	100.00%
XVII.5.a.1	Pemasangan Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	75.40	0.0151	75.40	0.0151	-	-	75.40	0.0151	100.00%
XVII.5.b	Lapisan Aspal 10 cm (2 lapis)	m2									
XVII.5.c	Lapisan Perkerasan Kelas A 40 cm	m3	160.60	0.0505	160.60	0.0505	-	-	160.60	0.0505	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
									PROSENTA SI	
XVII.5.c.1	Lapisan Perkerasan Keras A 40 cm (Negosiasi)	m3	265.97	0.0837	265.97	0.0837	-	-	265.97	0.0837
XVII.5.d	Urugan Pilihan 60 cm	m3					-	-		100.00%
XVII.5.e	Pekerjaan Marka Jalan (Negosiasi)	m2	66.91	0.0157	66.91	0.0157	-	-	66.91	0.0157
XVII.5.f	Pekerjaan Sondir (Negosiasi)	ttk	1.00	0.0078	1.00	0.0078	-	-	1.00	0.0078
XVII.5.g	Pekerjaan Timbunan Tasirtu (negosiasi)	m3	3,849.77	1.0057	3,849.77	1.0057	-	-	3,849.77	1.0057
XVII.5.h	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm	Ton	147.16	0.2553	147.16	0.2553	-	-	147.16	0.2553
XVII.5.i	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm	Ton	105.39	0.1888	105.39	0.1888	-	-	105.39	0.1888
XVII.5.j	Lapis Resap Pengikat (Prime coat)	m2	1,066.44	0.0213	1,066.44	0.0213	-	-	1,066.44	0.0213
XVII.5.k	Lapis Perelat (Tack Coat)	m2	1,161.86	0.0256	1,161.86	0.0256	-	-	1,161.86	0.0256
XVII.5.l	Pengadaan Paving Blok	m2	173.31	0.0266	173.31	0.0266	-	-	173.31	0.0266
XVII.5.m	Pemasangan Paving Blok	m2	263.63	0.0427	263.63	0.0427	-	-	263.63	0.0427
XVII.5.n	Pengadaan kansteen	Bh	196.00	0.0195	196.00	0.0195	-	-	196.00	0.0195
XVII.5.o	Pemasangan kansteen	m	234.10	0.0026	234.10	0.0026	-	-	234.10	0.0026
XVILA	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR BWS			1.0463		1.0463			1.0463	100.00%
XVILA.1	PEKERJAAN TANAH									
XVII.A.1.a	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	10.50	0.0096	10.50	0.0096	-	-	10.50	0.0096
XVILA.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XVII.A.2.a	Bongkar Beton Manual	m3	122.28	0.0202	122.28	0.0202	-	-	122.28	0.0202
XVILA.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XVII.A.3.a	Dinding Batu Merah tebal 1/2 bata campuran 1SP : 4 PP	m2	246.38	0.0340	246.38	0.0340	-	-	246.38	0.0340
XVII.A.3.b	Plesiran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	937.30	0.0702	937.30	0.0702	-	-	937.30	0.0702
XVII.A.3.c	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	937.30	0.0430	937.30	0.0430	-	-	937.30	0.0430
XVII.A.3.d	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	533.57	0.0218	533.57	0.0218	-	-	533.57	0.0218
XVILA.4	PEKERJAAN BETON									
XVII.A.4.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	7.61	0.0085	7.61	0.0085	-	-	7.61	0.0085
XVII.A.4.b	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	Kg	136.45	0.0020	136.45	0.0020	-	-	136.45	0.0020
XVII.A.4.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	Kg	1,020.55	0.0146	1,020.55	0.0146	-	-	1,020.55	0.0146
XVII.A.4.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	Kg	578.78	0.0083	578.78	0.0083	-	-	578.78	0.0083
XVII.A.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	148.25	0.0155	148.25	0.0155	-	-	148.25	0.0155
XVILA.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
XVII.A.5.a	Pekerjaan Arsitektur Pagar Kantor Bws	Ls	1.00	0.6284	1.00	0.6284	-	-	1.00	0.6284
XVII.A.5.b	Pekerjaan Melamilai Elektrikal Pagar Kantor Bws	Ls	1.00	0.1704	1.00	0.1704	-	-	1.00	0.1704
XVILB	PENGEMBALIAN BANGUNAN PAGAR WARGA			0.4284		0.4284			0.4284	100.00%
XVILB.1	PEKERJAAN TANAH									
XVII.B.1.a	Penggalan 1 m3 tanah biasa sedalam 1 s.d 2 m	m3	128.36	0.0123	128.36	0.0123	-	-	128.36	0.0123
XVII.B.1.b	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah manual	m3	36.80	0.0026	36.80	0.0026	-	-	36.80	0.0026
XVILB.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XVII.B.2.a	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	19.96	0.0031	19.96	0.0031	-	-	19.96	0.0031
XVII.B.2.b	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	77.69	0.0711	77.69	0.0711	-	-	77.69	0.0711
XVII.B.2.c	Pekerjaan Pasangan Batako	m2	251.48	0.0420	251.48	0.0420	-	-	251.48	0.0420
XVII.B.2.d	Plesiran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	1,070.24	0.0801	1,070.24	0.0801	-	-	1,070.24	0.0801
XVII.B.2.e	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	1,070.24	0.0491	1,070.24	0.0491	-	-	1,070.24	0.0491
XVII.B.2.f	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	1,070.24	0.0436	1,070.24	0.0436	-	-	1,070.24	0.0436
XVILB.3	PEKERJAAN BETON									
XVII.B.3.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	33.52	0.0376	33.52	0.0376	-	-	33.52	0.0376
XVII.A.3.b	Penulangan Ø - 10 mm (Negosiasi)	Kg	3,521.71	0.0504	3,521.71	0.0504	-	-	3,521.71	0.0504
XVII.A.3.c	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	Kg	348.55	0.0364	348.55	0.0364	-	-	348.55	0.0364
XVIII.	SALURAN PEMBUANG DARI BGK.n.59.e - BGK.n.59 (BGK.n.93.2 - BGK.n.53)			51.8051		51.8051			51.8051	100.00%
XVIII.1	PEKERJAAN TANAH									
XVIII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	51,935.49	1.4360	51,935.49	1.4360	-	-	51,935.49	1.4360
XVIII.1.b	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	30,722.69	5.2193	30,722.69	5.2193	-	-	30,722.69	5.2193
XVIII.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XVIII.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	6,816.31	0.5307	6,816.31	0.5307	-	-	6,816.31	0.5307
XVIII.2.b	Bongkar Beton	m3	301.05	0.0678	301.05	0.0678	-	-	301.05	0.0678
XVIII.2.b.1	Bongkar Beton (Negosiasi)	m3					-	-		
XVIII.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-		
XVIII.2.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	3,386.50	0.2654	3,386.50	0.2654	-	-	3,386.50	0.2654
XVIII.2.d.1	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	55,666.54	4.1214	55,666.54	4.1214	-	-	55,666.54	4.1214
XVIII.3	PEKERJAAN BETON									
XVIII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	8,277.34	9.2809	8,277.34	9.2809	-	-	8,277.34	9.2809
XVIII.3.b	Penulangan D-16 mm	kg	384,282.47	5.5023	384,282.47	5.5023	-	-	384,282.47	5.5023
XVIII.3.c	Penulangan D-13 mm	kg	278,831.86	3.9924	278,831.86	3.9924	-	-	278,831.86	3.9924
XVIII.3.d	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2	35,049.19	3.6608	35,049.19	3.6608	-	-	35,049.19	3.6608
XVIII.3.e	Pekerjaan Beton mutu f'c 24 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	1,066.83	1.0060	1,066.83	1.0060	-	-	1,066.83	1.0060
XVIII.3.f	Pengadaan Pre cast Udilh L , B= 3 Meter (negosiasi)	Bh	712.00	4.5565	712.00	4.5565	-	-	712.00	4.5565
XVIII.3.g	Pemasangan Pre cast Udilh L , B= 3 Meter (negosiasi)	Bh	712.00	0.3133	712.00	0.3133	-	-	712.00	0.3133
XVIII.3.h	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	196.18	0.0300	196.18	0.0300	-	-	196.18	0.0300
XVIII.3.i	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	384.66	0.0055	384.66	0.0055	-	-	384.66	0.0055
XVIII.3.j	Pekerjaan Perancah	m2	316.50	0.0410	316.50	0.0410	-	-	316.50	0.0410
XVIII.3.k	wire mesh m2	m2	699.06	0.0577	699.06	0.0577	-	-	699.06	0.0577
XVIII.3.l	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	m2	20.24	0.0003	20.24	0.0003	-	-	20.24	0.0003
XVIII.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
XVIII.4.a	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm)	m	2,777.50	0.5555	2,777.50	0.5555	-	-	2,777.50	0.5555
XVIII.4.a.1	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	2,165.59	0.4331	2,165.59	0.4331	-	-	2,165.59	0.4331
XVIII.4.b	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	64.27	0.0107	64.27	0.0107	-	-	64.27	0.0107
XVIII.4.c	Pekerjaan Perkerasan Jalan (Sub base coarse) (Negosiasi)	m2	7,846.49	0.5388	7,846.49	0.5388	-	-	7,846.49	0.5388
XVIII.4.d	Lapisan Perkerasan Keras A 40 cm	m3	118.85	0.0374	118.85	0.0374	-	-	118.85	0.0374
XVIII.4.e	Lapis Resap Pengikat (Prime coat)	m2	297.13	0.0059	297.13	0.0059	-	-	297.13	0.0059
XVIII.4.f	Lapis Perelat (Tack Coat)	m2	320.23	0.0071	320.23	0.0071	-	-	320.23	0.0071
XVIII.4.g	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm	Ton	41.00	0.0711	41.00	0.0711	-	-	41.00	0.0711
XVIII.4.h	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm	Ton	29.46	0.0528	29.46	0.0528	-	-	29.46	0.0528
XVIII.4.i	Guard Rail Kenderaan Tipe Ø	m	3,256.00	6.2176	3,256.00	6.2176	-	-	3,256.00	6.2176
XVIII.4.j	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Double Parabole Solar Cell	Bh	93.00	2.5413	93.00	2.5413	-	-	93.00	2.5413
XVIII.4.k	Bongkar Pasing Guard Rail Kendaraan Tipe B Existing	m	1,536.00	0.6688	1,536.00	0.6688	-	-	1,536.00	0.6688
XVIII.4.l	Pekerjaan Marka Jalan (Negosiasi)	m2	17.48	0.0041	17.48	0.0041	-	-	17.48	0.0041
XVIII.4.m	Bronjong Batu Kali (Negosiasi)	m3	32.00	0.0268	32.00	0.0268	-	-	32.00	0.0268
XVIII.5	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XVIII.5.a	Plesiran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	3,439.43	0.2576	3,439.43	0.2576	-	-	3,439.43	0.2576
XVIII.5.b	Pekerjaan Pas batu	m3	111.77	0.1023	111.77	0.1023	-	-	111.77	0.1023
XVIII.5.c	Pekerjaan Acian	m2	3,389.04	0.1553	3,389.04	0.1553	-	-	3,389.04	0.1553
XVIII.5.d	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Plerteran (L=2 cm, t=30 cm) (Negosiasi)	m2	55.72	0.0215	55.72	0.0215	-	-	55.72	0.0215
XVIII.5.e	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	13.00	0.0008	13.00	0.0008	-	-	13.00	0.0008
XVIII.5.f	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	18.66	0.0072	18.66	0.0072	-	-	18.66	0.0072
XVIII.5.g	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	48.55	0.0020	48.55	0.0020	-	-	48.55	0.0020
XVIII.A	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG			1.0972		1.0972			1.0972	100.00%
XVIII.A.1	PEKERJAAN BETON									
XVIII.A.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	328.59	0.3684	328.59	0.3684	-	-	328.59	0.3684
XVIII.A.1.b	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	4,812.92	0.0689	4,812.92	0.0689	-	-	4,812.92	0.0689
XVIII.A.1.c	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	15,921.35	0.2280	15,921.35	0.2280	-	-	15,921.35	0.2280
XVIII.A.1.d	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	9,315.59	0.1334	9,315.59	0.1334	-	-	9,315.59	0.1334

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						PROSENTA SI
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
XVIII.A.1.e	Pekerjaan Belisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	1,519.31	0.1587	1,519.31	0.1587	-	-	1,519.31	0.1587	100.00%
XVIII.A.1.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	1,018.68	0.1319	1,018.68	0.1319	-	-	1,018.68	0.1319	100.00%
XVIII.A.1.g	Wire Mesh (Negosiasi)	m2	96.00	0.0080	96.00	0.0080	-	-	96.00	0.0080	100.00%
XVIII.B	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN UMUM			1.6167		1.6167		-		1.6167	100.00%
XVIII.B.1	PEKERJAAN BETON										
XVIII.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	507.91	0.5695	507.91	0.5695	-	-	507.91	0.5695	100.00%
XVIII.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	38.28	0.0361	38.28	0.0361	-	-	38.28	0.0361	100.00%
XVIII.B.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	Kg	17,051.62	0.2442	17,051.62	0.2442	-	-	17,051.62	0.2442	100.00%
XVIII.B.1.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	Kg	10,882.55	0.1558	10,882.55	0.1558	-	-	10,882.55	0.1558	100.00%
XVIII.B.1.e	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	Kg	9,557.02	0.1368	9,557.02	0.1368	-	-	9,557.02	0.1368	100.00%
XVIII.B.1.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	Kg	1,726.45	0.0247	1,726.45	0.0247	-	-	1,726.45	0.0247	100.00%
XVIII.B.1.g	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	Kg	71.39	0.0010	71.39	0.0010	-	-	71.39	0.0010	100.00%
XVIII.B.1.h	Wire Mesh (Negosiasi)	m2	140.00	0.0116	140.00	0.0116	-	-	140.00	0.0116	100.00%
XVIII.B.1.i	Pekerjaan Belisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	1,882.16	0.1966	1,882.16	0.1966	-	-	1,882.16	0.1966	100.00%
XVIII.B.1.j	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	485.48	0.0628	485.48	0.0628	-	-	485.48	0.0628	100.00%
XVIII.B.2	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XVIII.B.2.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	320.00	0.1240	320.00	0.1240	-	-	320.00	0.1240	100.00%
XVIII.B.2.b	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	257.20	0.0514	257.20	0.0514	-	-	257.20	0.0514	100.00%
XVIII.B.2.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru / 1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	50.62	0.0021	50.62	0.0021	-	-	50.62	0.0021	100.00%
XIX.	PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG NGTA B.GKn.59.a - B.GKn.59.e (B.GKn.53.u - B.GKn.53.x)			2.1100		2.1100		-		2.1100	100.00%
XIX.1	PEKERJAAN TANAH										
XIX.1.a	Galian sedimen	m3	2,403.00	0.1143	2,403.00	0.1143	-	-	2,403.00	0.1143	100.00%
XIX.1.a.1	Galian sedimen (Negosiasi)	m3	260.64	0.0053	260.64	0.0053	-	-	260.64	0.0053	100.00%
XIX.1.b	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-			
XIX.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3					-	-			
XIX.1.c.1	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	7,838.65	0.5804	7,838.65	0.5804	-	-	7,838.65	0.5804	100.00%
XIX.1.d	Galian Tanah Basah (Negosiasi)	m3	5,175.01	0.2058	5,175.01	0.2058	-	-	5,175.01	0.2058	100.00%
XIX.2	PEKERJAAN BETON										
XIX.2.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	233.50	0.2618	233.50	0.2618	-	-	233.50	0.2618	100.00%
XIX.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	116.74	0.1101	116.74	0.1101	-	-	116.74	0.1101	100.00%
XIX.2.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	15,125.33	0.2166	15,125.33	0.2166	-	-	15,125.33	0.2166	100.00%
XIX.2.d	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	19.49	0.0020	19.49	0.0020	-	-	19.49	0.0020	100.00%
XIX.3	PEKERJAAN BONGKARAN										
XIX.3.a	Bongkar Pasangan Batu (Negosiasi)	m3	493.53	0.0384	493.53	0.0384	-	-	493.53	0.0384	100.00%
XIX.4	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XIX.4.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	522.67	0.4785	522.67	0.4785	-	-	522.67	0.4785	100.00%
XIX.4.b	Saran dengan mortar tipe M, f'c' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	944.02	0.0603	944.02	0.0603	-	-	944.02	0.0603	100.00%
XIX.4.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	281.11	0.0224	281.11	0.0224	-	-	281.11	0.0224	100.00%
XIX.4.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	188.27	0.0141	188.27	0.0141	-	-	188.27	0.0141	100.00%
XIX.A	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG P.131 (Depan Masjid)			0.0359		0.0359		-		0.0359	100.00%
XIX.A.1	PEKERJAAN BETON										
XIX.A.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	12.72	0.0143	12.72	0.0143	-	-	12.72	0.0143	100.00%
XIX.A.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.41	0.0004	0.41	0.0004	-	-	0.41	0.0004	100.00%
XIX.A.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	130.20	0.0019	130.20	0.0019	-	-	130.20	0.0019	100.00%
XIX.A.1.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	519.94	0.0074	519.94	0.0074	-	-	519.94	0.0074	100.00%
XIX.A.1.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	110.11	0.0016	110.11	0.0016	-	-	110.11	0.0016	100.00%
XIX.A.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	60.78	0.0063	60.78	0.0063	-	-	60.78	0.0063	100.00%
XIX.A.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-			
XIX.A.1.h	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	30.80	0.0040	30.80	0.0040	-	-	30.80	0.0040	100.00%
XIX.B	PEKERJAAN BANGUNAN SPILL WAY			0.3061		0.3061		-		0.3061	100.00%
XIX.B.1	PEKERJAAN BETON										
XIX.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	53.05	0.0595	53.05	0.0595	-	-	53.05	0.0595	100.00%
XIX.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	6.74	0.0064	6.74	0.0064	-	-	6.74	0.0064	100.00%
XIX.B.1.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	107.90	0.0015	107.90	0.0015	-	-	107.90	0.0015	100.00%
XIX.B.1.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	794.45	0.0114	794.45	0.0114	-	-	794.45	0.0114	100.00%
XIX.B.1.e	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	1,777.83	0.0255	1,777.83	0.0255	-	-	1,777.83	0.0255	100.00%
XIX.B.1.f	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,962.42	0.0424	2,962.42	0.0424	-	-	2,962.42	0.0424	100.00%
XIX.B.1.g	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	222.94	0.0233	222.94	0.0233	-	-	222.94	0.0233	100.00%
XIX.B.1.h	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-			
XIX.B.1.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	20.23	0.0026	20.23	0.0026	-	-	20.23	0.0026	100.00%
XIX.B.1.j	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	unit	4.77	0.0001	4.77	0.0001	-	-	4.77	0.0001	100.00%
XIX.B.2	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XIX.B.2.a	Pintu Sorong Baja (b=1.00 m, h=1.35 m) 2 stang (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0745	1.00	0.0745	-	-	1.00	0.0745	100.00%
XIX.B.2.b	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=1.35 m) (Negosiasi)	bh	1.00	0.0078	1.00	0.0078	-	-	1.00	0.0078	100.00%
XIX.B.2.c	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	unit	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434	100.00%
XIX.B.2.d	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	19.80	0.0077	19.80	0.0077	-	-	19.80	0.0077	100.00%
XIX.B.2.e	Pengecatan 1 m2 tembok baru / 1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	4.54	0.0002	4.54	0.0002	-	-	4.54	0.0002	100.00%
XIX.C	MONUMEN LIKUEFAKSI			0.4104		0.4104		-		0.4104	100.00%
XIX.C.1	PEKERJAAN TANAH										
XIX.C.1.a	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m (Negosiasi)	m3	418.16	0.0396	418.16	0.0396	-	-	418.16	0.0396	100.00%
XIX.C.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XIX.C.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	159.56	0.1461	159.56	0.1461	-	-	159.56	0.1461	100.00%
XIX.C.2.b	Pekerjaan Pasangan Batako	m2	8.97	0.0015	8.97	0.0015	-	-	8.97	0.0015	100.00%
XIX.C.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	6.62	0.0005	6.62	0.0005	-	-	6.62	0.0005	100.00%
XIX.C.2.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	136.96	0.0103	136.96	0.0103	-	-	136.96	0.0103	100.00%
XIX.C.2.d	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	143.58	0.0066	143.58	0.0066	-	-	143.58	0.0066	100.00%
XIX.C.2.e	Saran dengan mortar tipe M, f'c' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	242.87	0.0155	242.87	0.0155	-	-	242.87	0.0155	100.00%
XIX.C.3	PEKERJAAN BETON										
XIX.C.3.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	3.03	0.0034	3.03	0.0034	-	-	3.03	0.0034	100.00

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
					MINGGU LALU		MINGGU KE-90		S/D MINGGU KE-90		
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTASI
XIX.D.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XIX.D.3.a	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	0.57	0.0001	0.57	0.0001	-	-	0.57	0.0001	100.00%
XIX.D.3.c	Pasangan Batu Kali 1:1 (Negosiasi)	m3	1.68	0.0015	1.68	0.0015	-	-	1.68	0.0015	100.00%
XIX.D.3.d	Pekerjaan Pasangan Batako (Negosiasi)	m2	20.20	0.0034	20.20	0.0034	-	-	20.20	0.0034	100.00%
XIX.D.3.e	Plesteran ISP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	66.11	0.0053	66.11	0.0053	-	-	66.11	0.0053	100.00%
XIX.D.3.f	Pekerjaan Adlan (Negosiasi)	m2	66.11	0.0030	66.11	0.0030	-	-	66.11	0.0030	100.00%
XIX.D.3.g	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plantur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	66.11	0.0027	66.11	0.0027	-	-	66.11	0.0027	100.00%
XIX.D.4	PEKERJAAN BETON										
XIX.D.4.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	2.32	0.0026	2.32	0.0026	-	-	2.32	0.0026	100.00%
XIX.D.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.23	0.0002	0.23	0.0002	-	-	0.23	0.0002	100.00%
XIX.D.4.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	Kg	182.42	0.0026	182.42	0.0026	-	-	182.42	0.0026	100.00%
XIX.D.4.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	Kg	164.48	0.0024	164.48	0.0024	-	-	164.48	0.0024	100.00%
XIX.D.4.e	Penulangan Ø-13 mm (Negosiasi)	Kg	181.01	0.0026	181.01	0.0026	-	-	181.01	0.0026	100.00%
XIX.D.4.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	27.44	0.0029	27.44	0.0029	-	-	27.44	0.0029	100.00%
XIX.D.4.g	Pekerjaan Perancah	m2	10.67	0.0014	10.67	0.0014	-	-	10.67	0.0014	100.00%
XIX.D.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XIX.D.5.a	Pengadaan Paving Blok	m2	3.45	0.0005	3.45	0.0005	-	-	3.45	0.0005	100.00%
XIX.D.5.b	Pemasangan Paving Blok	m2	3.45	0.0006	3.45	0.0006	-	-	3.45	0.0006	100.00%
XIX.D.5.c	Pengadaan Kansteen	bh	50.00	0.0050	50.00	0.0050	-	-	50.00	0.0050	100.00%
XIX.D.5.d	Pemasangan kansteen	m1	25.00	0.0003	25.00	0.0003	-	-	25.00	0.0003	100.00%
XIX.D.5.e	Pemasangan 1m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40cm x 40cm (Negosiasi)	m2	3.69	0.0006	3.69	0.0006	-	-	3.69	0.0006	100.00%
XIX.D.5.f	Pemasangan 1 m' Kusen Aluminium (Negosiasi)	m1	25.08	0.0070	25.08	0.0070	-	-	25.08	0.0070	100.00%
XIX.D.5.g	Pemasangan 1 m2 Jendela kaca Rangka Aluminium (Negosiasi)	m2	15.08	0.0237	15.08	0.0237	-	-	15.08	0.0237	100.00%
XIX.D.5.h	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium (Negosiasi)	m2	10.00	0.0157	10.00	0.0157	-	-	10.00	0.0157	100.00%
XIX.D.5.i	Pengadaan dan Pemasangan Portal Barrier Gate (Negosiasi)	Unit	1.00	0.1892	1.00	0.1892	-	-	1.00	0.1892	100.00%
XIX.D.5.j	Pengadaan dan Penanaman Pohon halaman BWS (Negosiasi)	Ls	1.00	0.0365	1.00	0.0365	-	-	1.00	0.0365	100.00%
XIX.D.5.k	Pembuatan Pagar Besi Hollow Type 2 (Negosiasi)	m2	4.60	0.0045	4.60	0.0045	-	-	4.60	0.0045	100.00%
XIX.D.5.l	Pencetakan Permukaan Bata Secara Manual 3 Lapis (Negosiasi)	m2	19.24	0.0038	19.24	0.0038	-	-	19.24	0.0038	100.00%
	JUMLAH BOBOT REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN			100.0000		99.9937		0.0045		99.9982	
	BOBOT RENCANA KONTRAK KEMAJUAN PEKERJAAN					99.9920		0.0040		99.9960	
	DEVIASI					0.0018		0.0005		0.0022	

Disetujui Oleh :
DIREKSI PEKERJAAN





Di Periksa/setujui oleh :
Konsultan Supervisi
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Paku, 21 Juni 2025
Dibuat oleh :
KONTROLUR PELAKSANA





Palu, 30 Juni 2025
Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN											
Nama Paket : Improvement of Gumbasa Main Channel (BGKn.54 - BGKn.59)						BULAN : KE-23					
Pemberi Tugas : Balai Wilayah Sungai Sulawesi III						MINGGU : KE-91					
Lokasi : Kabupaten Sigi - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah						PERIODE : 22 JUNI 2025 - 30 JUNI 2025					
PPK : Irigasi dan Rawa I											
Tahun Anggaran : 2023 - 2025											
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTASI
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			2.1355		2.1337		0.0018		2.1355	100.00%
I.1	Mobilisasi dan Demobilisasi	ls	1.00	0.5372	1.00	0.5354	0.00	0.0018	1.00	0.5372	100.00%
I.2	Survey Pengukuran dan Penggambaran	ha	40.35	0.3553	40.35	0.3553	-	-	40.35	0.3553	100.00%
I.3	Laporan dan Foto	ls	1.00	0.0884	1.00	0.0884	-	-	1.00	0.0884	100.00%
I.4	Pembuatan Direksi Keel, Los Kerja dan Gudang	ls	1.00	0.7144	1.00	0.7144	-	-	1.00	0.7144	100.00%
I.5	Pemantauan Perlindungan Lingkungan	bulan	4.00	0.1365	4.00	0.1365	-	-	4.00	0.1365	100.00%
I.6	Papan Nama Proyek	Set	1.00	0.0011	1.00	0.0011	-	-	1.00	0.0011	100.00%
I.7	Pengeringan / Dewatering	ls	1.00	0.3026	1.00	0.3026	-	-	1.00	0.3026	100.00%
II.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI			0.8601		0.8601		-		0.8601	100.00%
II.1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	ls	1.00	0.8601	1.00	0.8601	-	-	1.00	0.8601	100.00%
III.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER B.GKn.54-B.GKn.57.2 (B.GKn.50-B.GKn.52)			22.9199		22.9199		-		22.9199	100.00%
III.1	PEKERJAAN TANAH										
III.1.a	Kupas Top Soil Menggunakan Bulldozer (Kupasan 20 Cm)	m2	20,522.65	0.2477	20,522.65	0.2477	-	-	20,522.65	0.2477	100.00%
III.1.a1	Kupas Top Soil Menggunakan Bulldozer (Kupasan 20 Cm) (Negosiasi)	m2	395.13	0.0021	395.13	0.0021	-	-	395.13	0.0021	100.00%
III.1.b	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	15,520.15	0.7379	15,520.15	0.7379	-	-	15,520.15	0.7379	100.00%
III.1.c	Timbunan Tanah Material Sekitar, kedalamn 2 m s/d <4 m	m3	1,737.35	0.1131	1,737.35	0.1131	-	-	1,737.35	0.1131	100.00%
III.1.d	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3	25,985.03	3.1493	25,985.03	3.1493	-	-	25,985.03	3.1493	100.00%
III.1.d.1	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km (Negosiasi)	m3	32,942.28	3.9924	32,942.28	3.9924	-	-	32,942.28	3.9924	100.00%
III.1.e	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	11,917.13	2.0345	11,917.13	2.0345	-	-	11,917.13	2.0345	100.00%
III.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
III.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	471.77	0.0367	471.77	0.0367	-	-	471.77	0.0367	100.00%
III.2.b	Bongkar Beton	m3	47.87	0.0108	47.87	0.0108	-	-	47.87	0.0108	100.00%
III.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	15,571.86	1.2206	15,571.86	1.2206	-	-	15,571.86	1.2206	100.00%
III.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
III.3.a	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran)	m3	284.45	0.0435	284.45	0.0435	-	-	284.45	0.0435	100.00%
III.3.b	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	253.00	0.2316	253.00	0.2316	-	-	253.00	0.2316	100.00%
III.3.b.1	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	845.53	0.7741	845.53	0.7741	-	-	845.53	0.7741	100.00%
III.3.c	Bronjong Batu Kali	m3	1,540.00	1.2893	1,540.00	1.2893	-	-	1,540.00	1.2893	100.00%
III.3.d	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	280.22	0.0224	280.22	0.0224	-	-	280.22	0.0224	100.00%
III.3.d.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	2,603.72	0.1950	2,603.72	0.1950	-	-	2,603.72	0.1950	100.00%
III.3.e	Pekerjaan Acian	m2	521.55	0.0241	521.55	0.0241	-	-	521.55	0.0241	100.00%
III.4	PEKERJAAN BETON										
III.4.a	Pengaduan Beton Ready Mix K-225 Precast (0,70 x 1,50 x 0,10 m)	bh	4,386.00	1.6660	4,386.00	1.6660	-	-	4,386.00	1.6660	100.00%
III.4.b	Pemasangan Beton Ready Mix K-225 Precast (0,70 x 1,50 x 0,10 m)	bh	4,386.00	0.3582	4,386.00	0.3582	-	-	4,386.00	0.3582	100.00%
III.4.c	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Sepatu Lining 0,30 x 0,40)	m3	361.59	0.4054	361.59	0.4054	-	-	361.59	0.4054	100.00%
III.4.d	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Capping + Saluran, b=2m, h=1,36m)	m3	738.53	0.8281	738.53	0.8281	-	-	738.53	0.8281	100.00%
III.4.e	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Lantai Saluran)	m3	136.40	0.1529	136.40	0.1529	-	-	136.40	0.1529	100.00%
III.4.e.1	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	63.19	0.0709	63.19	0.0709	-	-	63.19	0.0709	100.00%
III.4.f	Penulangan D-12 mm	kg	16,843.78	0.3417	16,843.78	0.3417	-	-	16,843.78	0.3417	100.00%
III.4.g	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	22,249.01	0.3186	22,249.01	0.3186	-	-	22,249.01	0.3186	100.00%
III.4.g.1	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	22,249.01	0.3186	22,249.01	0.3186	-	-	22,249.01	0.3186	100.00%
III.4.h	Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	62.11	0.0586	62.11	0.0586	-	-	62.11	0.0586	100.00%
III.4.i	Wiremesh M8 (Lantai & Capping)	m2	3,359.86	0.2783	3,359.86	0.2783	-	-	3,359.86	0.2783	100.00%
III.4.j	Pekerjaan Belisting Expose - Capping	m2	1,443.47	0.2128	1,443.47	0.2128	-	-	1,443.47	0.2128	100.00%
III.4.k	Pekerjaan Belisting Biasa (tanpa perancah)	m2	3,853.30	0.4025	3,853.30	0.4025	-	-	3,853.30	0.4025	100.00%
III.4.k.1	Pekerjaan Belisting Biasa (tanpa perancah)	m2	265.28	0.0277	265.28	0.0277	-	-	265.28	0.0277	100.00%
III.4.l	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	66,035.76	0.9455	66,035.76	0.9455	-	-	66,035.76	0.9455	100.00%
III.4.m	Beton Ready Mix K-225 Cast-in-situ (Side drainase Liquidaksi + Tangga Cuci)	m3	253.33	0.2840	253.33	0.2840	-	-	253.33	0.2840	100.00%
III.4.n	Pekerjaan Beton K-225	m3	17.32	0.0194	17.32	0.0194	-	-	17.32	0.0194	100.00%
III.4.o	Pekerjaan perancah (Negosiasi)	m3	42.90	0.0056	42.90	0.0056	-	-	42.90	0.0056	100.00%
III.5	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN										
III.5.a	Perkerasan Jalan Inspeksi (Sub Base Course)	m2	1,650.00	0.1133	1,650.00	0.1133	-	-	1,650.00	0.1133	100.00%
III.5.a.1	Perkerasan Jalan Inspeksi (Sub Base Course)	m2	3,566.37	0.2449	3,566.37	0.2449	-	-	3,566.37	0.2449	100.00%
III.5.b	Lapisan Elastis/Bitumen	m2									
III.6	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
III.6.a	Pemasangan Geomembrane Tebal 0,75 mm	m2	9,368.20	0.7478	9,368.20	0.7478	-	-	9,368.20	0.7478	100.00%
III.6.a.1	Pemasangan Geomembrane Tebal 0,75 mm (negosiasi)	m2	274.27	0.0186	274.27	0.0186	-	-	274.27	0.0186	100.00%
III.6.b	Gebalan Rumput	m2									
III.6.c	Pemasangan Geotekstil, Tipe-C, Non-Woven	m2	17,495.00	0.9955	17,495.00	0.9955	-	-	17,495.00	0.9955	100.00%
III.6.d	Patok Hektometer (Ha)	bh	58.00	0.0384	58.00	0.0384	-	-	58.00	0.0384	100.00%
III.6.e	Patok Kilometer (Km)	bh	6.00	0.0057	6.00	0.0057	-	-	6.00	0.0057	100.00%
III.6.f	Mistar Ular	bh	6.00	0.0032	6.00	0.0032	-	-	6.00	0.0032	100.00%
III.6.g	Water Stop (Type WSF 20 Cm)	m	165.00	0.0330	165.00	0.0330	-	-	165.00	0.0330	100.00%
III.6.g.1	Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	291.76	0.0583	291.76	0.0583	-	-	291.76	0.0583	100.00%
III.6.h	Pekerjaan Settlement Plate (Negosiasi)	Bh	5.00	0.0119	5.00	0.0119	-	-	5.00	0.0119	100.00%
III.6.i	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Slim Coat (t=2 cm, L=5'cm) (Negosiasi)	m2	202.87	0.0810	202.87	0.0810	-	-	202.87	0.0810	100.00%
III.6.j	Nomenklatur (Negosiasi)	Bh	106.00	0.0214	106.00	0.0214	-	-	106.00	0.0214	100.00%
III.6.k	Papan Eksploitasi (Papan Operasi) (Negosiasi)	Bh	4.00	0.0126	4.00	0.0126	-	-	4.00	0.0126	100.00%
III.6.l	1 m2 Pasang Geotekstil, Tipis (> 100 s.d < 400 gr/m2) (Negosiasi)	m2	800.00	0.0256	800.00	0.0256	-	-	800.00	0.0256	100.00%
III.6.m	Patok Pengarah (Negosiasi)	Bh	335.00	0.1001	335.00	0.1001	-	-	335.00	0.1001	100.00%
III.6.n	Patok Pembatas (Negosiasi)	Bh	80.00	0.0175	80.00	0.0175	-	-	80.00	0.0175	100.00%
IV.	PEKERJAAN BANGUNAN SIPHON B.GKn.55a (B.GKn.51a)										
IV.1	PEKERJAAN TANAH										
IV.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
IV.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
IV.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3									
IV.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
IV.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
IV.2.b	Sliran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
IV.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
IV.3	PEKERJAAN BETON										
IV.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
IV.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
IV.3.c	Pekerjaan Belisting biasa (tanpa perancah)	m2									
IV.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									

h h

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		5/D MINGGU KE-91		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTASI
IV.3.e	Penulangan D-12 mm	kg									
IV.3.f	Penulangan D-19 mm	kg									
IV.3.g	Penulangan Ø-8 mm	kg									
IV.3.h	Penulangan Ø-6 mm	kg									
IV.A	PEKERJAAN BANGUNAN TALANG DAN JEMBATAN B.GKn.55a (B.GKn.51a)			0.4012		0.4012		-		0.4012	100.00%
IV.A.1	PEKERJAAN TANAH										
IV.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	66.28	0.0032	66.28	0.0032	-	-	66.28	0.0032	100.00%
IV.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	53.02	0.0035	53.02	0.0035	-	-	53.02	0.0035	100.00%
IV.A.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	13.25	0.0010	13.25	0.0010	-	-	13.25	0.0010	100.00%
IV.A.1.d	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3	155.57	0.0189	155.57	0.0189	-	-	155.57	0.0189	100.00%
IV.A.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
IV.A.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3					-	-			
IV.A.2.b	Plasteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2					-	-			
IV.A.3	PEKERJAAN BETON										
IV.A.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	120.07	0.1346	120.07	0.1346	-	-	120.07	0.1346	100.00%
IV.A.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	17.93	0.0169	17.93	0.0169	-	-	17.93	0.0169	100.00%
IV.A.3.c	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	417.18	0.0436	417.18	0.0436	-	-	417.18	0.0436	100.00%
IV.A.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	3,622.68	0.0519	3,622.68	0.0519	-	-	3,622.68	0.0519	100.00%
IV.A.3.e	Penulangan Ø-8 mm	kg	7.34	0.0001	7.34	0.0001	-	-	7.34	0.0001	100.00%
IV.A.3.f	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	4,927.72	0.0706	4,927.72	0.0706	-	-	4,927.72	0.0706	100.00%
IV.A.3.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	536.58	0.0077	536.58	0.0077	-	-	536.58	0.0077	100.00%
IV.A.3.h	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,126.83	0.0305	2,126.83	0.0305	-	-	2,126.83	0.0305	100.00%
IV.A.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	53.44	0.0069	53.44	0.0069	-	-	53.44	0.0069	100.00%
IV.A.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
IV.A.4.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	25.80	0.0100	25.80	0.0100	-	-	25.80	0.0100	100.00%
IV.A.4.b	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	8.64	0.0017	8.64	0.0017	-	-	8.64	0.0017	100.00%
IV.A.4.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	6.49	0.0003	6.49	0.0003	-	-	6.49	0.0003	100.00%
IV.B	BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG B.GKn.55a.1			0.0355		0.0355		-		0.0355	100.00%
IV.B.1	PEKERJAAN BETON										
IV.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	10.76	0.0121	10.76	0.0121	-	-	10.76	0.0121	100.00%
IV.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	0.35	0.0003	0.35	0.0003	-	-	0.35	0.0003	100.00%
IV.B.1.c	Penulangan D-16 mm	kg	113.39	0.0016	113.39	0.0016	-	-	113.39	0.0016	100.00%
IV.B.1.d	Penulangan Ø-12 mm	kg	446.67	0.0064	446.67	0.0064	-	-	446.67	0.0064	100.00%
IV.B.1.e	Penulangan Ø-10 mm	kg	117.02	0.0017	117.02	0.0017	-	-	117.02	0.0017	100.00%
IV.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	71.54	0.0075	71.54	0.0075	-	-	71.54	0.0075	100.00%
IV.B.1.g	Pekerjaan Perancah	m2	46.20	0.0060	46.20	0.0060	-	-	46.20	0.0060	100.00%
V.	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.55b (B.GKn.51b)										
V.1	PEKERJAAN TANAH										
V.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
V.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
V.1.c	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3									
V.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
V.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
V.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
V.2.c	Plasteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
V.3	PEKERJAAN BETON										
V.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
V.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
V.3.c	Penulangan Ø-6 mm	kg									
V.3.d	Penulangan Ø-8 mm	kg									
V.3.e	Penulangan D-12 mm	kg									
V.3.f	Penulangan D-16 mm	kg									
V.3.g	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
V.A	PEK. BANGUNAN TALANG DAN JEMBATAN B.GKn.55b (B.GKn.51b)			0.7481		0.7481		-		0.7481	100.00%
V.A.1	PEKERJAAN TANAH										
V.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	33.85	0.0016	33.85	0.0016	-	-	33.85	0.0016	100.00%
V.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	27.08	0.0018	27.08	0.0018	-	-	27.08	0.0018	100.00%
V.A.1.c	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km	m3	1,079.33	0.1308	1,079.33	0.1308	-	-	1,079.33	0.1308	100.00%
V.A.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	6.77	0.0005	6.77	0.0005	-	-	6.77	0.0005	100.00%
V.A.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
V.A.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	53.15	0.0487	53.15	0.0487	-	-	53.15	0.0487	100.00%
V.A.2.b	Plasteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	47.80	0.0038	47.80	0.0038	-	-	47.80	0.0038	100.00%
V.A.2.c	Pekerjaan Acian	m2	83.05	0.0038	83.05	0.0038	-	-	83.05	0.0038	100.00%
V.A.2.d	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	83.05	0.0053	83.05	0.0053	-	-	83.05	0.0053	100.00%
V.A.3	PEKERJAAN BETON										
V.A.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	187.68	0.2104	187.68	0.2104	-	-	187.68	0.2104	100.00%
V.A.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	14.79	0.0139	14.79	0.0139	-	-	14.79	0.0139	100.00%
V.A.3.c	Penulangan Ø-8 mm	kg	9.72	0.0001	9.72	0.0001	-	-	9.72	0.0001	100.00%
V.A.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	2,491.59	0.0357	2,491.59	0.0357	-	-	2,491.59	0.0357	100.00%
V.A.3.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	3,701.82	0.0530	3,701.82	0.0530	-	-	3,701.82	0.0530	100.00%
V.A.3.f	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	748.36	0.0107	748.36	0.0107	-	-	748.36	0.0107	100.00%
V.A.3.g	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	8,734.78	0.1251	8,734.78	0.1251	-	-	8,734.78	0.1251	100.00%
V.A.3.h	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	756.11	0.0790	756.11	0.0790	-	-	756.11	0.0790	100.00%
V.A.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	101.19	0.0131	101.19	0.0131	-	-	101.19	0.0131	100.00%
V.A.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
V.A.4.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	24.00	0.0093	24.00	0.0093	-	-	24.00	0.0093	100.00%
V.A.4.b	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	6.07	0.0012	6.07	0.0012	-	-	6.07	0.0012	100.00%
V.A.4.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	6.49	0.0003	6.49	0.0003	-	-	6.49	0.0003	100.00%
V.B	BANGUNAN SADAP BGKn 51c.1			0.1636		0.1636		-		0.1636	100.00%
V.B.1	PEKERJAAN BETON										
V.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	25.07	0.0281	25.07	0.0281	-	-	25.07	0.0281	100.00%
V.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.93	0.0028	2.93	0.0028	-	-	2.93	0.0028	100.00%
V.B.1.c	Penulangan D-16 mm	kg	1,807.65	0.0259	1,807.65	0.0259	-	-	1,807.65	0.0259	100.00%
V.B.1.d	Penulangan D-13 mm	kg	1,132.20	0.0162	1,132.20	0.0162	-	-	1,132.20	0.0162	100.00%
V.B.1.e	Penulangan Ø-10 mm	kg	3.38	0.0000	3.38	0.0000	-	-	3.38	0.0000	100.00%
V.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	167.57	0.0175	167.57	0.0175	-	-	167.57	0.0175	100.00%
V.B.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-			
V.B.1.g.1	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	2.75	0.0004	2.75	0.0004	-	-	2.75	0.0004	100.00%
V.B.2	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
V.B.2.a	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0221	1.00	0.0221	-	-	1.00	0.0221	100.00%
V.B.2.b	Pemasangan Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0072	1.00	0.0072	-	-	1.00	0.0072	100.00%
V.B.2.c	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTA SI
V.C	BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DEPAN GILINGAN PADI			0.0318		0.0318		-		0.0318	100.00%
V.C.1	PEKERJAAN BETON										
V.C.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	8.78	0.0098	8.78	0.0098	-	-	8.78	0.0098	100.00%
V.C.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.35	0.0003	0.35	0.0003	-	-	0.35	0.0003	100.00%
V.C.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	101.80	0.0015	101.80	0.0015	-	-	101.80	0.0015	100.00%
V.C.1.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	402.90	0.0058	402.90	0.0058	-	-	402.90	0.0058	100.00%
V.C.1.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	81.87	0.0012	81.87	0.0012	-	-	81.87	0.0012	100.00%
V.C.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	70.05	0.0073	70.05	0.0073	-	-	70.05	0.0073	100.00%
V.C.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-			
V.C.1.g.1	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	45.50	0.0059	45.50	0.0059	-	-	45.50	0.0059	100.00%
VI.	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.54c (B.GKn.51c)										
VI.1	PEKERJAAN TANAH										
VI.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
VI.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
VI.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3									
VI.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
VI.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
VI.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
VI.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
VI.3	PEKERJAAN BETON										
VI.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
VI.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
VI.3.c	Penulangan D-12 mm	kg									
VI.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									
VI.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
VIA	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG B.GKn.54c (B.GKn.51c)			0.3889		0.3889		-		0.3889	100.00%
VIA.1	PEKERJAAN TANAH										
VIA.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	479.97	0.0228	479.97	0.0228	-	-	479.97	0.0228	100.00%
VIA.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	321.53	0.0209	321.53	0.0209	-	-	321.53	0.0209	100.00%
VIA.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	158.44	0.0124	158.44	0.0124	-	-	158.44	0.0124	100.00%
VIA.2	PEKERJAAN BETON										
VIA.2.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	97.93	0.1098	97.93	0.1098	-	-	97.93	0.1098	100.00%
VIA.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	4.32	0.0041	4.32	0.0041	-	-	4.32	0.0041	100.00%
VIA.2.c	Penulangan D-16 mm	kg	7,748.77	0.1109	7,748.77	0.1109	-	-	7,748.77	0.1109	100.00%
VIA.2.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	3,482.25	0.0499	3,482.25	0.0499	-	-	3,482.25	0.0499	100.00%
VIA.2.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	416.22	0.0435	416.22	0.0435	-	-	416.22	0.0435	100.00%
VIA.2.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	40.13	0.0052	40.13	0.0052	-	-	40.13	0.0052	100.00%
VIA.2.g	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	m3	8.74	0.0001	8.74	0.0001	-	-	8.74	0.0001	100.00%
VIA.2.h	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	m3	47.93	0.0007	47.93	0.0007	-	-	47.93	0.0007	100.00%
VIA.3	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
VIA.3.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	20.52	0.0080	20.52	0.0080	-	-	20.52	0.0080	100.00%
VIA.3.b	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	5.84	0.0002	5.84	0.0002	-	-	5.84	0.0002	100.00%
VIA.3.c	Wire Mesh M8 (Negosiasi)	m2	4.00	0.0003	4.00	0.0003	-	-	4.00	0.0003	100.00%
VI.B	BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG B.GKn.54c.1			0.0355		0.0355		-		0.0355	100.00%
VI.B.1	PEKERJAAN BETON										
VI.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	10.76	0.0121	10.76	0.0121	-	-	10.76	0.0121	100.00%
VI.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.35	0.0003	0.35	0.0003	-	-	0.35	0.0003	100.00%
VI.B.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	113.39	0.0016	113.39	0.0016	-	-	113.39	0.0016	100.00%
VI.B.1.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	446.67	0.0064	446.67	0.0064	-	-	446.67	0.0064	100.00%
VI.B.1.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	117.02	0.0017	117.02	0.0017	-	-	117.02	0.0017	100.00%
VI.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	71.54	0.0075	71.54	0.0075	-	-	71.54	0.0075	100.00%
VI.B.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	46.20	0.0060	46.20	0.0060	-	-	46.20	0.0060	100.00%
VII.	PEK BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.GKn.56.a (B.GKn.51d)										
VII.1	PEKERJAAN TANAH										
VII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3									
VII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
VII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3									
VII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
VII.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
VII.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
VII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
VII.3	PEKERJAAN BETON										
VII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
VII.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3									
VII.3.c	Penulangan D-12 mm	kg									
VII.3.d	Penulangan D-16 mm	kg									
VII.3.e	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2									
VII.A	PEK BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG B.GKn.56.a (B.GKn.51d)			0.3373		0.3373		-		0.3373	100.00%
VII.A.1	PEKERJAAN TANAH										
VII.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	129.66	0.0062	129.66	0.0062	-	-	129.66	0.0062	100.00%
VII.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	103.73	0.0068	103.73	0.0068	-	-	103.73	0.0068	100.00%
VII.A.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	25.93	0.0020	25.93	0.0020	-	-	25.93	0.0020	100.00%
VII.A.1.d	Timbunan Tanah didatangkan dipedatkan jarak angkut <10 km	m3	33.34	0.0040	33.34	0.0040	-	-	33.34	0.0040	100.00%
VII.A.2	PEKERJAAN BETON										
VII.A.2.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	93.53	0.1049	93.53	0.1049	-	-	93.53	0.1049	100.00%
VII.A.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	4.11	0.0039	4.11	0.0039	-	-	4.11	0.0039	100.00%
VII.A.2.c	Penulangan D-16 mm	kg	7,427.56	0.1064	7,427.56	0.1064	-	-	7,427.56	0.1064	100.00%
VII.A.2.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	3,246.27	0.0465	3,246.27	0.0465	-	-	3,246.27	0.0465	100.00%
VII.A.2.e	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2	406.69	0.0425	406.69	0.0425	-	-	406.69	0.0425	100.00%
VII.A.2.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	38.40	0.0050	38.40	0.0050	-	-	38.40	0.0050	100.00%
VII.A.2.g	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	m3	8.74	0.0001	8.74	0.0001	-	-	8.74	0.0001	100.00%
VII.A.2.h	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	m3	47.93	0.0007	47.93	0.0007	-	-	47.93	0.0007	100.00%
VII.A.3	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
VII.A.3.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	20.52	0.0080	20.52	0.0080	-	-	20.52	0.0080	100.00%
VII.A.3.b	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	5.84	0.0002	5.84	0.0002	-	-	5.84	0.0002	100.00%
VII.A.3.c	Wire Mesh M8 (Negosiasi)	m2	4.00	0.0003	4.00	0.0003	-	-	4.00	0.0003	100.00%
VII.B	BANGUNAN SADAP B.GKn.56			0.1201		0.1201		-		0.1201	100.00%
VII.B.1	PEKERJAAN BETON										
VII.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	14.48	0.0162	14.48	0.0162	-	-	14.48	0.0162	100.00%
VII.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.76	0.0026	2.76	0.0026	-	-	2.76	0.0026	100.00%
VII.B.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	914.09	0.0131	914.09	0.0131	-	-	914.09	0.0131	100.00%
VII.B.1.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	443.56	0.0064	443.56	0.0064	-	-	443.56	0.0064	100.00%
VII.B.1.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	3.38	0.0000	3.38	0.0000	-	-	3.38	0.0000	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTA SI
VII.B.1.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	83.11	0.0087	83.11	0.0087	-	-	83.11	0.0087	100.00%
VII.B.1.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	3.36	0.0004	3.36	0.0004	-	-	3.36	0.0004	100.00%
VII.B.2	PEKERJAAN LAIN-LAIN										
VII.B.2.a	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m)	Bh	1.00	0.0221	1.00	0.0221	-	-	1.00	0.0221	100.00%
VII.B.2.b	Pemasangan Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75)	Bh	1.00	0.0072	1.00	0.0072	-	-	1.00	0.0072	100.00%
VII.B.2.C	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	Bh	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434	100.00%
VIII.	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN B.Gkn.57.a (B.Gkn.51e)			0.5893		0.5893		-		0.5893	100.00%
VIII.1	PEKERJAAN TANAH										
VIII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT	m3	200.50	0.0095	200.50	0.0095	-	-	200.50	0.0095	100.00%
VIII.1.a.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator Long Arm) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	154.42	0.0073	154.42	0.0073	-	-	154.42	0.0073	100.00%
VIII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	90.40	0.0059	90.40	0.0059	-	-	90.40	0.0059	100.00%
VIII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
VIII.1.d	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut <10 km (Negosiasi)	m3	160.22	0.0194	160.22	0.0194	-	-	160.22	0.0194	100.00%
VIII.1.e	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	264.52	0.0207	264.52	0.0207	-	-	264.52	0.0207	100.00%
VIII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
VIII.2.a	Pasangan Batu Kali L-4	m3	62.40	0.0571	62.40	0.0571	-	-	62.40	0.0571	100.00%
VIII.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
VIII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	47.27	0.0038	47.27	0.0038	-	-	47.27	0.0038	100.00%
VIII.2.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	54.73	0.0044	54.73	0.0044	-	-	54.73	0.0044	100.00%
VIII.2.d	Pekerjaan Acian	m2	102.00	0.0047	102.00	0.0047	-	-	102.00	0.0047	100.00%
VIII.3	PEKERJAAN BETON										
VIII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	21.30	0.0239	21.30	0.0239	-	-	21.30	0.0239	100.00%
VIII.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	87.43	0.0980	87.43	0.0980	-	-	87.43	0.0980	100.00%
VIII.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	4.69	0.0044	4.69	0.0044	-	-	4.69	0.0044	100.00%
VIII.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	1.39	0.0013	1.39	0.0013	-	-	1.39	0.0013	100.00%
VIII.3.c	Penulangan Ø-8 mm	kg	5.45	0.0001	5.45	0.0001	-	-	5.45	0.0001	100.00%
VIII.3.d	Penulangan Ø-6 mm	kg									
VIII.3.e	Penulangan D-12 mm	kg									
VIII.3.f	Penulangan D-16 mm	kg	467.38	0.0067	467.38	0.0067	-	-	467.38	0.0067	100.00%
VIII.3.f.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,160.69	0.0309	2,160.69	0.0309	-	-	2,160.69	0.0309	100.00%
VIII.3.g	Penulangan D-19 mm	kg									
VIII.3.h	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah)	m2	64.41	0.0067	64.41	0.0067	-	-	64.41	0.0067	100.00%
VIII.3.h.1	Pekerjaan Bekisting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	652.74	0.0682	652.74	0.0682	-	-	652.74	0.0682	100.00%
VIII.3.i	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,797.01	0.0400	2,797.01	0.0400	-	-	2,797.01	0.0400	100.00%
VIII.3.j	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	9,539.96	0.1366	9,539.96	0.1366	-	-	9,539.96	0.1366	100.00%
VIII.3.k	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	704.92	0.0101	704.92	0.0101	-	-	704.92	0.0101	100.00%
VIII.3.l	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	132.56	0.0172	132.56	0.0172	-	-	132.56	0.0172	100.00%
VIII.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
VIII.4.a	Pemasangan Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	10.40	0.0021	10.40	0.0021	-	-	10.40	0.0021	100.00%
VIII.4.b	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	25.76	0.0100	25.76	0.0100	-	-	25.76	0.0100	100.00%
VIII.4.C	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	5.19	0.0002	5.19	0.0002	-	-	5.19	0.0002	100.00%
IX.	PEKERJAAN SALURAN PRIMER B.Gkn.57.2 - B.Gkn.59a (B.Gkn.52 - B.Gkn.53t)			1.4330		1.4330		-		1.4330	100.00%
IX.1	PEKERJAAN TANAH										
IX.1.a	Kupas Top Soil Menggunakan Bulldozer (Kupasan 20 Cm)	m2	2,533.75	0.0306	2,533.75	0.0306	-	-	2,533.75	0.0306	100.00%
IX.1.b	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	728.98	0.0202	728.98	0.0202	-	-	728.98	0.0202	100.00%
IX.1.b.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	808.02	0.0223	808.02	0.0223	-	-	808.02	0.0223	100.00%
IX.1.c	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	728.98	0.0690	728.98	0.0690	-	-	728.98	0.0690	100.00%
IX.1.c.1	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m (Negosiasi)	m3	473.64	0.0449	473.64	0.0449	-	-	473.64	0.0449	100.00%
IX.1.d	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	550.96	0.0936	550.96	0.0936	-	-	550.96	0.0936	100.00%
IX.1.d.1	Timbunan Tanah ditatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km (Negosiasi)	m3	194.91	0.0331	194.91	0.0331	-	-	194.91	0.0331	100.00%
IX.1.e	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
IX.1.f	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	841.12	0.0659	841.12	0.0659	-	-	841.12	0.0659	100.00%
IX.2	PEKERJAAN BETON										
IX.2.a	Pengadaan Beton Ready Mix K-225 Precast (U-Ditch 1.00x 1.00 x 0.12)	bh	690.00	0.9307	690.00	0.9307	-	-	690.00	0.9307	100.00%
IX.2.b	Pemasangan Beton Ready Mix K-225 Precast (U-Ditch 1.00x 1.00 x 0.12)	bh	690.00	0.0564	690.00	0.0564	-	-	690.00	0.0564	100.00%
IX.2.c	Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	53.79	0.0507	53.79	0.0507	-	-	53.79	0.0507	100.00%
IX.2.d	Lapisan Elastis/Bitumen	m2									
IX.2.e	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Skim Coat (t=2 cm, L =5'cm) (Negosiasi)	m2	38.92	0.0155	38.92	0.0155	-	-	38.92	0.0155	100.00%
IX.3	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
IX.3.a	Pemasangan Gebalan Rumpuk	m2									
X.	PEK BANGUNAN GORONG - GORONG SILANG DAN JEMBATAN B.Gkn.57.1a (B.Gkn.51f)			1.0194		1.0194		-		1.0194	100.00%
X.1	PEKERJAAN TANAH										
X.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	66.22	0.0018	66.22	0.0018	-	-	66.22	0.0018	100.00%
X.1.a.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	610.06	0.0169	610.06	0.0169	-	-	610.06	0.0169	100.00%
X.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	26.32	0.0025	26.32	0.0025	-	-	26.32	0.0025	100.00%
X.1.b.1	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m (Negosiasi)	m3	412.19	0.0390	412.19	0.0390	-	-	412.19	0.0390	100.00%
X.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
X.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	237.77	0.0186	237.77	0.0186	-	-	237.77	0.0186	100.00%
X.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
X.2.a	Pasangan Batu Kali L-4	m3	26.43	0.0242	26.43	0.0242	-	-	26.43	0.0242	100.00%
X.2.a.1	Pasangan Batu Kali L-4 (negosiasi)	m3	262.69	0.2407	262.69	0.2407	-	-	262.69	0.2407	100.00%
X.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2	44.09	0.0028	44.09	0.0028	-	-	44.09	0.0028	100.00%
X.2.b.1	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (negosiasi)	m2	113.90	0.0073	113.90	0.0073	-	-	113.90	0.0073	100.00%
X.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	16.13	0.0013	16.13	0.0013	-	-	16.13	0.0013	100.00%
X.2.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (negosiasi)	m2	455.44	0.0341	455.44	0.0341	-	-	455.44	0.0341	100.00%
X.2.d	Pekerjaan Acian	m2	471.57	0.0216	471.57	0.0216	-	-	471.57	0.0216	100.00%
X.3	PEKERJAAN BETON										
X.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	13.43	0.0151	13.43	0.0151	-	-	13.43	0.0151	100.00%
X.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	33.71	0.0378	33.71	0.0378	-	-	33.71	0.0378	100.00%
X.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	0.73	0.0007	0.73	0.0007	-	-	0.73	0.0007	100.00%
X.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.28	0.0021	2.28	0.0021	-	-	2.28	0.0021	100.00%
X.3.c	Penulangan D-12 mm	kg									
X.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	697.98	0.0100	697.98	0.0100	-	-	697.98	0.0100	100.00%
X.3.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,257.76	0.0323	2,257.76	0.0323	-	-	2,257.76	0.0323	100.00%
X.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	54.85	0.0057	54.85	0.0057	-	-	54.85	0.0057	100.00%
X.3.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	139.60	0.0146	139.60	0.0146	-	-	139.60	0.0146	100.00%
X.3.f	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	2,703.18	0.0387	2,703.18	0.0387	-	-	2,703.18	0.0387	100.00%
X.3.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	48.77	0.0063	48.77	0.0063	-	-	48.77	0.0063	100.00%

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTASI
X.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
X.4.a	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3	122.53	0.0385	122.53	0.0385	-	-	122.53	0.0385	100.00%
X.4.b	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	219.00	0.0485	219.00	0.0485	-	-	219.00	0.0485	100.00%
X.4.b.1	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	255.12	0.0426	255.12	0.0426	-	-	255.12	0.0426	100.00%
X.4.c	Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	7.32	0.0015	7.32	0.0015	-	-	7.32	0.0015	100.00%
X.4.d	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3	123.07	0.0338	123.07	0.0338	-	-	123.07	0.0338	100.00%
X.4.e	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2	628.20	0.0125	628.20	0.0125	-	-	628.20	0.0125	100.00%
X.4.f	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton	86.69	0.1504	86.69	0.1504	-	-	86.69	0.1504	100.00%
X.4.g	Lapis Perikat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2	628.20	0.0138	628.20	0.0138	-	-	628.20	0.0138	100.00%
X.4.h	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton	57.79	0.1035	57.79	0.1035	-	-	57.79	0.1035	100.00%
XI.	PEKERJAAN BANGUNAN SADAP B.GKn.57.1 (B.GKn.51)			0.4942		0.4942		-		0.4942	100.00%
XI.1	PEKERJAAN TANAH										
XI.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	212.83	0.0059	212.83	0.0059	-	-	212.83	0.0059	100.00%
XI.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	72.00	0.0068	72.00	0.0068	-	-	72.00	0.0068	100.00%
XI.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-			
XI.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	140.83	0.0110	140.83	0.0110	-	-	140.83	0.0110	100.00%
XI.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XI.2.a	Pasangan Batu Kali 1-4	m3									
XI.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XI.2.c	Plesteran ISP : 3PP tebal 15mm	m2									
XI.3	PEKERJAAN BETON										
XI.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	24.59	0.0276	24.59	0.0276	-	-	24.59	0.0276	100.00%
XI.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	23.24	0.0261	23.24	0.0261	-	-	23.24	0.0261	100.00%
XI.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	1.27	0.0012	1.27	0.0012	-	-	1.27	0.0012	100.00%
XI.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	3.02	0.0028	3.02	0.0028	-	-	3.02	0.0028	100.00%
XI.3.c	Penulangan D-12 mm	kg					-	-			
XI.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	1,185.45	0.0170	1,185.45	0.0170	-	-	1,185.45	0.0170	100.00%
XI.3.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,497.78	0.0358	2,497.78	0.0358	-	-	2,497.78	0.0358	100.00%
XI.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	90.64	0.0095	90.64	0.0095	-	-	90.64	0.0095	100.00%
XI.3.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	157.08	0.0164	157.08	0.0164	-	-	157.08	0.0164	100.00%
XI.3.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,095.30	0.0300	2,095.30	0.0300	-	-	2,095.30	0.0300	100.00%
XI.3.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	1,348.93	0.0193	1,348.93	0.0193	-	-	1,348.93	0.0193	100.00%
XI.3.h	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	1,761.19	0.0252	1,761.19	0.0252	-	-	1,761.19	0.0252	100.00%
XI.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	36.22	0.0047	36.22	0.0047	-	-	36.22	0.0047	100.00%
XI.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XI.4.a	Pintu Sorong Baja (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	2.00	0.1090	2.00	0.1090	-	-	2.00	0.1090	100.00%
XI.4.b	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m)	bh	1.00	0.0221	1.00	0.0221	-	-	1.00	0.0221	100.00%
XI.4.c	Pintu Angkat Box (b=0.30 m, h=0.50 m)	bh	1.00	0.0034	1.00	0.0034	-	-	1.00	0.0034	100.00%
XI.4.d	Pintu Angkat Box (b=0.40 m, h=0.50 m)	bh	1.00	0.0036	1.00	0.0036	-	-	1.00	0.0036	100.00%
XI.4.e	Shelter/Pelindung Pintu	unit	2.00	0.0868	2.00	0.0868	-	-	2.00	0.0868	100.00%
XI.4.f	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	2.00	0.0148	2.00	0.0148	-	-	2.00	0.0148	100.00%
XI.4.g	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=0.70 m)	bh	1.00	0.0072	1.00	0.0072	-	-	1.00	0.0072	100.00%
XI.4.h	Pemasangan Pintu Air (b=0.50 m, h=0.50 m)	bh	2.00	0.0049	2.00	0.0049	-	-	2.00	0.0049	100.00%
XI.4.i	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3					-	-			
XI.4.j	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3					-	-			
XI.4.k	Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	15.40	0.0031	15.40	0.0031	-	-	15.40	0.0031	100.00%
XI.4.l	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3					-	-			
XI.4.m	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2					-	-			
XI.4.n	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton					-	-			
XI.4.o	Lapis Perikat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2					-	-			
XI.4.p	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton					-	-			
XII.	PEKERJAAN BANGUNAN SADAP B.GKn.57.2 (B.GKn.52)			0.3902		0.3902		-		0.3902	100.00%
XII.1	PEKERJAAN TANAH										
XII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	106.29	0.0029	106.29	0.0029	-	-	106.29	0.0029	100.00%
XII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	37.03	0.0035	37.03	0.0035	-	-	37.03	0.0035	100.00%
XII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-			
XII.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	69.25	0.0054	69.25	0.0054	-	-	69.25	0.0054	100.00%
XII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XII.2.a	Pasangan Batu Kali 1-4	m3									
XII.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XII.2.c	Plesteran ISP : 3PP tebal 15mm	m2									
XII.3	PEKERJAAN BETON										
XII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	24.33	0.0273	24.33	0.0273	-	-	24.33	0.0273	100.00%
XII.3.a.1	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi) (Negosiasi)	m3	12.12	0.0136	12.12	0.0136	-	-	12.12	0.0136	100.00%
XII.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	1.27	0.0012	1.27	0.0012	-	-	1.27	0.0012	100.00%
XII.3.b.1	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	1.88	0.0018	1.88	0.0018	-	-	1.88	0.0018	100.00%
XII.3.c	Penulangan D-12 mm	kg					-	-			
XII.3.d	Penulangan D-16 mm	kg	1,160.90	0.0166	1,160.90	0.0166	-	-	1,160.90	0.0166	100.00%
XII.3.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg					-	-			
XII.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	90.60	0.0095	90.60	0.0095	-	-	90.60	0.0095	100.00%
XII.3.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	51.17	0.0053	51.17	0.0053	-	-	51.17	0.0053	100.00%
XII.3.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	486.76	0.0070	486.76	0.0070	-	-	486.76	0.0070	100.00%
XII.3.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	769.26	0.0110	769.26	0.0110	-	-	769.26	0.0110	100.00%
XII.3.h	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	680.51	0.0097	680.51	0.0097	-	-	680.51	0.0097	100.00%
XII.3.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	17.25	0.0022	17.25	0.0022	-	-	17.25	0.0022	100.00%
XII.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XII.4.a	Pintu Sorong Baja (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	1.00	0.0545	1.00	0.0545	-	-	1.00	0.0545	100.00%
XII.4.b	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=1.00 m, h=0.70 m)	bh					-	-			
XII.4.c	Pintu Angkat Box (b=0.50 m, h=0.50 m)	bh					-	-			
XII.4.d	Pintu Angkat Box (b=0.40 m, h=0.50 m)	bh					-	-			
XII.4.e	Shelter/Pelindung Pintu	unit	2.00	0.0868	2.00	0.0868	-	-	2.00	0.0868	100.00%
XII.4.e.1	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	unit	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434	100.00%
XII.4.f	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=1.00 m)	bh	1.00	0.0074	1.00	0.0074	-	-	1.00	0.0074	100.00%
XII.4.g	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=0.70 m)	bh					-	-			
XII.4.h	Pemasangan Pintu Air (b=0.50 m, h=0.50 m)	bh					-	-			
XII.4.i	Pemasangan Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	bh	2.00	0.0144	2.00	0.0144	-	-	2.00	0.0144	100.00%
XII.4.j	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3	7.20	0.0023	7.20	0.0023	-	-	7.20	0.0023	100.00%
XII.4.k	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3	9.60	0.0026	9.60	0.0026	-	-	9.60	0.0026	100.00%
XII.4.l	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	14.38	0.0024	14.38	0.0024	-	-	14.38	0.0024	100.00%
XII.4.m	Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	11.00	0.0022	11.00	0.0022	-	-	11.00	0.0022	100.00%
XII.4.n	Pintu Sorong Tonjol / Crump De Gruyter (b=0.50 m, h=0.75 m) (Negosiasi)	bh	2.00	0.0442	2.00	0.0442	-	-	2.00	0.0442	100.00%
XI.4.o	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2					-	-			
XI.4.p	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton					-	-			
XI.4.q	Lapis Perikat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2	63.87	0.0014	63.87	0.0014	-	-	63.87	0.0014	100.00%
XI.4.r	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton	5.87	0.0105	5.87	0.0105	-	-	5.87	0.0105	100.00%
XI.4.s	Pekerjaan Marpa Jalan	m2	4.10	0.0010	4.10	0.0010	-	-	4.10	0.0010	100.00%

h w

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
										PROSENTA SI
XIII.	PEK. BANGUNAN TERJUN 19 BUAH B.GKn.59.a-B.GKn.59.i dan B.GKn.59.j-B.GKn.59.s (B.GKn.53.a-B.GKn.53.i)									
XIII.1	PEKERJAAN TANAH									
XIII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3								
XIII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3								
XIII.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3								
XIII.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XIII.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3								
XIII.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2								
XIII.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2								
XIII.A	PEK. BANGUNAN TERJUN 6 BUAH			0.0681		0.0681		-		0.0681 100.00%
XIII.A.1	PEKERJAAN TANAH									
XIII.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	34.94	0.0010	34.94	0.0010	-	-	34.94	0.0010 100.00%
XIII.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	16.56	0.0016	16.56	0.0016	-	-	16.56	0.0016 100.00%
XIII.A.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	18.38	0.0014	18.38	0.0014	-	-	18.38	0.0014 100.00%
XIII.A.2	PEKERJAAN BETON									
XIII.A.2.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	29.68	0.0333	29.68	0.0333	-	-	29.68	0.0333 100.00%
XIII.A.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	2.48	0.0023	2.48	0.0023	-	-	2.48	0.0023 100.00%
XIII.A.2.c	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	421.48	0.0060	421.48	0.0060	-	-	421.48	0.0060 100.00%
XIII.A.2.d	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	202.95	0.0029	202.95	0.0029	-	-	202.95	0.0029 100.00%
XIII.A.2.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	186.88	0.0195	186.88	0.0195	-	-	186.88	0.0195 100.00%
XIV.	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG JALAN 4 BUAH B.GKn.59.j dan B.GKn.59.t (B.GKn.53.j dan B.GKn.53.t)									
XIV.1	PEKERJAAN TANAH									
XIV.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3								
XIV.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3								
XIV.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3								
XIV.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XIV.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3								
XIV.2.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2								
XIV.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2								
XIV.3	PEKERJAAN BETON									
XIV.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3								
XIV.3.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3								
XIV.3.c	Penulangan D-12 mm	kg								
XIV.3.d	Penulangan D-16 mm	kg								
XIV.3.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2								
XIV.A	PEK. BANGUNAN GORONG - GORONG JALAN 8 BUAH B.GKn.59.j dan B.GKn.59.t (B.GKn.53.j dan B.GKn.53.t)			0.2211		0.2211		-		0.2211 100.00%
XIV.A.1	PEKERJAAN TANAH									
XIV.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	22.55	0.0006	22.55	0.0006	-	-	22.55	0.0006 100.00%
XIV.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	13.80	0.0013	13.80	0.0013	-	-	13.80	0.0013 100.00%
XIV.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	8.75	0.0015	8.75	0.0015	-	-	8.75	0.0015 100.00%
XIV.A.1.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	8.75	0.0007	8.75	0.0007	-	-	8.75	0.0007 100.00%
XIV.A.2	PEKERJAAN BETON GORONG-GORONG JALAN									
XIV.A.2.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	63.03	0.0707	63.03	0.0707	-	-	63.03	0.0707 100.00%
XIV.A.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	1.96	0.0018	1.96	0.0018	-	-	1.96	0.0018 100.00%
XIV.A.2.c	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	434.52	0.0454	434.52	0.0454	-	-	434.52	0.0454 100.00%
XIV.A.2.d	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	1,706.52	0.0244	1,706.52	0.0244	-	-	1,706.52	0.0244 100.00%
XIV.A.2.e	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	3,318.70	0.0475	3,318.70	0.0475	-	-	3,318.70	0.0475 100.00%
XIV.A.2.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	209.96	0.0272	209.96	0.0272	-	-	209.96	0.0272 100.00%
XV.	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN B.GKn.59a (B.GKn.53u)									
XV.1	PEKERJAAN TANAH									
XV.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3								
XV.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3								
XV.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3								
XV.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XV.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3								
XV.2.b	Bongkar Beton	m3								
XV.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3								
XV.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XV.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3								
XV.3.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2								
XV.3.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2								
XV.4	PEKERJAAN BETON									
XV.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3								
XV.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3								
XV.4.c	Penulangan D-12 mm	kg								
XV.4.d	Penulangan D-16 mm	kg								
XV.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2								
XV.A	PEKERJAAN BANGUNAN BOX CULVERT B.GKn.59a (B.GKn.53t)			0.2898		0.2898		-		0.2898 100.00%
XV.A.1	PEKERJAAN TANAH									
XV.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	41.22	0.0011	41.22	0.0011	-	-	41.22	0.0011 100.00%
XV.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	32.98	0.0031	32.98	0.0031	-	-	32.98	0.0031 100.00%
XV.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	52.57	0.0089	52.57	0.0089	-	-	52.57	0.0089 100.00%
XV.A.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XV.A.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	37.73	0.0029	37.73	0.0029	-	-	37.73	0.0029 100.00%
XV.A.2.b	Bongkar Beton	m3	5.49	0.0012	5.49	0.0012	-	-	5.49	0.0012 100.00%
XV.A.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	51.46	0.0040	51.46	0.0040	-	-	51.46	0.0040 100.00%
XV.A.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XV.A.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3					-	-		
XV.A.3.b	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2					-	-		
XV.A.4	PEKERJAAN BETON									
XV.A.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	43.61	0.0491	43.61	0.0491	-	-	43.61	0.0491 100.00%
XV.A.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100)	m3	3.21	0.0030	3.21	0.0030	-	-	3.21	0.0030 100.00%
XV.A.4.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,970.53	0.0425	2,970.53	0.0425	-	-	2,970.53	0.0425 100.00%
XV.A.4.d	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	151.29	0.0158	151.29	0.0158	-	-	151.29	0.0158 100.00%
XV.A.4.e	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	kg	2.05	0.0000	2.05	0.0000	-	-	2.05	0.0000 100.00%
XV.A.4.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	311.23	0.0045	311.23	0.0045	-	-	311.23	0.0045 100.00%
XV.A.4.g	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	11.53	0.0002	11.53	0.0002	-	-	11.53	0.0002 100.00%
XV.A.4.h	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	2,070.48	0.0296	2,070.48	0.0296	-	-	2,070.48	0.0296 100.00%
XV.A.4.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	20.23	0.0026	20.23	0.0026	-	-	20.23	0.0026 100.00%

h h

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91		
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTASI
XV.A.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XV.A.5.a	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	17.29	0.0029	17.29	0.0029	-	-	17.29	0.0029	100.00%
XV.A.5.b	Lapisan Perkerasan Kelas A 20 cm (Negosiasi)	m3	7.10	0.0022	7.10	0.0022	-	-	7.10	0.0022	100.00%
XV.A.5.c	Lapisan Perkerasan Kelas B 20 cm (Negosiasi)	m3	9.47	0.0026	9.47	0.0026	-	-	9.47	0.0026	100.00%
XV.A.5.d	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	12.40	0.0048	12.40	0.0048	-	-	12.40	0.0048	100.00%
XV.A.5.e	Lapis Resap Pengikat (Prime coat) (Negosiasi)	m2	239.66	0.0048	239.66	0.0048	-	-	239.66	0.0048	100.00%
XV.A.5.f	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm (Negosiasi)	Ton	33.07	0.0574	33.07	0.0574	-	-	33.07	0.0574	100.00%
XV.A.5.g	Lapis Perekat (Tack Coat) (Negosiasi)	m2	239.66	0.0053	239.66	0.0053	-	-	239.66	0.0053	100.00%
XV.A.5.h	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm (Negosiasi)	Ton	22.04	0.0395	22.04	0.0395	-	-	22.04	0.0395	100.00%
XV.A.5.i	Pekerjaan Marka Jalan (Negosiasi)	m2	6.03	0.0014	6.03	0.0014	-	-	6.03	0.0014	100.00%
XV.A.5.j	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	3.89	0.0002	3.89	0.0002	-	-	3.89	0.0002	100.00%
XVI	PEKERJAAN BANGUNAN GORONG - GORONG PENGGANTI SIPHON B.GKn.59.b (B.GKn.53.v)										
XVI.1	PEKERJAAN TANAH										
XVI.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3									
XVI.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XVI.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3									
XVI.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XVI.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3									
XVI.2.b	Bongkar Beton	m3									
XVI.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
XVI.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XVI.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4										
XVI.3.b	Siran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XVI.3.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XVI.4	PEKERJAAN BETON										
XVI.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3									
XVI.4.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3									
XVI.4.c	Penulangan D-12 mm	kg									
XVI.4.d	Penulangan D-16 mm	kg									
XVI.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2									
XVI.A	PEKERJAAN BANGUNAN TALANG PENGGANTI SIPHON B.GKn.59.b (B.GKn.53.v)			0.4840		0.4840		-		0.4840	100.00%
XVI.A.1	PEKERJAAN TANAH										
XVI.A.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	356.42	0.0099	356.42	0.0099	-	-	356.42	0.0099	100.00%
XVI.A.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3	285.14	0.0270	285.14	0.0270	-	-	285.14	0.0270	100.00%
XVI.A.1.c	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	71.18	0.0121	71.18	0.0121	-	-	71.18	0.0121	100.00%
XVI.A.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XVI.A.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	102.76	0.0080	102.76	0.0080	-	-	102.76	0.0080	100.00%
XVI.A.2.b	Bongkar Beton	m3	53.66	0.0121	53.66	0.0121	-	-	53.66	0.0121	100.00%
XVI.A.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km	m3	227.70	0.0178	227.70	0.0178	-	-	227.70	0.0178	100.00%
XVI.A.3	PEKERJAAN BETON										
XVI.1.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	152.04	0.1705	152.04	0.1705	-	-	152.04	0.1705	100.00%
XVI.1.4.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3	8.85	0.0083	8.85	0.0083	-	-	8.85	0.0083	100.00%
XVI.1.4.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	2,282.53	0.0327	2,282.53	0.0327	-	-	2,282.53	0.0327	100.00%
XVI.1.4.d	Penulangan Ø-13 mm (Negosiasi)	kg	5,450.14	0.0780	5,450.14	0.0780	-	-	5,450.14	0.0780	100.00%
XVI.1.4.e	Penulangan D-16 mm	kg	2,184.73	0.0313	2,184.73	0.0313	-	-	2,184.73	0.0313	100.00%
XVI.1.4.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	445.01	0.0465	445.01	0.0465	-	-	445.01	0.0465	100.00%
XVI.1.4.g	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	99.49	0.0129	99.49	0.0129	-	-	99.49	0.0129	100.00%
XVI.1.5.h	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	m2	11.66	0.0002	11.66	0.0002	-	-	11.66	0.0002	100.00%
XVI.1.5.i	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	m2	108.50	0.0016	108.50	0.0016	-	-	108.50	0.0016	100.00%
XVI.1.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XVI.1.5.a	Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	10.80	0.0022	10.80	0.0022	-	-	10.80	0.0022	100.00%
XVI.1.5.b	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	32.80	0.0127	32.80	0.0127	-	-	32.80	0.0127	100.00%
XVI.1.5.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	7.78	0.0003	7.78	0.0003	-	-	7.78	0.0003	100.00%
XVII	BANGUNAN BOX CULVERT / DEPAN BWS B.GKn.59.I (B.GKn.53.ss)			7.6584		7.6584		-		7.6584	100.00%
XVII.1	PEKERJAAN TANAH										
XVII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	2,677.56	0.0740	2,677.56	0.0740	-	-	2,677.56	0.0740	100.00%
XVII.1.a.1	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT (Negosiasi)	m3	4,148.49	0.1147	4,148.49	0.1147	-	-	4,148.49	0.1147	100.00%
XVII.1.b	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m	m3									
XVII.2	PEKERJAAN BONGKARAN										
XVII.2.a	Bongkar Beton	m3	95.10	0.0214	95.10	0.0214	-	-	95.10	0.0214	100.00%
XVII.2.a.1	Bongkar Beton (Negosiasi)	m2	1.60	0.0010	1.60	0.0010	-	-	1.60	0.0010	100.00%
XVII.2.a.2	Bongkar Beton (Negosiasi)	m3	3.38	0.0001	3.38	0.0001	-	-	3.38	0.0001	100.00%
XVII.2.b	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3									
XVII.2.c	Bongkar Pasangan Batu	m3	56.70	0.0044	56.70	0.0044	-	-	56.70	0.0044	100.00%
XVII.2.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	2,802.86	0.2197	2,802.86	0.2197	-	-	2,802.86	0.2197	100.00%
XVII.2.d.1	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	4,182.97	0.3097	4,182.97	0.3097	-	-	4,182.97	0.3097	100.00%
XVII.2.e	Pembongkaran Paving Blok Trotoar	m2	263.63	0.0100	263.63	0.0100	-	-	263.63	0.0100	100.00%
XVII.2.f	Pembongkaran kansteeen	m	156.10	0.0061	156.10	0.0061	-	-	156.10	0.0061	100.00%
XVII.2.g	Pemasangan Kembali Papan Reklame	Bh	3.00	0.0088	3.00	0.0088	-	-	3.00	0.0088	100.00%
XVII.2.h	Pembongkaran Papan Reklame	Bh	3.00	0.0033	3.00	0.0033	-	-	3.00	0.0033	100.00%
XVII.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XVII.3.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3									
XVII.3.b	Siran dengan mortar tipe M, f' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP)	m2									
XVII.3.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2									
XVII.4	PEKERJAAN BETON										
XVII.4.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	485.87	0.5148	485.87	0.5148	-	-	485.87	0.5148	100.00%
XVII.4.b	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100)	m3	69.30	0.0653	69.30	0.0653	-	-	69.30	0.0653	100.00%
XVII.4.b.1	Pekerjaan Beton mutu f' 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	8.37	0.0079	8.37	0.0079	-	-	8.37	0.0079	100.00%
XVII.4.c	Penulangan D-13 mm	kg	21,790.13	0.3120	21,790.13	0.3120	-	-	21,790.13	0.3120	100.00%
XVII.4.d	Penulangan D-16 mm	kg	33,035.90	0.4730	33,035.90	0.4730	-	-	33,035.90	0.4730	100.00%
XVII.4.d.1	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	1,933.15	0.0277	1,933.15	0.0277	-	-	1,933.15	0.0277	100.00%
XVII.4.e	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	2,006.52	0.2096	2,006.52	0.2096	-	-	2,006.52	0.2096	100.00%
XVII.4.e.1	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	236.32	0.0247	236.32	0.0247	-	-	236.32	0.0247	100.00%
XVII.4.f	Pengadaan Beton K-350 Precast Box Culvert (2.00m x 2.50m x 1.20 m) (Negosiasi)	Bh	101.00	0.7400	101.00	0.7400	-	-	101.00	0.7400	100.00%
XVII.5.g	Pemasangan Beton K-350 Precast Box Culvert (2.00m x 2.50m x 1.20 m) (Negosiasi)	Bh	101.00	0.5610	101.00	0.5610	-	-	101.00	0.5610	100.00%
XVII.4.h	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Plesteran (L=2 cm, l=30 cm) (Negosiasi)	m2	57.85	0.0224	57.85	0.0224	-	-	57.85	0.0224	100.00%
XVII.4.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	409.86	0.0531	409.86	0.0531	-	-	409.86	0.0531	100.00%
XVII.4.j	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	3,095.00	0.0443	3,095.00	0.0443	-	-	3,095.00	0.0443	100.00%
XVII.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XVII.5.a	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm)	m	143.00	0.0286	143.00	0.0286	-	-	143.00	0.0286	100.00%
XVII.5.a.1	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	75.40	0.0151	75.40	0.0151	-	-	75.40	0.0151	100.00%
XVII.5.b	Lapisan Aspal 10 cm (2 lapis)	m2									
XVII.5.c	Lapisan Perkerasan Kelas A 40 cm	m3	160.60	0.0505	160.60	0.0505	-	-	160.60	0.0505	100.00%

h w

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%) PROSENTA SI
XVII.5.c.1	Lapisan Perkerasan Kelas A 40 cm (Negosiasi)	m3	265.97	0.0837	265.97	0.0837	-	-	265.97	0.0837 100.00%
XVII.5.d	Urugan Pilihan 60 cm	m3								
XVII.5.e	Pekerjaan Marka Jalan (Negosiasi)	m2	66.91	0.0157	66.91	0.0157	-	-	66.91	0.0157 100.00%
XVII.5.f	Pekerjaan Sondir (Negosiasi)	titik	1.00	0.0078	1.00	0.0078	-	-	1.00	0.0078 100.00%
XVII.5.g	Pekerjaan Timbunan Tasirtu (negosiasi)	m3	3,849.77	1.0057	3,849.77	1.0057	-	-	3,849.77	1.0057 100.00%
XVII.5.h	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm	Ton	147.16	0.2553	147.16	0.2553	-	-	147.16	0.2553 100.00%
XVII.5.i	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm	Ton	105.39	0.1888	105.39	0.1888	-	-	105.39	0.1888 100.00%
XVII.5.j	Lapis Resap Pengikat (Prime coat)	m2	1,066.44	0.0213	1,066.44	0.0213	-	-	1,066.44	0.0213 100.00%
XVII.5.k	Lapis Perelat (Tack Coat)	m2	1,161.86	0.0256	1,161.86	0.0256	-	-	1,161.86	0.0256 100.00%
XVII.5.l	Pengadaan Paving Blok	m2	173.31	0.0266	173.31	0.0266	-	-	173.31	0.0266 100.00%
XVII.5.m	Pemasangan Paving Blok	m2	263.63	0.0427	263.63	0.0427	-	-	263.63	0.0427 100.00%
XVII.5.n	Pengadaan kansteen	Bh	196.00	0.0195	196.00	0.0195	-	-	196.00	0.0195 100.00%
XVII.5.o	Pemasangan kansteen	m	234.10	0.0026	234.10	0.0026	-	-	234.10	0.0026 100.00%
XVII.A	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR BWS			1.0463	1.0463		-		1.0463	100.00%
XVII.A.1	PEKERJAAN TANAH									
XVII.A.1.a	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	10.50	0.0096	10.50	0.0096	-	-	10.50	0.0096 100.00%
XVII.A.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XVII.A.2.a	Bongkar Beton Manual	m3	122.28	0.0202	122.28	0.0202	-	-	122.28	0.0202 100.00%
XVII.A.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XVII.A.3.a	Dinding Bata Merah tebal 1/2 bata campuran 1SP : 4 PP	m2	246.38	0.0340	246.38	0.0340	-	-	246.38	0.0340 100.00%
XVII.A.3.b	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	937.30	0.0702	937.30	0.0702	-	-	937.30	0.0702 100.00%
XVII.A.3.c	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	937.30	0.0430	937.30	0.0430	-	-	937.30	0.0430 100.00%
XVII.A.3.d	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	533.57	0.0218	533.57	0.0218	-	-	533.57	0.0218 100.00%
XVII.A.4	PEKERJAAN BETON									
XVII.A.4.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	7.61	0.0085	7.61	0.0085	-	-	7.61	0.0085 100.00%
XVII.A.4.b	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	Kg	136.45	0.0020	136.45	0.0020	-	-	136.45	0.0020 100.00%
XVII.A.4.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	Kg	1,020.55	0.0146	1,020.55	0.0146	-	-	1,020.55	0.0146 100.00%
XVII.A.4.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	Kg	578.78	0.0083	578.78	0.0083	-	-	578.78	0.0083 100.00%
XVII.A.4.e	Pekerjaan Belisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	148.25	0.0155	148.25	0.0155	-	-	148.25	0.0155 100.00%
XVII.A.5	PEKERJAAN LAIR - LAIR									
XVII.A.5.a	Pekerjaan Arsitektur Pagar Kantor Bws	Ls	1.00	0.6284	1.00	0.6284	-	-	1.00	0.6284 100.00%
XVII.A.5.b	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Pagar Kantor Bws	Ls	1.00	0.1704	1.00	0.1704	-	-	1.00	0.1704 100.00%
XVII.B	PENGEMBALIAN BANGUNAN PAGAR WARGA			0.4284	0.4284		-		0.4284	100.00%
XVII.B.1	PEKERJAAN TANAH									
XVII.B.1.a	Penggalan 1 m3 tanah biasa sedalam 1 s.d 2 m	m3	128.36	0.0123	128.36	0.0123	-	-	128.36	0.0123 100.00%
XVII.B.1.b	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah manual	m3	36.80	0.0026	36.80	0.0026	-	-	36.80	0.0026 100.00%
XVII.B.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XVII.B.2.a	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	19.96	0.0031	19.96	0.0031	-	-	19.96	0.0031 100.00%
XVII.B.2.b	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	77.69	0.0711	77.69	0.0711	-	-	77.69	0.0711 100.00%
XVII.B.2.c	Pekerjaan Pasangan Batako	m2	251.48	0.0420	251.48	0.0420	-	-	251.48	0.0420 100.00%
XVII.B.2.d	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	1,070.24	0.0801	1,070.24	0.0801	-	-	1,070.24	0.0801 100.00%
XVII.B.2.e	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	1,070.24	0.0491	1,070.24	0.0491	-	-	1,070.24	0.0491 100.00%
XVII.B.2.f	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	1,070.24	0.0436	1,070.24	0.0436	-	-	1,070.24	0.0436 100.00%
XVII.B.3	PEKERJAAN BETON									
XVII.B.3.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	33.52	0.0376	33.52	0.0376	-	-	33.52	0.0376 100.00%
XVII.A.3.b	Penulangan Ø - 10 mm (Negosiasi)	Kg	3,521.71	0.0504	3,521.71	0.0504	-	-	3,521.71	0.0504 100.00%
XVII.A.3.c	Pekerjaan Belisting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	Kg	348.55	0.0364	348.55	0.0364	-	-	348.55	0.0364 100.00%
XVIII	SALURAN PEMBUANG DARI BGK.n.59.e - BGK.n.59 (BGK.n.53.z - BGK.n.53)			51.8051	51.8051		-		51.8051	100.00%
XVIII.1	PEKERJAAN TANAH									
XVIII.1.a	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m s/d 4 m dengan alat berat (Excavator PC-75) dan muat ke DT	m3	51,935.49	1.4360	51,935.49	1.4360	-	-	51,935.49	1.4360 100.00%
XVIII.1.b	Timbunan Tanah didatangkan dipadatkan jarak angkut >10 km	m3	30,722.69	5.2193	30,722.69	5.2193	-	-	30,722.69	5.2193 100.00%
XVIII.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XVIII.2.a	Bongkar Pasangan Batu	m3	6,816.31	0.5307	6,816.31	0.5307	-	-	6,816.31	0.5307 100.00%
XVIII.2.b	Bongkar Beton	m3	301.05	0.0678	301.05	0.0678	-	-	301.05	0.0678 100.00%
XVIII.2.b.1	Bongkar Beton (Negosiasi)	m3					-	-		
XVIII.2.c	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-		
XVIII.2.d	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	3,386.50	0.2654	3,386.50	0.2654	-	-	3,386.50	0.2654 100.00%
XVIII.2.d.1	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	33,666.34	4.1214	33,666.34	4.1214	-	-	33,666.34	4.1214 100.00%
XVIII.3	PEKERJAAN BETON									
XVIII.3.a	Pekerjaan Beton K-225	m3	8,277.34	9.2809	8,277.34	9.2809	-	-	8,277.34	9.2809 100.00%
XVIII.3.b	Penulangan D-16 mm	kg	384,282.47	5.5023	384,282.47	5.5023	-	-	384,282.47	5.5023 100.00%
XVIII.3.c	Penulangan D-13 mm	kg	278,831.86	3.9924	278,831.86	3.9924	-	-	278,831.86	3.9924 100.00%
XVIII.3.d	Pekerjaan Belisting Biasa (tanpa perancah)	m2	35,049.19	3.6608	35,049.19	3.6608	-	-	35,049.19	3.6608 100.00%
XVIII.3.e	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	1,066.83	1.0060	1,066.83	1.0060	-	-	1,066.83	1.0060 100.00%
XVIII.3.f	Pengadaan Pre cast Udith L , B= 3 Meter (negosiasi)	Bh	712.00	4.5565	712.00	4.5565	-	-	712.00	4.5565 100.00%
XVIII.3.g	Pemasangan Pre cast Udith L , B= 3 Meter (negosiasi)	Bh	712.00	0.3133	712.00	0.3133	-	-	712.00	0.3133 100.00%
XVIII.3.h	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	196.18	0.0300	196.18	0.0300	-	-	196.18	0.0300 100.00%
XVIII.3.i	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	384.66	0.0055	384.66	0.0055	-	-	384.66	0.0055 100.00%
XVIII.3.j	Pekerjaan Perancah	m2	316.50	0.0410	316.50	0.0410	-	-	316.50	0.0410 100.00%
XVIII.3.k	Wire Mesh M8	m2	699.06	0.0577	699.06	0.0577	-	-	699.06	0.0577 100.00%
XVIII.3.l	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	m2	20.24	0.0003	20.24	0.0003	-	-	20.24	0.0003 100.00%
XVIII.4	PEKERJAAN LAIR - LAIR									
XVIII.4.a	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm)	m	2,777.50	0.5555	2,777.50	0.5555	-	-	2,777.50	0.5555 100.00%
XVIII.4.a.1	Pemasangan Water Stop (Type WSP 20 Cm) (Negosiasi)	m	2,165.59	0.4331	2,165.59	0.4331	-	-	2,165.59	0.4331 100.00%
XVIII.4.b	Urugan Pilihan 60 cm (Negosiasi)	m3	64.27	0.0107	64.27	0.0107	-	-	64.27	0.0107 100.00%
XVIII.4.c	Pekerjaan Perkerasan Jalan (Sub base coarse) (Negosiasi)	m2	7,846.49	0.5388	7,846.49	0.5388	-	-	7,846.49	0.5388 100.00%
XVIII.4.d	Lapisan Perkerasan Kelas A 40 cm	m3	118.85	0.0374	118.85	0.0374	-	-	118.85	0.0374 100.00%
XVIII.4.e	Lapis Resap Pengikat (Prime coat)	m2	297.13	0.0059	297.13	0.0059	-	-	297.13	0.0059 100.00%
XVIII.4.f	Lapis Perelat (Tack Coat)	m2	320.23	0.0071	320.23	0.0071	-	-	320.23	0.0071 100.00%
XVIII.4.g	Lapisan Aspal AC - BC Tebal 6 cm	Ton	41.00	0.0711	41.00	0.0711	-	-	41.00	0.0711 100.00%
XVIII.4.h	Lapisan Aspal AC - WC Tebal 4 cm	Ton	29.46	0.0528	29.46	0.0528	-	-	29.46	0.0528 100.00%
XVIII.4.i	Guard Rail Kendaraan Tipe B	m	3,206.00	6.2176	3,206.00	6.2176	-	-	3,206.00	6.2176 100.00%
XVIII.4.j	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Double Parabole Solar Cell	Bh	93.00	2.5413	93.00	2.5413	-	-	93.00	2.5413 100.00%
XVIII.4.k	Bongkar Pasang Guard Rail Kendaraan Tipe B Existing	m	1,536.00	0.6688	1,536.00	0.6688	-	-	1,536.00	0.6688 100.00%
XVIII.4.l	Pekerjaan Marka Jalan (Negosiasi)	m2	17.48	0.0041	17.48	0.0041	-	-	17.48	0.0041 100.00%
XVIII.4.m	Bronjong Batu Kali (Negosiasi)	m3	32.00	0.0268	32.00	0.0268	-	-	32.00	0.0268 100.00%
XVIII.5	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XVIII.5.a	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	3,439.43	0.2576	3,439.43	0.2576	-	-	3,439.43	0.2576 100.00%
XVIII.5.b	Pekerjaan Pas batu	m3	111.77	0.1023	111.77	0.1023	-	-	111.77	0.1023 100.00%
XVIII.5.c	Pekerjaan Acian	m2	3,389.04	0.1553	3,389.04	0.1553	-	-	3,389.04	0.1553 100.00%
XVIII.5.d	Pengisi Dilatasi dengan Mortar Plesteran (L=2 cm, t=30 cm) (Negosiasi)	m2	55.72	0.0215	55.72	0.0215	-	-	55.72	0.0215 100.00%
XVIII.5.e	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MP,a (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	13.00	0.0008	13.00	0.0008	-	-	13.00	0.0008 100.00%
XVIII.5.f	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	18.66	0.0072	18.66	0.0072	-	-	18.66	0.0072 100.00%
XVIII.5.g	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	48.55	0.0020	48.55	0.0020	-	-	48.55	0.0020 100.00%
XVIII.A	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG			1.0972	1.0972		-		1.0972	100.00%
XVIII.A.1	PEKERJAAN BETON									
XVIII.A.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	328.59	0.3684	328.59	0.3684	-	-	328.59	0.3684 100.00%
XVIII.A.1.b	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	4,812.92	0.0689	4,812.92	0.0689	-	-	4,812.92	0.0689 100.00%
XVIII.A.1.c	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	15,921.35	0.2280	15,921.35	0.2280	-	-	15,921.35	0.2280 100.00%
XVIII.A.1.d	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	9,315.59	0.1334	9,315.59	0.1334	-	-	9,315.59	0.1334 100.00%

Handwritten signature/initials


NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN					
			VOLUME	BOBOT (%)	MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
									PROSENTA SI	
XVIII.A.1.e	Pekerjaan Belasting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	1,519.31	0.1587	1,519.31	0.1587	-	-	1,519.31	0.1587
XVIII.A.1.f	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	1,018.68	0.1319	1,018.68	0.1319	-	-	1,018.68	0.1319
XVIII.A.1.g	Wire Mesh (Negosiasi)	m2	96.00	0.0080	96.00	0.0080	-	-	96.00	0.0080
XVIII.B	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN UMUM			1.6167		1.6167		-		1.6167
XVIII.B.1	PEKERJAAN BETON									
XVIII.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	507.91	0.5695	507.91	0.5695	-	-	507.91	0.5695
XVIII.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	38.28	0.0361	38.28	0.0361	-	-	38.28	0.0361
XVIII.B.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	17,051.62	0.2442	17,051.62	0.2442	-	-	17,051.62	0.2442
XVIII.B.1.d	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	10,882.55	0.1558	10,882.55	0.1558	-	-	10,882.55	0.1558
XVIII.B.1.e	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	9,557.02	0.1368	9,557.02	0.1368	-	-	9,557.02	0.1368
XVIII.B.1.f	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	1,726.45	0.0247	1,726.45	0.0247	-	-	1,726.45	0.0247
XVIII.B.1.g	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	kg	71.39	0.0010	71.39	0.0010	-	-	71.39	0.0010
XVIII.B.1.h	Wire Mesh (Negosiasi)	m2	140.00	0.0116	140.00	0.0116	-	-	140.00	0.0116
XVIII.B.1.i	Pekerjaan Belasting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	1,882.16	0.1966	1,882.16	0.1966	-	-	1,882.16	0.1966
XVIII.B.1.j	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	485.48	0.0628	485.48	0.0628	-	-	485.48	0.0628
XVIII.B.2	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
XVIII.B.2.a	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	320.00	0.1240	320.00	0.1240	-	-	320.00	0.1240
XVIII.B.2.b	Pemasangan Water Stop (Type WSF 20 Cm) (Negosiasi)	m	257.20	0.0514	257.20	0.0514	-	-	257.20	0.0514
XVIII.B.2.c	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	50.62	0.0021	50.62	0.0021	-	-	50.62	0.0021
XIX.	PEKERJAAN SALURAN PEMBANGUNAN NGIA B.GKn.59.a - B.GKn.59.e (B.GKn.53.u - B.GKn.53.z)			2.1100		2.1100		-		2.1100
XIX.1	PEKERJAAN TANAH									
XIX.1.a	Galian sedimen	m3	2,403.00	0.1143	2,403.00	0.1143	-	-	2,403.00	0.1143
XIX.1.a.1	Galian sedimen (Negosiasi)	m3	260.64	0.0053	260.64	0.0053	-	-	260.64	0.0053
XIX.1.b	Buangan galian / bongkaran sejauh >10 km	m3					-	-		
XIX.1.c	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3					-	-		
XIX.1.c.1	Buangan galian / bongkaran sejauh <10 km (Negosiasi)	m3	7,838.65	0.5804	7,838.65	0.5804	-	-	7,838.65	0.5804
XIX.1.d	Galian Tanah Basah (Negosiasi)	m3	5,175.01	0.2058	5,175.01	0.2058	-	-	5,175.01	0.2058
XIX.2	PEKERJAAN BETON									
XIX.2.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	233.50	0.2618	233.50	0.2618	-	-	233.50	0.2618
XIX.2.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	116.74	0.1101	116.74	0.1101	-	-	116.74	0.1101
XIX.2.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	15,125.33	0.2166	15,125.33	0.2166	-	-	15,125.33	0.2166
XIX.2.d	Pekerjaan Belasting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	19.49	0.0020	19.49	0.0020	-	-	19.49	0.0020
XIX.3	PEKERJAAN BONGKARAN									
XIX.3.a	Bongkar Pasangan Batu (Negosiasi)	m3	493.53	0.0384	493.53	0.0384	-	-	493.53	0.0384
XIX.4	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XIX.4.a	Pasangan Batu Kali 1:4	m3	522.67	0.4785	522.67	0.4785	-	-	522.67	0.4785
XIX.4.b	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	944.02	0.0603	944.02	0.0603	-	-	944.02	0.0603
XIX.4.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	281.11	0.0224	281.11	0.0224	-	-	281.11	0.0224
XIX.4.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	188.27	0.0141	188.27	0.0141	-	-	188.27	0.0141
XIX.A	PEKERJAAN BANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG P.131 (Depan Masjid)			0.0359		0.0359		-		0.0359
XIX.A.1	PEKERJAAN BETON									
XIX.A.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	12.72	0.0143	12.72	0.0143	-	-	12.72	0.0143
XIX.A.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.41	0.0004	0.41	0.0004	-	-	0.41	0.0004
XIX.A.1.c	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	130.20	0.0019	130.20	0.0019	-	-	130.20	0.0019
XIX.A.1.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	519.94	0.0074	519.94	0.0074	-	-	519.94	0.0074
XIX.A.1.e	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	110.11	0.0016	110.11	0.0016	-	-	110.11	0.0016
XIX.A.1.f	Pekerjaan Belasting biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	60.78	0.0063	60.78	0.0063	-	-	60.78	0.0063
XIX.A.1.f.1	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	30.80	0.0040	30.80	0.0040	-	-	30.80	0.0040
XIX.B	PEKERJAAN BANGUNAN SPILL WAY			0.3061		0.3061		-		0.3061
XIX.B.1	PEKERJAAN BETON									
XIX.B.1.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	53.05	0.0595	53.05	0.0595	-	-	53.05	0.0595
XIX.B.1.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	6.74	0.0064	6.74	0.0064	-	-	6.74	0.0064
XIX.B.1.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	107.90	0.0015	107.90	0.0015	-	-	107.90	0.0015
XIX.B.1.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	kg	794.45	0.0114	794.45	0.0114	-	-	794.45	0.0114
XIX.B.1.e	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	kg	1,777.83	0.0255	1,777.83	0.0255	-	-	1,777.83	0.0255
XIX.B.1.f	Penulangan D-16 mm (Negosiasi)	kg	2,962.42	0.0424	2,962.42	0.0424	-	-	2,962.42	0.0424
XIX.B.1.g	Pekerjaan Belasting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	222.94	0.0233	222.94	0.0233	-	-	222.94	0.0233
XIX.B.1.h	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2					-	-		
XIX.B.1.i	Pekerjaan Perancah (Negosiasi)	m2	20.23	0.0026	20.23	0.0026	-	-	20.23	0.0026
XIX.B.1.j	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	unit	4.77	0.0001	4.77	0.0001	-	-	4.77	0.0001
XIX.B.2	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
XIX.B.2.a	Pintu Sorong Baja (b=1.00 m, h=1.35 m) 2 stang (Negosiasi)	bh	1.00	0.0745	1.00	0.0745	-	-	1.00	0.0745
XIX.B.2.b	Pemasangan Pintu Air (b=1.00 m, h=1.35 m) (Negosiasi)	bh	1.00	0.0078	1.00	0.0078	-	-	1.00	0.0078
XIX.B.2.c	Shelter/Pelindung Pintu (Negosiasi)	unit	1.00	0.0434	1.00	0.0434	-	-	1.00	0.0434
XIX.B.2.d	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	19.80	0.0077	19.80	0.0077	-	-	19.80	0.0077
XIX.B.2.e	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	4.54	0.0002	4.54	0.0002	-	-	4.54	0.0002
XIX.C	MONUMEN LOKUPAKSI			0.4104		0.4104		-		0.4104
XIX.C.1	PEKERJAAN TANAH									
XIX.C.1.a	Timbunan Tanah Material Sekitar, Kedalaman 2 m s/d <4 m (Negosiasi)	m3	418.16	0.0396	418.16	0.0396	-	-	418.16	0.0396
XIX.C.2	PEKERJAAN PASANGAN BATU									
XIX.C.2.a	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	159.56	0.1461	159.56	0.1461	-	-	159.56	0.1461
XIX.C.2.b	Pekerjaan Pasangan Batoko	m2	8.97	0.0015	8.97	0.0015	-	-	8.97	0.0015
XIX.C.2.c	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	6.62	0.0005	6.62	0.0005	-	-	6.62	0.0005
XIX.C.2.c.1	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	136.96	0.0103	136.96	0.0103	-	-	136.96	0.0103
XIX.C.2.d	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	143.58	0.0066	143.58	0.0066	-	-	143.58	0.0066
XIX.C.2.e	Siaran dengan mortar tipe M, f'c = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PP) (Negosiasi)	m2	242.87	0.0155	242.87	0.0155	-	-	242.87	0.0155
XIX.C.3	PEKERJAAN BETON									
XIX.C.3.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	3.03	0.0034	3.03	0.0034	-	-	3.03	0.0034
XIX.C.3.b	Penulangan Ø-8 mm (Negosiasi)	kg	19.45	0.0003	19.45	0.0003	-	-	19.45	0.0003
XIX.C.3.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	kg	182.48	0.0026	182.48	0.0026	-	-	182.48	0.0026
XIX.C.3.d	Penulangan D-14 mm (Negosiasi)	kg	151.18	0.0022	151.18	0.0022	-	-	151.18	0.0022
XIX.C.3.e	Pekerjaan Belasting Biasa (tanpa perancah) (Negosiasi)	m2	25.46	0.0027	25.46	0.0027	-	-	25.46	0.0027
XIX.C.4	PEKERJAAN LAIN - LAIN									
XIX.C.4.a	Pekerjaan Arsitektur Monumen (Negosiasi)	ls	1.00	0.0978	1.00	0.0978	-	-	1.00	0.0978
XIX.C.4.b	Pemasangan Dinding Batu Alam Andest Hitam (Negosiasi)	m2	28.80	0.0141	28.80	0.0141	-	-	28.80	0.0141
XIX.C.4.c	Pekerjaan Sandaran Railing (Negosiasi)	m	79.97	0.0310	79.97	0.0310	-	-	79.97	0.0310
XIX.C.4.d	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	47.93	0.0020	47.93	0.0020	-	-	47.93	0.0020
XIX.C.4.e	Pengadaan Paving Blok (Negosiasi)	m2	91.66	0.0141	91.66	0.0141	-	-	91.66	0.0141
XIX.C.4.f	Pemasangan Paving Blok (Negosiasi)	m2	91.66	0.0148	91.66	0.0148	-	-	91.66	0.0148
XIX.C.4.g	Pengadaan kansteen (Negosiasi)	sh	40.00	0.0040	40.00	0.0040	-	-	40.00	0.0040
XIX.C.4.h	Pemasangan kansteen (Negosiasi)	m	20.00	0.0002	20.00	0.0002	-	-	20.00	0.0002
XIX.C.4.j	Ungran Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	8.49	0.0013	8.49	0.0013	-	-	8.49	0.0013
XIX.D	POS JAGA			0.3188		0.3188		-		0.3188
XIX.D.1	PEKERJAAN TANAH									
XIX.D.1.a	Penggalan 1 m3 tanah biasa sedalam 1 s.d 2 m (Negosiasi)	m3	3.62	0.0003	3.62	0.0003	-	-	3.62	0.0003
XIX.D.1.b	Pengurutan kembali 1 m3 galian tanah manual (Negosiasi)	m3	2.25	0.0002	2.25	0.0002	-	-	2.25	0.0002
XIX.D.2	PEKERJAAN BONGKARAN									
XIX.D.2.a	Pembongkaran Paving Blok (Negosiasi)	m2	8.67	0.0003	8.67	0.0003	-	-	8.67	0.0003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	ADDENDUM 7 (MUTUAL CHECK - 100%)		LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						
					MINGGU LALU		MINGGU KE-91		S/D MINGGU KE-91		
			VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	PROSENTA SI
XIX.D.3	PEKERJAAN PASANGAN BATU										
XIX.D.3.a	Urugan Pasir 20 cm (Lantai Saluran) (Negosiasi)	m3	0.57	0.0001	0.57	0.0001	-	-	0.57	0.0001	100.00%
XIX.D.3.c	Pasangan Batu Kali 1:4 (Negosiasi)	m3	1.68	0.0015	1.68	0.0015	-	-	1.68	0.0015	100.00%
XIX.D.3.d	Pekerjaan Pasangan Batako (Negosiasi)	m2	20.20	0.0034	20.20	0.0034	-	-	20.20	0.0034	100.00%
XIX.D.3.e	Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm (Negosiasi)	m2	66.11	0.0053	66.11	0.0053	-	-	66.11	0.0053	100.00%
XIX.D.3.f	Pekerjaan Acian (Negosiasi)	m2	66.11	0.0030	66.11	0.0030	-	-	66.11	0.0030	100.00%
XIX.D.3.g	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamur, 1 lapis dasar, 2 lapis cat	m2	66.11	0.0027	66.11	0.0027	-	-	66.11	0.0027	100.00%
XIX.D.4	PEKERJAAN BETON										
XIX.D.4.a	Pekerjaan Beton K-225 (Negosiasi)	m3	2.32	0.0026	2.32	0.0026	-	-	2.32	0.0026	100.00%
XIX.D.4.b	Pekerjaan Beton mutu f'c 7,4 MPa (K100) (Negosiasi)	m3	0.23	0.0002	0.23	0.0002	-	-	0.23	0.0002	100.00%
XIX.D.4.c	Penulangan Ø-10 mm (Negosiasi)	Kg	182.42	0.0026	182.42	0.0026	-	-	182.42	0.0026	100.00%
XIX.D.4.d	Penulangan Ø-12 mm (Negosiasi)	Kg	164.48	0.0024	164.48	0.0024	-	-	164.48	0.0024	100.00%
XIX.D.4.e	Penulangan D-13 mm (Negosiasi)	Kg	181.01	0.0026	181.01	0.0026	-	-	181.01	0.0026	100.00%
XIX.D.4.f	Pekerjaan Bekisting biasa (tanpa perancah)	m2	27.44	0.0029	27.44	0.0029	-	-	27.44	0.0029	100.00%
XIX.D.4.g	Pekerjaan Perancah	m2	10.67	0.0014	10.67	0.0014	-	-	10.67	0.0014	100.00%
XIX.D.5	PEKERJAAN LAIN - LAIN										
XIX.D.5.a	Pengadaan Paving Blok	m2	3.45	0.0005	3.45	0.0005	-	-	3.45	0.0005	100.00%
XIX.D.5.b	Pemasangan Paving Blok	m2	3.45	0.0006	3.45	0.0006	-	-	3.45	0.0006	100.00%
XIX.D.5.c	Pengadaan kansteen	bt	50.00	0.0050	50.00	0.0050	-	-	50.00	0.0050	100.00%
XIX.D.5.d	Pemasangan kansteen	m1	25.00	0.0003	25.00	0.0003	-	-	25.00	0.0003	100.00%
XIX.D.5.e	Pemasangan 1m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40cm x 40cm (Negosiasi)	m2	3.69	0.0006	3.69	0.0006	-	-	3.69	0.0006	100.00%
XIX.D.5.f	Pemasangan 1 m2 Kusen Aluminium (Negosiasi)	m1	25.08	0.0070	25.08	0.0070	-	-	25.08	0.0070	100.00%
XIX.D.5.g	Pemasangan 1 m2 Jendela kaca Rangka Aluminium (Negosiasi)	m2	15.08	0.0237	15.08	0.0237	-	-	15.08	0.0237	100.00%
XIX.D.5.h	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium (Negosiasi)	m2	10.00	0.0157	10.00	0.0157	-	-	10.00	0.0157	100.00%
XIX.D.5.i	Pengadaan dan Pemasangan Portal Barrier Gate (Negosiasi)	Unit	1.00	0.1892	1.00	0.1892	-	-	1.00	0.1892	100.00%
XIX.D.5.j	Pengadaan dan Penanaman Pohon halaman BWS (Negosiasi)	Ls	1.00	0.0365	1.00	0.0365	-	-	1.00	0.0365	100.00%
XIX.D.5.k	Pembuatan Pagar Besi Hollow Type 2 (Negosiasi)	m2	4.60	0.0045	4.60	0.0045	-	-	4.60	0.0045	100.00%
XIX.D.5.l	Pengecatan Permukaan Baja Secara Manual 3 Lapis (Negosiasi)	m2	19.24	0.0038	19.24	0.0038	-	-	19.24	0.0038	100.00%
JUMLAH BOBOT REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN				100.0000		99.9982		0.0018		100.0000	
BOBOT RENCANA KONTRAK KEMAJUAN PEKERJAAN						99.9960		0.0040		100.0000	
DEVIASI						0.0022		(0.0022)		-	

Disetujui Oleh :
DIREKSI PEKERJAAN



Di Periksa/setujui oleh :
Konsultan Supervisi
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

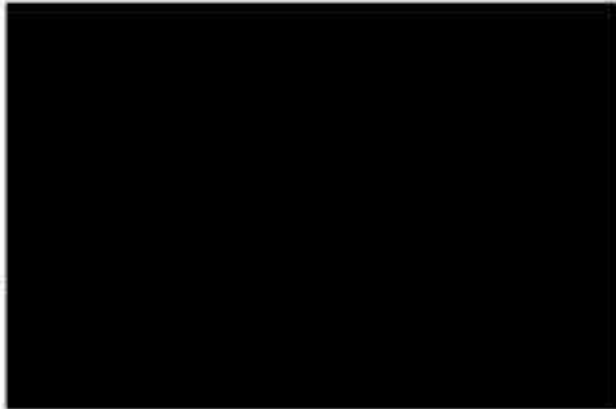

Palu, 30 Juni 2025
Disetujui oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NIJIDYA KARYA




 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU		 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 Membangun citra Desa Mandiri
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. JENIS PEKERJAAN : Pagar BWS LOKASI : Kantos Balai Wilayah Sungai Palu		Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS		KETERANGAN
			Pembongkaran
2			Pekerjaan Struktur
			Pekerjaan Finishing
3			Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

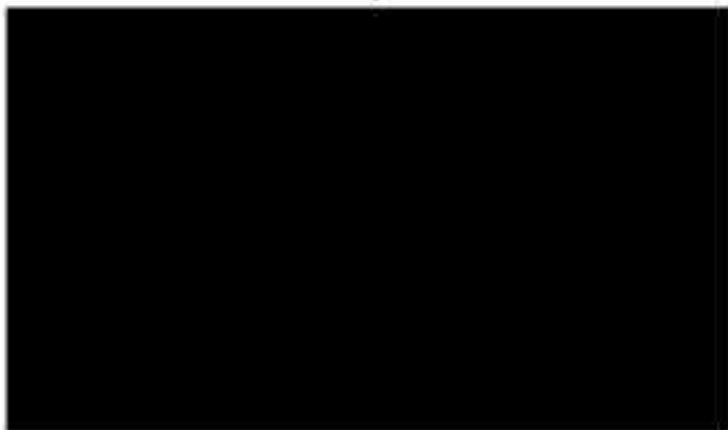

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023

JENIS PEKERJAAN : Side Drainase P.23

LOKASI : Sal.Primer Sisi Kanan

Termin : Ke- 8 (Delapan)

Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tanggal Kontrak

: HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023

JENIS PEKERJAAN

: Side Drainase P.39

Termin

: Ke- 8 (Delapan)

LOKASI

: Sal.Primer Sisi Kanan

Periode

: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigí - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tanggal Kontrak

: HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023

JENIS PEKERJAAN

: Side Drainase P.46

LOKASI

: Sal.Primer Sisi Kanan

Termin

: Ke- 8 (Delapan)

Periode

: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU



In Association with:
PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.
PT. Brahma Seta Indonesia
PT. Tualih Agung Anugrah
PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.
No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023
JENIS PEKERJAAN : Side Drainase P.39
LOKASI : Liquifikasi 1
Termin : Ke- 8 (Delapan)
Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 30 %
3		Kondisi 50 %
4		Kondisi 80 %
5		Kondisi 100 %


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023

JENIS PEKERJAAN : Side Drainase P.50

LOKASI : Liquifaksi

Termin : Ke- 8 (Delapan)


Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 30 %
3		Kondisi 50 %
4		Kondisi 80 %
5		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

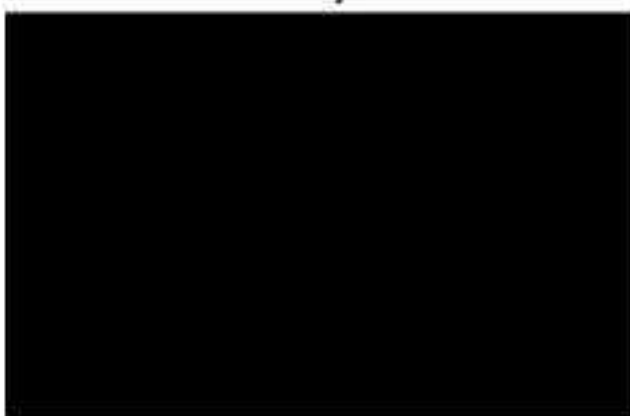

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU		 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuh Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of 
Nama Paket Perkerjaan		: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan		: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa		: PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi		: Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tanggal Kontrak		: HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023			
JENIS PEKERJAAN		: Side Drainase P.51		Termin : Ke- 8 (Delapan)	
LOKASI		: Liquifaksi		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS			KETERANGAN	
1				Kondisi 0 %	
2				Kondisi 30 %	
3				Kondisi 50 %	
4				Kondisi 80 %	
5				Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tanggal Kontrak

: HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023

JENIS PEKERJAAN

: Penerangan Jalan Umum (PJU)

LOKASI

: Tanggul Selatan

Termin

: Ke- 8 (Delapan)

Periode

: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 30 %
3		Kondisi 50 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuh Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Danareksa
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023 JENIS PEKERJAAN : Penerangan Jalan Umum (PJU) LOKASI : Tanggul Utara Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025			
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 30 %	
3		Kondisi 50 %	

Di Setujui oleh :

Direksi Pekerjaan






Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



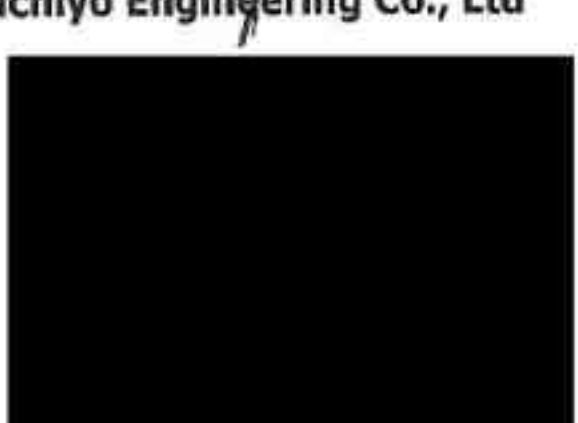

Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA





Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tanggal Kontrak

: HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023

JENIS PEKERJAAN

: Portal & Pos Jaga

LOKASI

: Kantor BWS

Termin


: Ke- 8 (Delapan)

Periode


: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

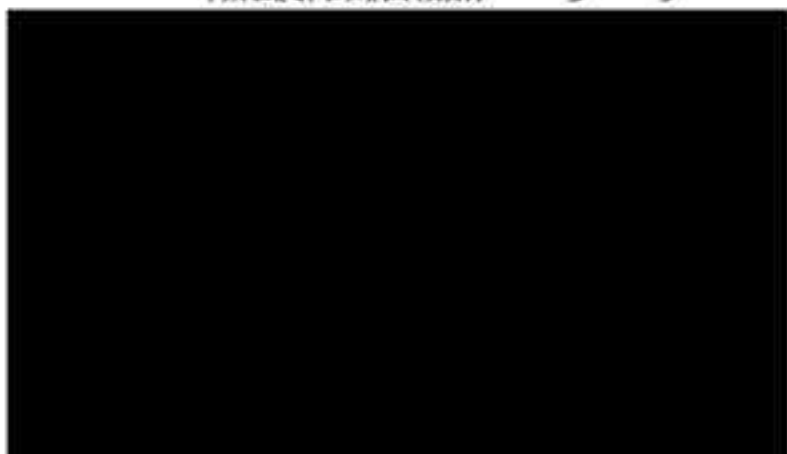

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

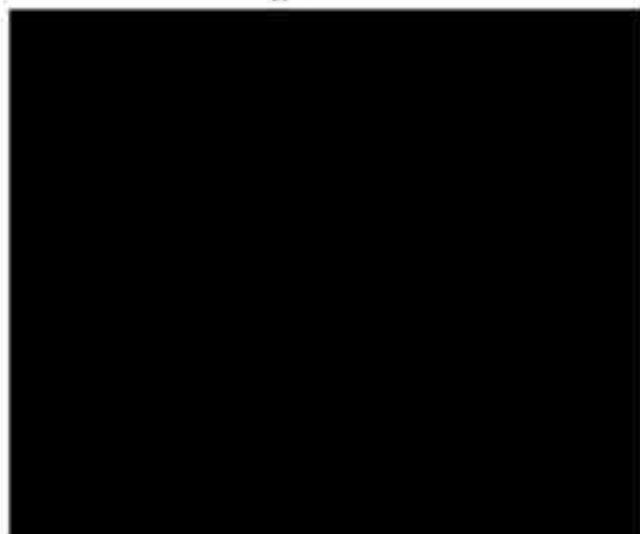

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

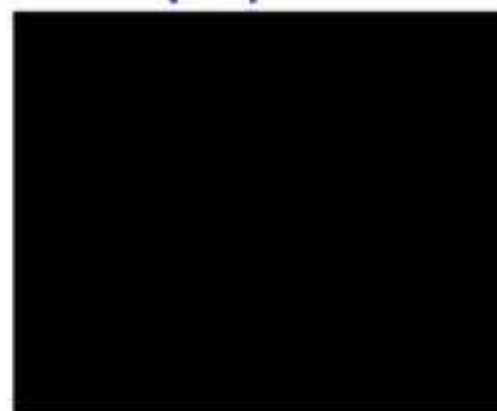

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Dahma Seta Indonesia PT. Tuh Agung Arugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of PT. Darsana
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023 JENIS PEKERJAAN : Monumen LOKASI : Liquifaksi Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025			
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 30 %	
3		Kondisi 50 %	
4		Kondisi 80 %	
5		Kondisi 100 %	


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

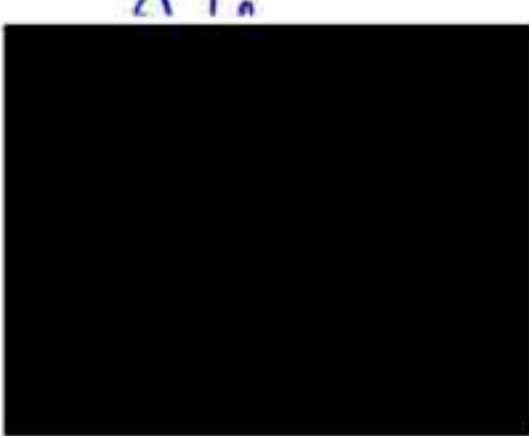

Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7

: HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN

: Guard Rail

Termin : Ke- 8 (Delapan)

LOKASI

: Tanggul Selatan


Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

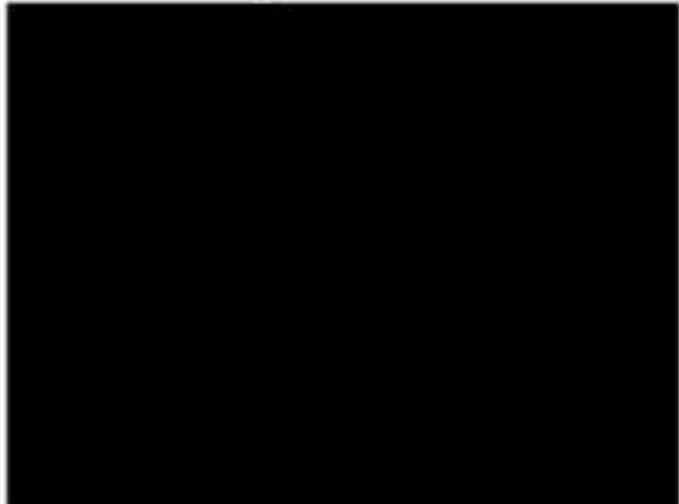

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN : Guard Rail

LOKASI : Tanggul Utara

Termin : Ke- 8 (Delapan)


Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

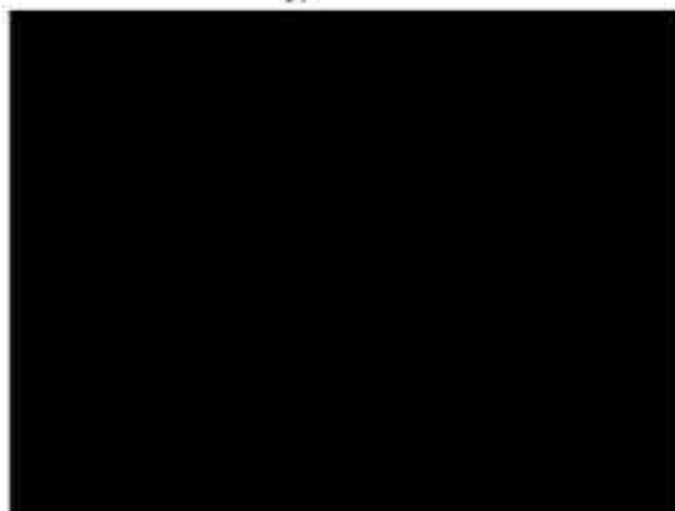

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

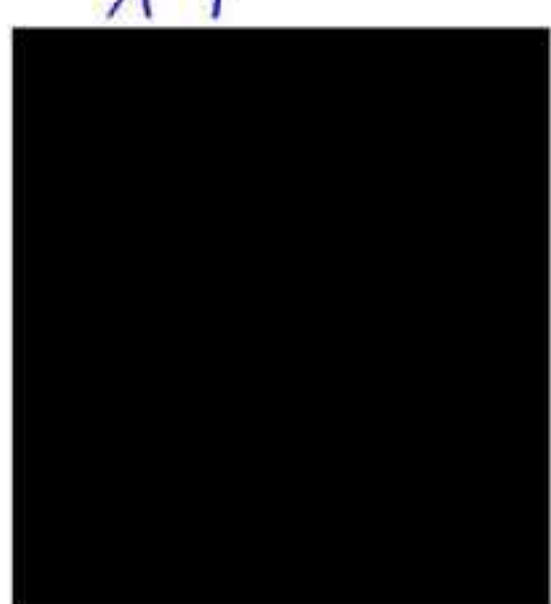

 KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU		 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tush Agung Amugah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Djarum
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : Pemindahan Guard Rail LOKASI : Tanggul Selatan Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025			
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA



	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Amugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of  Dinawidya
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025			
JENIS PEKERJAAN : Pagar Vihara	Termin : Ke- 8 (Delapan)		
LOKASI : Tanggul Utara	Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025		
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7

: HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN

: Pagar Samping Vihara

LOKASI

: Tanggul Utara

Termin

: Ke- 8 (Delapan)

Periode

: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :

Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan


PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA

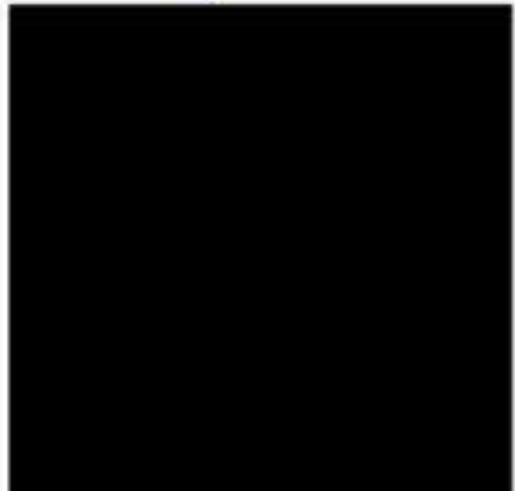



KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU



In Association with:
PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.
PT. Brahma Seta Indonesia
PT. Tuah Agung Amugrah
PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pak Dedy)
LOKASI : Tanggul Utara
Termin : Ke- 8 (Delapan)
Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA




 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU		 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Amugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of  Danareksa
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pak Roberth) LOKASI : Tanggul Utara		Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

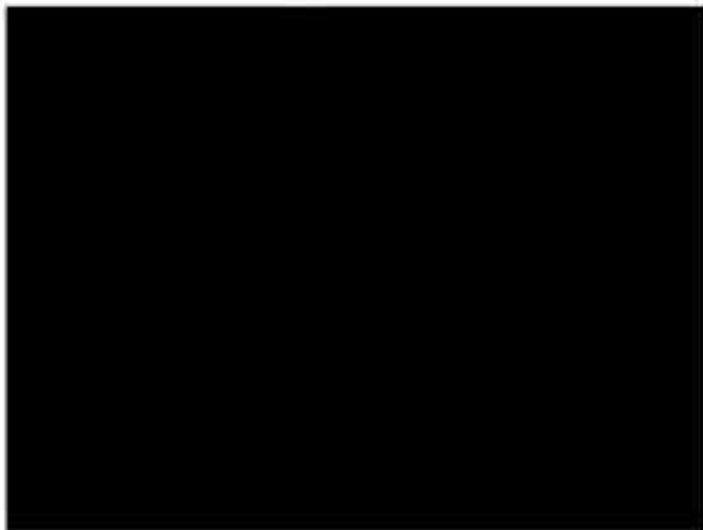


Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

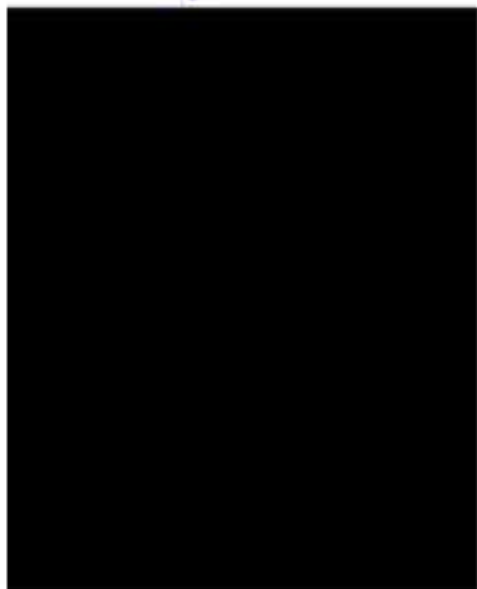

		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Amugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of  Danareksa
Nama Paket Perkerjaan		: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)		
Lokasi Perkerjaan		: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah		
Penyedia Jasa		: PT. NINDYA KARYA		
Konsultan Supervisi		: Yachiyo Engineering Co., LTD.		
No & Tgl Kontrak Add 7		: HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025		
JENIS PEKERJAAN		: Pagar Warga (Laundry)	Termin	: Ke- 8 (Delapan)
LOKASI		: Tanggul Utara	Periode	: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025
NO	AKTIVITAS			KETERANGAN
1				Kondisi 0 %
2				Kondisi 50 %
3				Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

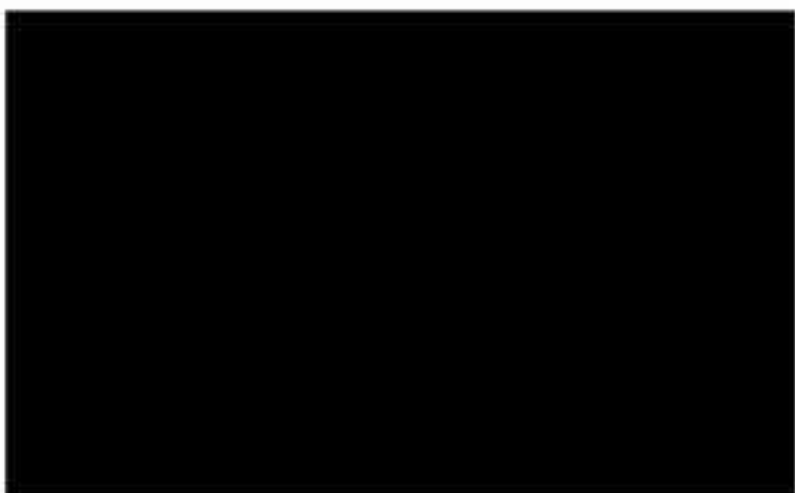

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd




Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Amugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant  NINDYA Member of Danarekita
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pak Pendeta) LOKASI : Tanggul Utara Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025		
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :

Disetujui Danarekita

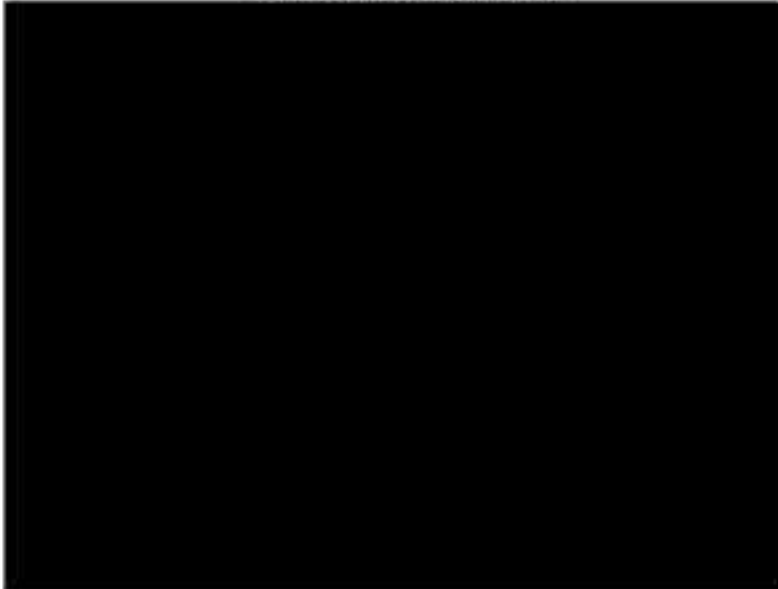

Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA





KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU




In Association with:
PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.
PT. Brahma Seta Indonesia
PT. Tuh Agung Anugrah
PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant




Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Tong Orens)
LOKASI : Tanggul Utara
Termin : Ke- 8 (Delapan)
Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

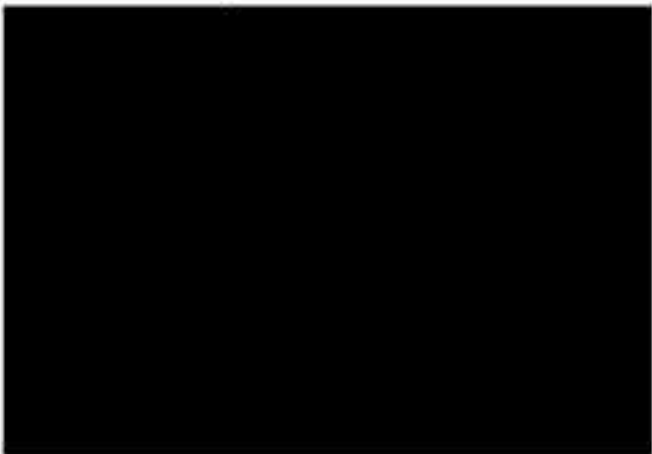

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Samping Tong Orens)

LOKASI : Tanggul Utara

Termin : Ke- 8 (Delapan)


Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan




Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

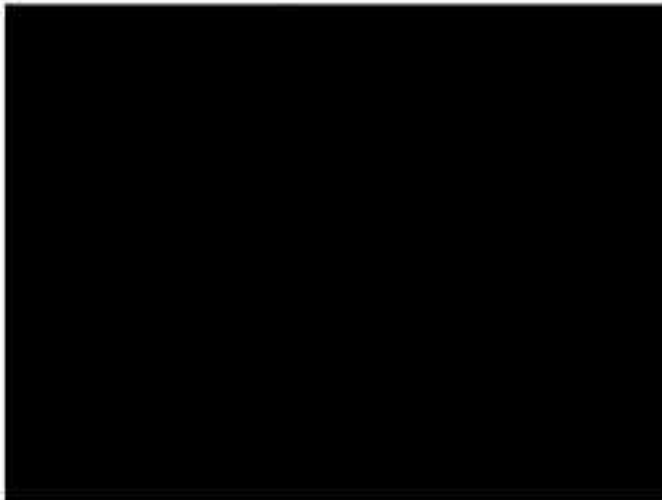

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

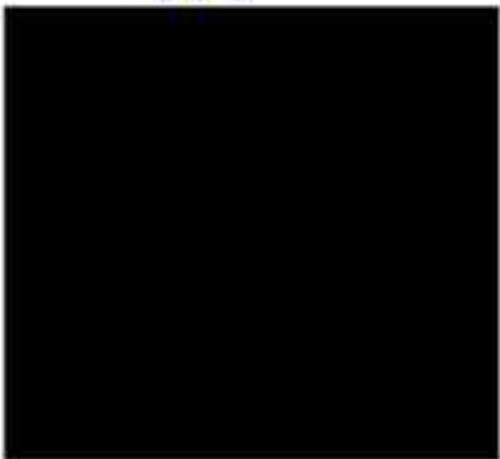

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU		 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of  Danareksa
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)		Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah	
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA		Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.	
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025			
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pak Jaksa)		Termin : Ke- 8 (Delapan)	
LOKASI : Tanggul Utara		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA




	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuhin Agung Amagah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of  Danareksa
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025			
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Dokter)		Termin : Ke- 8 (Delapan)	
LOKASI : Tanggul Utara		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

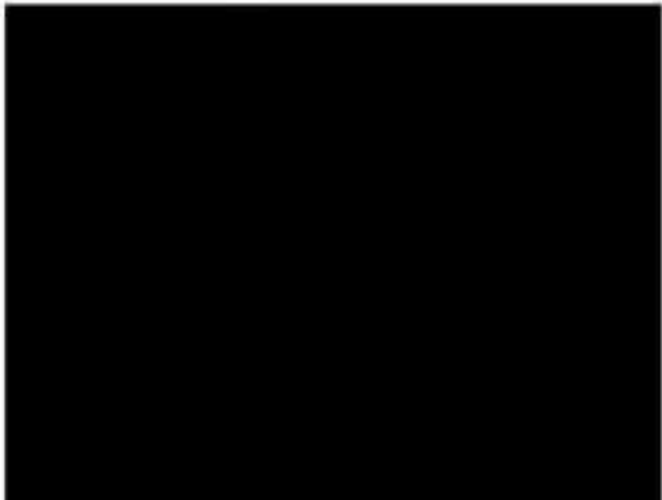

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

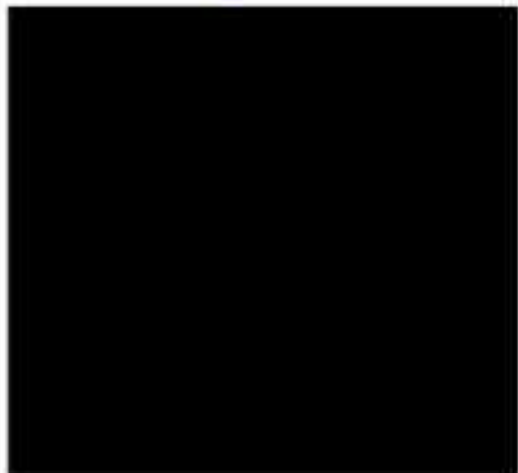


	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of C Olanseka
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025			
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Polisi)		Termin : Ke- 8 (Delapan)	
LOKASI : Tanggul Utara		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

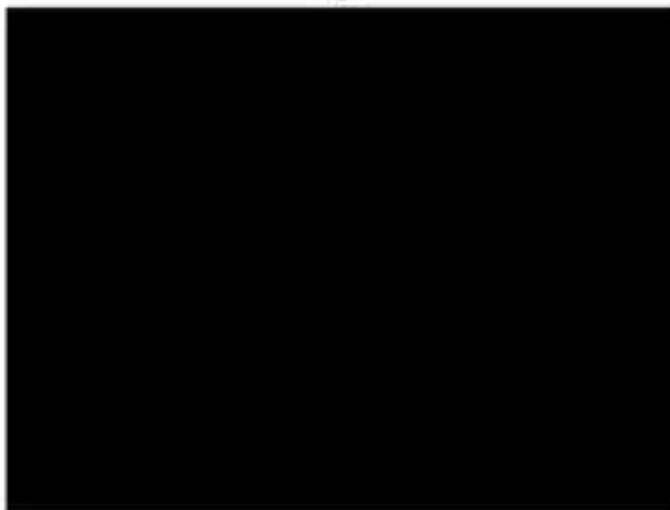

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Amugah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Danareksa
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pangkalan Gas) LOKASI : Tanggul Utara Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025			
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA





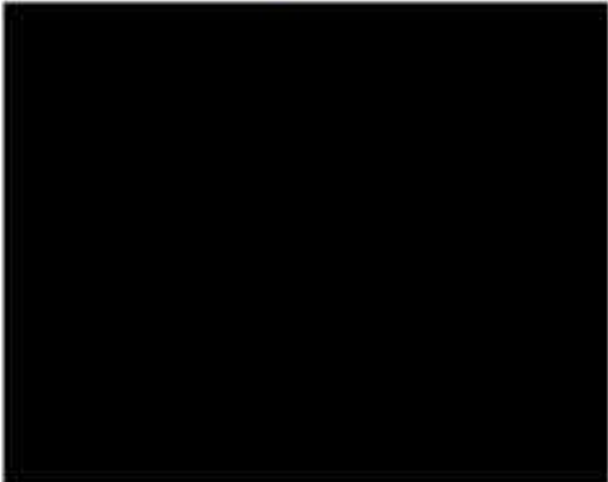

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Amugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Danareksa
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pagar Kuning) LOKASI : Tanggul Utara			
Termin : Ke- 8 (Delapan)		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

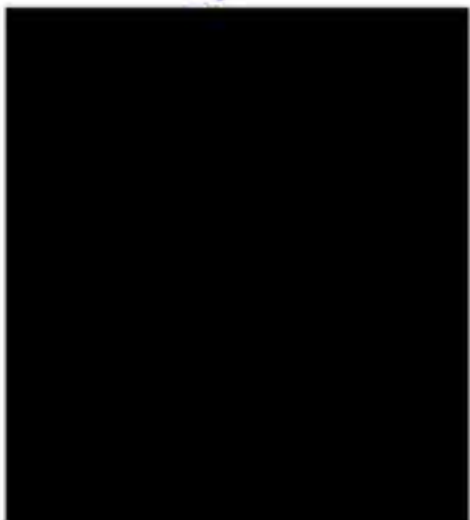

Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Pagar Batako)

LOKASI : Tanggul Utara

Termin : Ke- 8 (Delapan)



Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

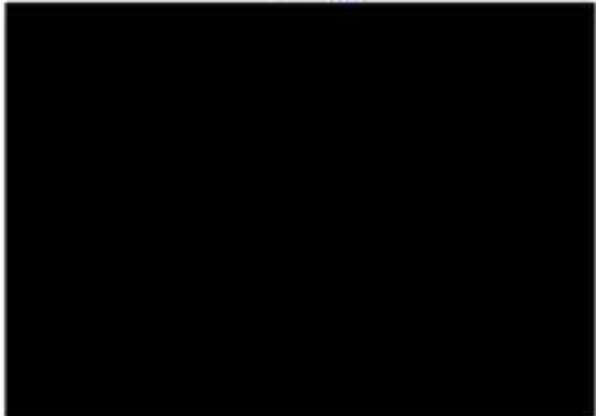

Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7

: HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN

: Pagar Warga (Setelah Parkiran)

LOKASI

: Tanggul Utara

Termin

: Ke- 8 (Delapan)


Periode

: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :

Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd


Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA


Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Toraja/Pagar (Johanes)

LOKASI : Tanggul Utara

Termin : Ke- 8 (Delapan)

Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tush Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of 
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Julius Mamuaya) LOKASI : Tanggul Utara Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025			
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :


Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

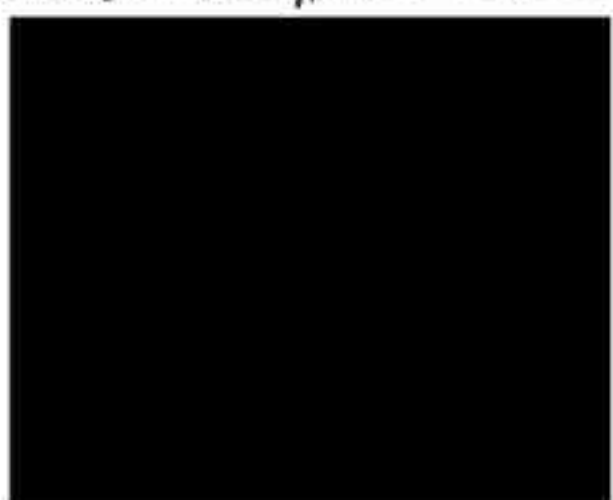

Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU



in Association with:
PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.
PT. Brahma Seta Indonesia
PT. Tuah Agung Amugrah
PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant




Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Ibu Sri)
LOKASI : Tanggul Utara
Termin : Ke- 8 (Delapan)
Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



Nama Paket Perkerjaan

: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan

: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa

: PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi

: Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7

: HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN

: Pagar Warga (Rumah Tinggi)

LOKASI

: Tanggul Utara

Termin

: Ke- 8 (Delapan)

Periode

: 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :

Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA





KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU



in Association with:
PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.
PT. Brahma Suta Indonesia
PT. Tuah Agung Amugrah
PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant



Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025
JENIS PEKERJAAN : Pagar Warga (Ibu Sri Ujung Pembuang B4)
LOKASI : Tanggul Utara
Termin : Ke- 8 (Delapan)
Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tush Agung Amugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Overseas
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023			
JENIS PEKERJAAN : Saluran Pembuang		Termin : Ke- 8 (Delapan)	
LOKASI : Bagunan Jembatan BGKn 54a		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	


Di Setujui oleh : Direksi Pekerjaan	Di Periksa oleh : Pengawas Lapangan PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd	Dibuat oleh : KONTRAKTOR PELAKSANA PT. NINDYA KARYA
		

	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 Member of 
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023 JENIS PEKERJAAN : Saluran Pembuang LOKASI : Bagunan Jembatan BGKn 54a Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025			
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 50 %	
3		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tush Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Danarukasi
Nama Paket Perkerjaan		: IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)		
Lokasi Perkerjaan		: Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah		
Penyedia Jasa		: PT. NINDYA KARYA		
Konsultan Supervisi		: Yachiyo Engineering Co., LTD.		
No & Tanggal Kontrak		: HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023		
JENIS PEKERJAAN		: Saluran Pembuang		Termin : Ke- 8 (Delapan)
LOKASI		: Bagunan Jembatan BGKn 54a		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025
NO	AKTIVITAS		KETERANGAN	
1			Kondisi 0 %	
2			Kondisi 50 %	
3			Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA



	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuh Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of Danarekha
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025			
JENIS PEKERJAAN : BGKn 55c		Termin : Ke- 8 (Delapan)	
LOKASI : P.31		Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025	
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 30 %	
3		Kondisi 50 %	
4		Kondisi 80 %	
5		Kondisi 100 %	

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

	KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tush Agung Amugah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant  NINDYA Member of  OAS
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59) Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD. No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025 JENIS PEKERJAAN : BGKn 55d LOKASI : P.44 Termin : Ke- 8 (Delapan) Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025		
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 30 %
3		Kondisi 50 %
4		Kondisi 80 %
5		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :

Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA





KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU



In Association with

PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD.

PT. Brahma Seta Indonesia

PT. Tuh Agung Anugrah

PS. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant



NINDYA

Member of Datasiku

Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)

Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah

Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA

Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.

No & Tgl Kontrak Add 7 : HK0201/Bws 13.6.1/392.A7, 09 MEI 2025

JENIS PEKERJAAN : BGKn 55b

LOKASI : P.36

Termin : Ke- 8 (Delapan)

Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025

NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 30 %
3		Kondisi 50 %
4		Kondisi 80 %
5		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :

Direksi Perkerjaan

Di Periksa oleh :

Pengawas Lapangan

PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

Dibuat oleh :

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. NINDYA KARYA

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 in Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuah Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant	 NINDYA Member of  Dinereka
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)			
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah			
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA			
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.			
No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023			
JENIS PEKERJAAN : BGKn 56b	Termin : Ke- 8 (Delapan)		
LOKASI : P.15	Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025		
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN	
1		Kondisi 0 %	
2		Kondisi 30 %	
3		Kondisi 50 %	


Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan



Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd



Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

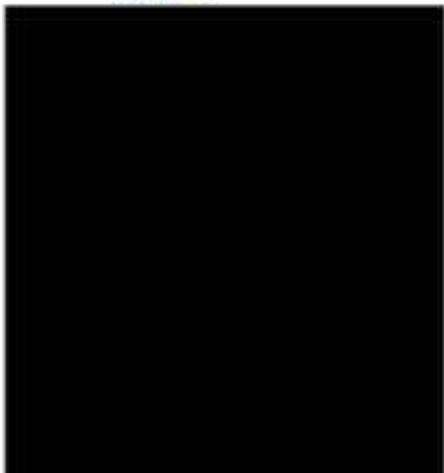

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	 In Association with: PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD. PT. Brahma Seta Indonesia PT. Tuh Agung Anugrah PT. Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant  NINDYA Member of  Dinamika
Nama Paket Perkerjaan : IMPROVEMENT OF GUMBASA MAIN CHANNEL (BGKn.54 -BGKn.59)		
Lokasi Perkerjaan : Kab.sigi - Palu, Sulawesi Tengah		
Penyedia Jasa : PT. NINDYA KARYA		
Konsultan Supervisi : Yachiyo Engineering Co., LTD.		
No & Tanggal Kontrak : HK0201/Bws 13.6.1/392, 10 AGUSTUS 2023		
JENIS PEKERJAAN	: Saluran Pembuang	Termin : Ke- 8 (Delapan)
LOKASI	: Bagunan Jembatan BGKn 54a	Periode : 17 Mei 2025- 30 Juni /2025
NO	AKTIVITAS	KETERANGAN
1		Kondisi 0 %
2		Kondisi 50 %
3		Kondisi 100 %

Di Setujui oleh :
Direksi Pekerjaan

Di Periksa oleh :
Pengawas Lapangan
PT. Yachiyo Engineering Co., Ltd

Dibuat oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. NINDYA KARYA

