

**Звіт про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту
автомобільних доріг загального користування державного значення за
2018 рік**

За рахунок бюджетної програми 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» здійснюється фінансування об'єктів за рахунок Державного дорожнього фонду, загального фонду, залишку кредитних коштів, залучених у попередні роки під гарантії Уряду.

Обсяг фінансування становить **7 957,5 млн грн**, план введення в експлуатацію – **590 км**.


За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **7 878,5 млн грн, 579,2 км (99%)**.

Основні об'єкти на яких виконувались роботи:


- М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине;
- М-05 Київ – Одеса;
- М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Теремблече;
- М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський;
- М-23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня;
- М-25 КПП «Соломоново» – Велика Добронь – Яноші;
- Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) –
Маріуполь;
- Н-11 Дніпро – Миколаїв;
- Н-26 Чугуїв – Мілове.



М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече
(на м.Бухарест) на ділянці км 225+500 - км 229+400

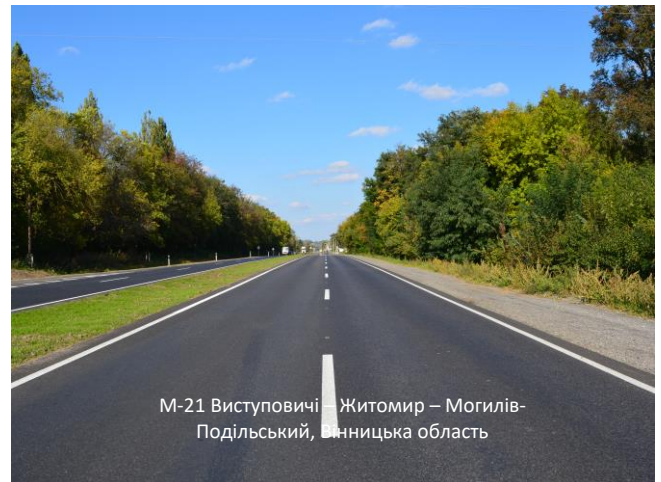

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-
Подільський, Вінницька область

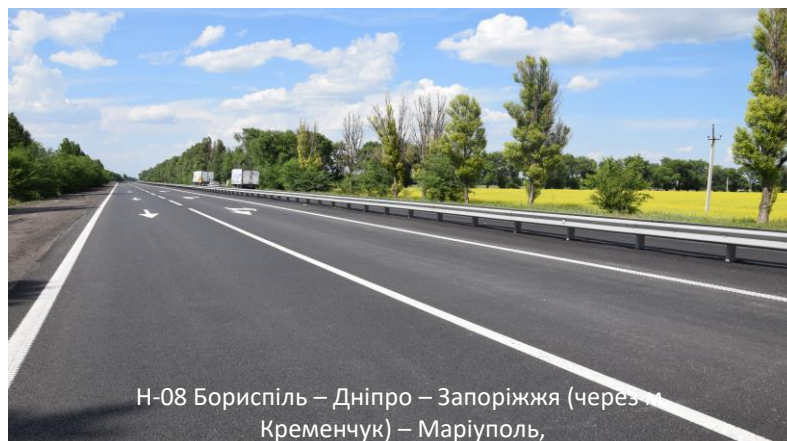



Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м.
Кременчук) – Маріуполь,

За рахунок бюджетної програми 3111100 «Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів – Тернопіль – Умань; Біла Церква – Одеса – Миколаїв – Херсон» обсяг фінансування становить 4 000 млн грн, план введення в експлуатацію 206,1 км.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **3 972,4 млн грн, 206,2 км (99%)**.

Основні об'єкти на яких виконувались роботи:

- М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська;
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка;
- М-05 Київ – Одеса;
- Р-41 Обхід м. Тернополя.

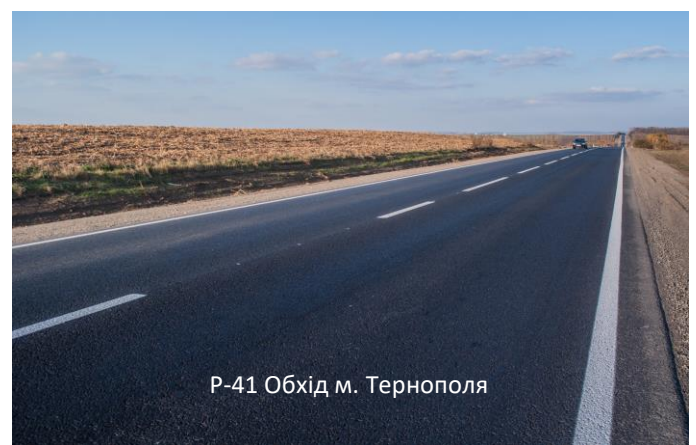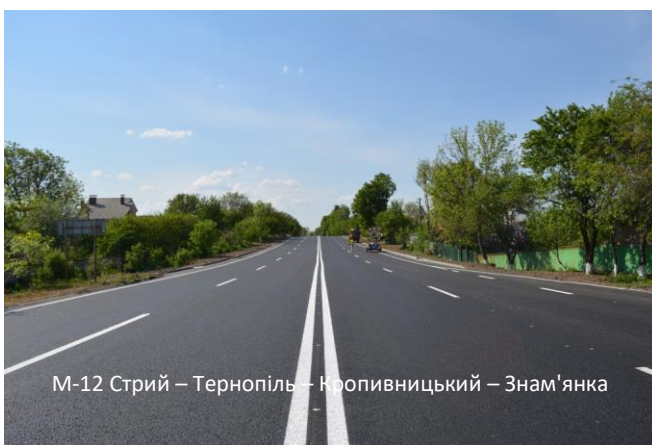

За рахунок бюджетної програми 3111120 «Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський» обсяг фінансування становить 1 558,8 млн грн, план введення в експлуатацію 57,6 км.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **1 558,8 млн грн, 57,6 км (100%)**.



За рахунок бюджетної програми 3111160 «Покращення стану автомобільної дороги Житомир – Чернівці» обсяг фінансування становить 1 000 млн грн, план введення в експлуатацію 71,6 км.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **674,6 млн грн, 35 км (68%)**, або 100% від фактично доведеного фінансування.



За рахунок бюджетної програми **311150 «Покращення стану автомобільної дороги Харків – Охтирка»** передбачено фінансування загальним обсягом – **1 193,6 млн грн**, план введення в експлуатацію **103,6 км**.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **1 190,7 млн грн, 103,6 км (99,5%)**.



За рахунок бюджетної програми **311140 «Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка»** обсяг фінансування становить **2 000 млн грн**, план введення в експлуатацію **5,5 км**.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **1 509,3 млн грн (75%)**, або 100% від фактично доведеного фінансування.




За рахунок бюджетної програми 3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» обсяг фінансування становить **381,9 млн грн**, план введення в експлуатацію **23,5 км**.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **381,9 млн грн, 23,5 км (100%)**.

Основні об'єкти:

- М-11 Львів – Шегині;
- Т-14-16 Львів – Пустомити – Мединичі;
- Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К.Бузька – Бібрка.

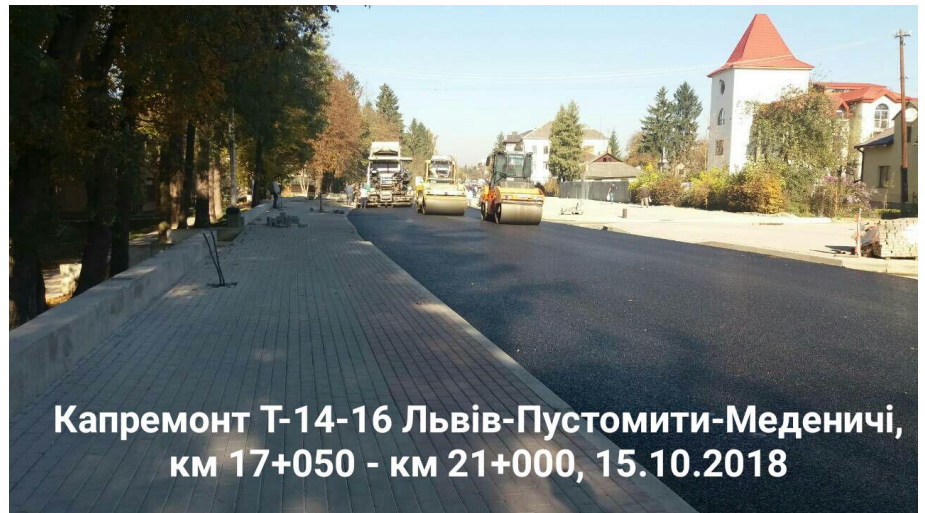

За рахунок коштів «Митного експерименту» обсяг фінансування становить **5 595,2 млн грн**, план введення в експлуатацію **506,6 км**.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **5 062,9 млн грн, 402,2 км (90,5%)**.

Основні об'єкти:

- М-15 Одеса – Рені;
- Н-13 Львів – Самбір – Ужгород;
- Н-20 Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь;
- Н-30 Василівка – Бердянськ;
- Р-65 КПП «Миколаївка» – Семенівка – Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка»;
- Т-05-15 Олександрівка – Покровськ – Костянтинівка.



За рахунок коштів місцевого бюджету обсяг фінансування становить 721,3 млн грн, план введення в експлуатацію 35,1 км.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **621,9 млн грн, 18,8 км (86%)**.

Основні об'єкти:

– Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь;

– Н-10 Стрий – Мамалига;

– Т-15-08 Калинівка – Снігурівка.



За рахунок всіх джерел обсяг фінансування становить 24 408,2 млн грн, план введення в експлуатацію 1 594,9 км.

За оперативною інформацією станом на 27.12.2018 виконано робіт на суму **22 851,1 млн грн, 1 428 км 93%**.

Крім того, на автомобільних дорогах державного значення у поточному році влаштовано поверхневу обробку на загальній протяжності **135 км**.
