


| DATOS GENERALES         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| NUMERO DE OBRA          | 22118   |             |
| NOMBRE DE LA OBRA       | AMPLIACIÓN DE A RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. |             |
| EMPRESA                 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  |             |
| PROGRAMA/ FONDO         | FISM 2022   |             |
| PROGRAMA                | INICIO  | TERMINACION |
| CONTRACTUAL             | 25/06/2022  | 10/08/2022  |
| DIFERIDO                |   |             |
| CONVENIO                |   |             |
| REAL                    | 25/06/2022  | 10/08/2022  |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS |   |             |
| HOMBRES                 |   | 18          |
| MUJERES                 |   | 27          |
| TOTAL                   |   | 45          |

| AREA TECNICA RESPONSABLE: |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| OBSERVACIONES:            | OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO |
| AVANCE FISICO %           | 100%                         |
| (A) IMPORTE CONTRATADO    | \$114,922.35                 |
| (B) ANTICIPO              | \$0.00                       |
| (C) CONVENIO              | \$0.00                       |
| TOTAL CONTRATADO          | \$114,922.35                 |
| LOCALIDAD                 |                              |
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD    | CONCEPCION CUAUTLA           |
| REZAGO SOCIAL             | POBREZA MODERADA             |
| ZAP                       | RURAL                        |
| GEOLOCALIZACION           | X 807174.92 - Y 2086503.26   |

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO

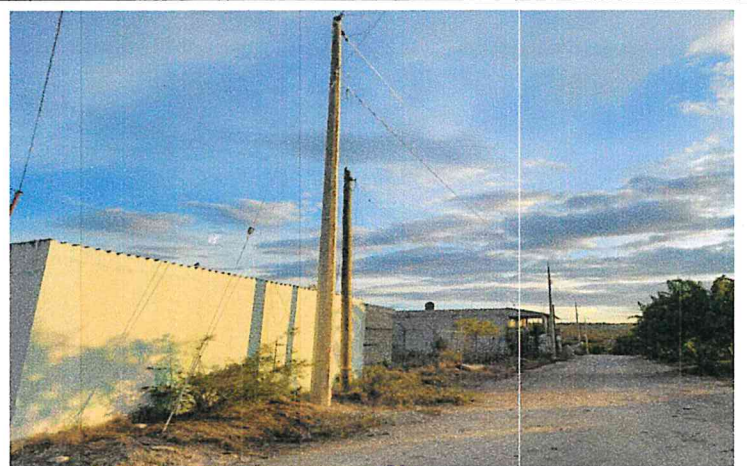

Municipio de Tecali de Herrera  
 Ayuntamiento de Tecali de Herrera  
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
