



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Julio de 2020



 Fondo Adaptación

Edgar Ortiz Pabón
Gerente

Aníbal José Pérez García
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Milla Patricia Romero
Subgerente de Regiones

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Rafael Abuchaibe López
Subgerente de Proyectos

Diana Patricia Bernal Pinzón
Secretaria General

**Equipo Directivo Fondo
Adaptación:**

Víctor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Catalina Soto Velasco
Asesor I Equipo de Trabajo
Planeación y Cumplimiento

Equipo Técnico:

Informe seguimiento de Plan de Acción 2020
Versión 1, Julio de 2020. Bogotá D.C.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2020/07/08	Documento Inicial

Informe de
seguimiento Plan
de Acción

2020

Presentación

En 2010 se crea el Fondo Adaptación como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011", mediante el Decreto 4819 de 2010. La tragedia dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1.004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación.

El Fondo, se crea con la finalidad de identificar, estructurar y gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La experiencia adquirida y el impacto de las intervenciones han convertido a la entidad en un referente institucional en lo concerniente al desarrollo de proyectos integrales de adaptación y reducción de riesgos relacionados con los impactos del cambio climático. El Fondo Adaptación es hoy una Entidad que contribuye al desarrollo sostenible del país, a través de la implementación de estrategias integrales de adaptación de las actividades socioeconómicas y la infraestructura del país a los efectos del cambio climático, que dicho sea de paso, reducen los impactos fiscales para el Estado.

Aunque la entidad centra sus funciones en la reconstrucción, también desarrolla cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

Las Intervenciones en infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático realizadas por el Fondo se han realizado en 28 departamentos, beneficiando a más de 28,5 millones de habitantes.

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Contexto de Formulación y Seguimiento del Plan de Acción 2020

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2020
Criterios para la evaluación del Plan
Esquema de seguimiento

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

4. Resultados Detallados Plan de Acción 2020

- 4.1. Área Subgerencia de Riesgo
- 4.2. Área Subgerencia de Proyectos
- 4.3. Área Subgerencia de Estructuración

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

- 5.1. Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG
- 5.2. Área Subgerencia de Regiones
- 5.3. Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones
- 5.4. Área Oficina de Planeación
- 5.5. Área Secretaría General

6. Seguimiento Plan de Acción Indicadores Transversales

1. Introducción

En el Plan de Acción 2020 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinan las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2020.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 741), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017 y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El presente documento de Seguimiento al Plan de Acción 2020 para el segundo trimestre del año, se realiza en una coyuntura particular en la historia del país y del mundo. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de aislamiento de la población como mecanismo de protección ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el pasado 11 de marzo, producto del Covid – 19, han afectado el desarrollo de los proyectos ejecutados por el Fondo Adaptación en las diferentes regiones del país. Esta situación, ha tenido un impacto sobre los resultados y las metas establecidas por el Fondo, afectando los resultados propuestos en el Plan de Acción 2020.

El presente informe de seguimiento se realiza con base en la versión 2 del Plan de Acción Anual, aprobada por el Consejo Directivo en julio de 2020. La cual contiene modificaciones a las metas de los equipos de Canal del Dique, Jarillón de Cali, Vivienda, Educación, Acueducto, Salud, Reactivación Económica y Medio Ambiente, debido a los inconvenientes en la ejecución de los proyectos derivados del aislamiento preventivo provocado por la emergencia sanitaria del COVID-19 y otras situaciones.

Así mismo, se realizaron modificaciones a los planes de acción de los equipos de Tecnología, Talento Humano, Defensa Judicial, Atención al Ciudadano y Gestión

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Documental, las cuales fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.

El propósito de este informe de ejecución es informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2020, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

2. Contexto para la formulación del Plan

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2020

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento al plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos y responsables, el Informe de Seguimiento se estructuró de la misma forma que está estructurado el Plan de Acción, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1199 de 2018, en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.

Criterios para la evaluación del Plan

De acuerdo con la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco.	Productos Tangibles
Relevante. Apropiado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada
Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia

Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

Esquema de seguimiento


El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

En el caso del Fondo Adaptación el Seguimiento al Plan de Acción permite medir el desempeño de la siguiente estructura:

- 6 Objetivos Estratégicos
- 7 Áreas
- 25 Equipos
- 27 Gerentes de meta
- Acciones estratégicas
- Indicadores de Eficacia
- Metas Anuales
- Metas Trimestrales

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control:


1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. Para este ejercicio de seguimiento este indicador se presenta para los Objetivos Estratégicos y las Áreas. El gráfico que ilustra este indicador se muestra de la siguiente manera.

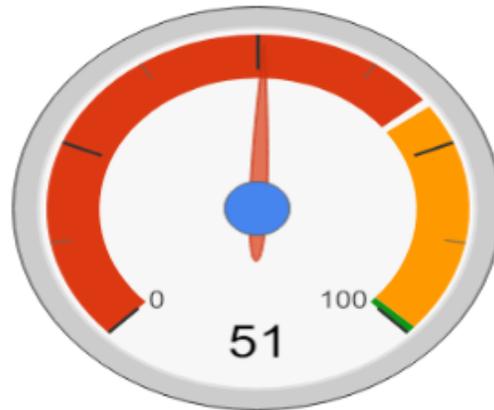

El semáforo de colores presentado en la gráfica, representa los siguientes avances:

-  Acción/Indicador sin metas/avances
-  Metas Ejecutadas = >100%
-  Metas Rezagadas entre >70%<99%
-  Metas Rezagadas <70%

2. Indicador de Avance de Metas Consolidadas. Busca mostrar el progreso de un objetivo en el tiempo, sin examinar su causa y sus efectos. Para este seguimiento se realiza un análisis de Avance de Metas Consolidadas por Área y Equipo, donde se relaciona lo planeado versus lo ejecutado mes a mes en la senda de tiempo. El gráfico siguiente ilustra la forma como se presenta este indicador.

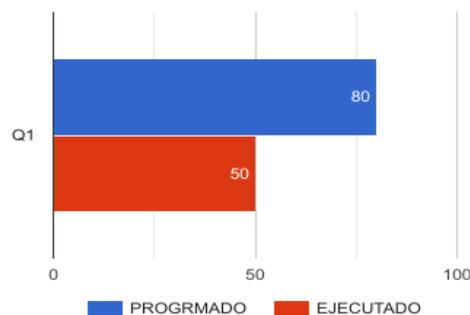

Adicionalmente, para cada meta específica del equipo de trabajo se indica el avance numérico y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a lo planeado.

-  Acción/Indicador sin metas/avances
-  Metas Ejecutadas = >100%
-  Metas Rezagadas entre >70%<99%
-  Metas Rezagadas <70%

Finalmente se incluye la bitácora de seguimiento de cada meta donde cada equipo responsable ilustra los avances en términos cualitativos durante cada mes.

Para realizar la medición y soportar las evidencias que permita su verificación, el Fondo desarrolló e implementó, una herramienta tecnológica que soporta el reporte y que permite realizar análisis en línea basados en un seguimiento por área, equipo e incluyendo los indicadores de seguimiento y avance.

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran los objetivos estratégicos del plan.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y la perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Perspectiva externa

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva interna

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.


OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la **perspectiva externa**, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.

Objetivo Estratégico #1: Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

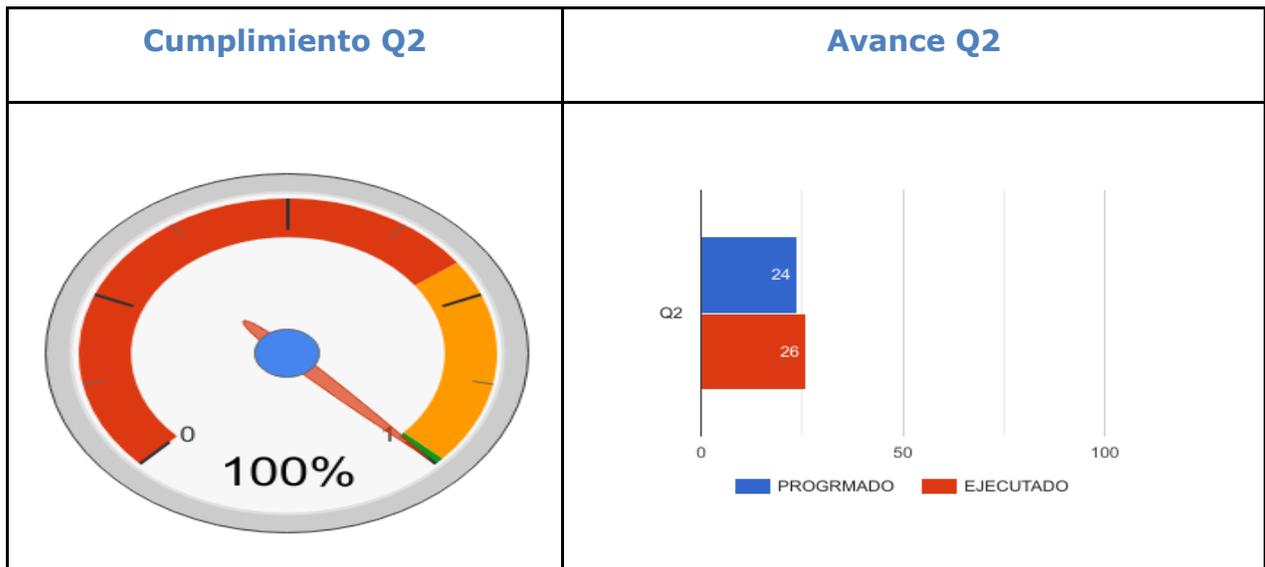


Objetivo Estratégico #2: Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

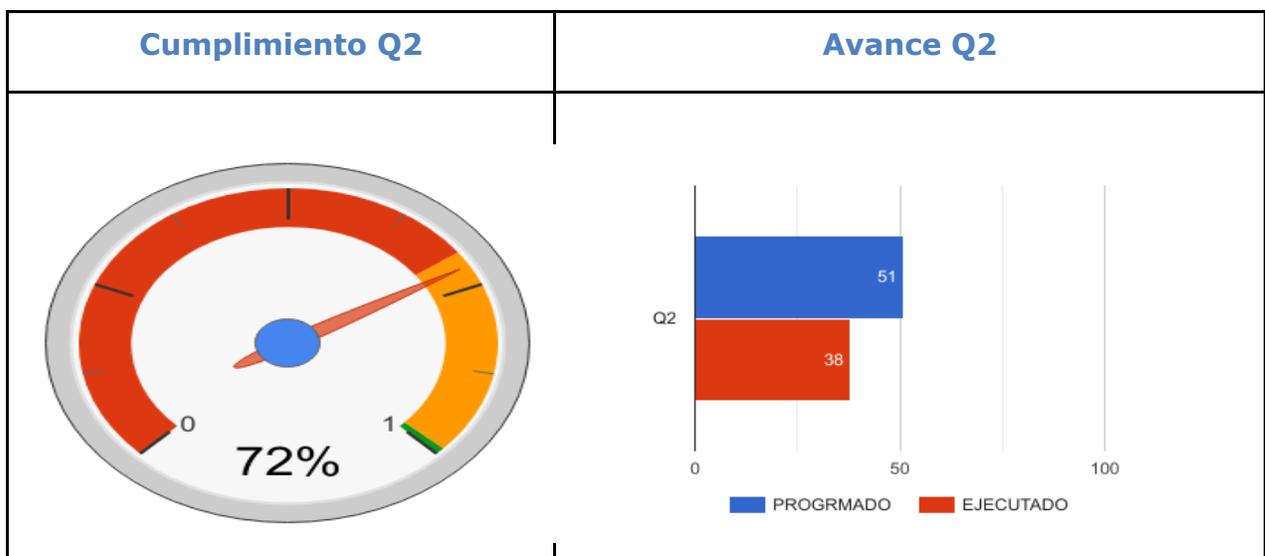


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Objetivo Estratégico #3: Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

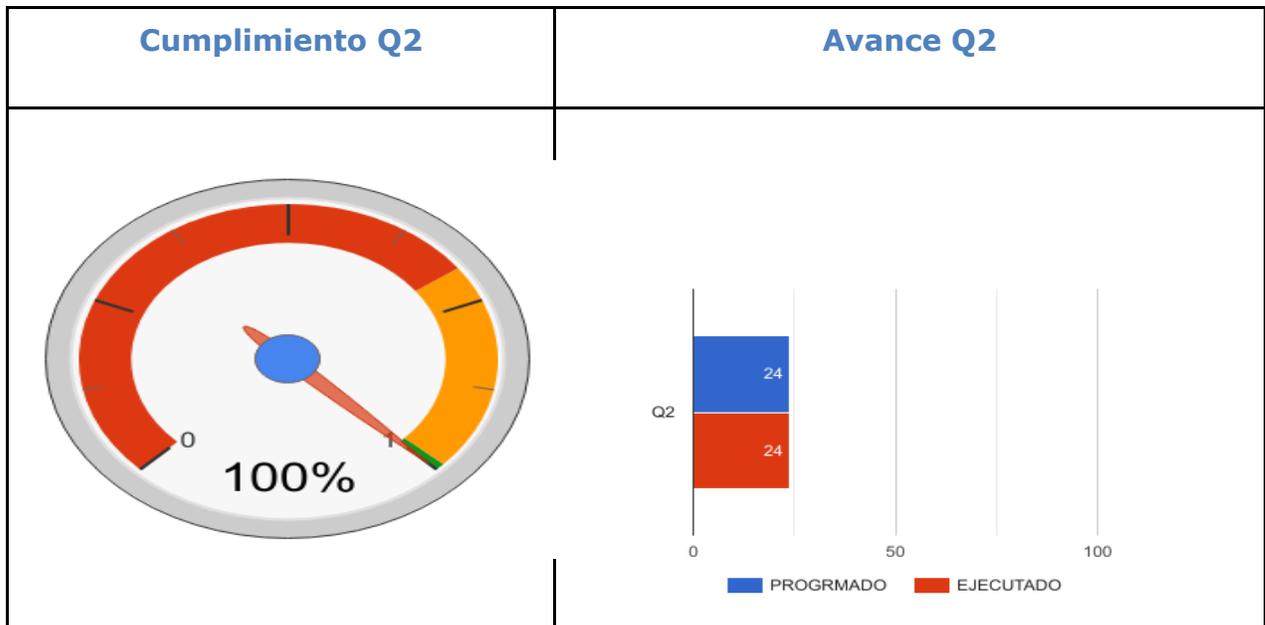

Objetivo Estratégico #4: Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de su resiliencia de las regiones y de su población.

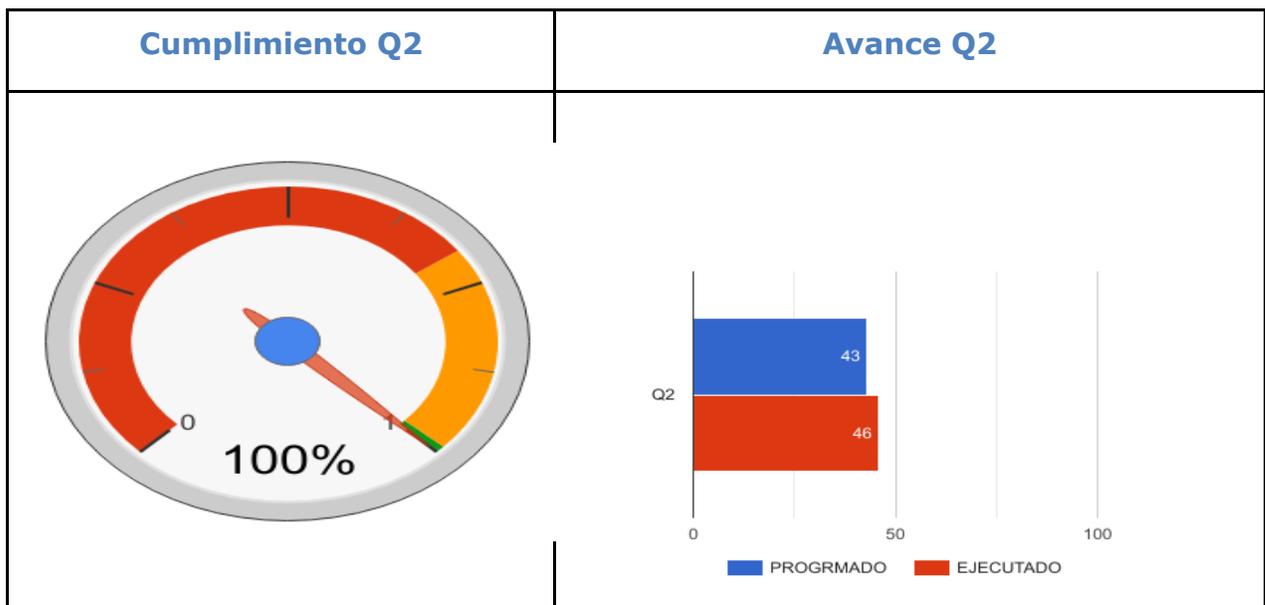

4. Seguimiento Plan de Acción por área

Para el segundo trimestre del año, el Fondo Adaptación tenía previsto la ejecución del 28% de su Plan de Acción. El análisis ponderado permite observar que para el segundo trimestre del 2020 el Fondo ha ejecutado 33% de lo programado.

En este informe se destaca el avance del equipo de la Subgerencia de Regiones y el área de Comunicaciones que en este periodo, sobrepasó significativamente la ejecución versus lo inicialmente programado.

A continuación se detalla el nivel de avance por área y equipo:


4.1. Área Subgerencia de Riesgo

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático:



Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2020 en la Subgerencia de Riesgos. En estas se puede evidenciar el cumplimiento de la Subgerencia, respecto a las metas en el Q2 y el avance cuantitativo total, el cual se presenta de forma acumulativa con corte al cierre del Q2.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

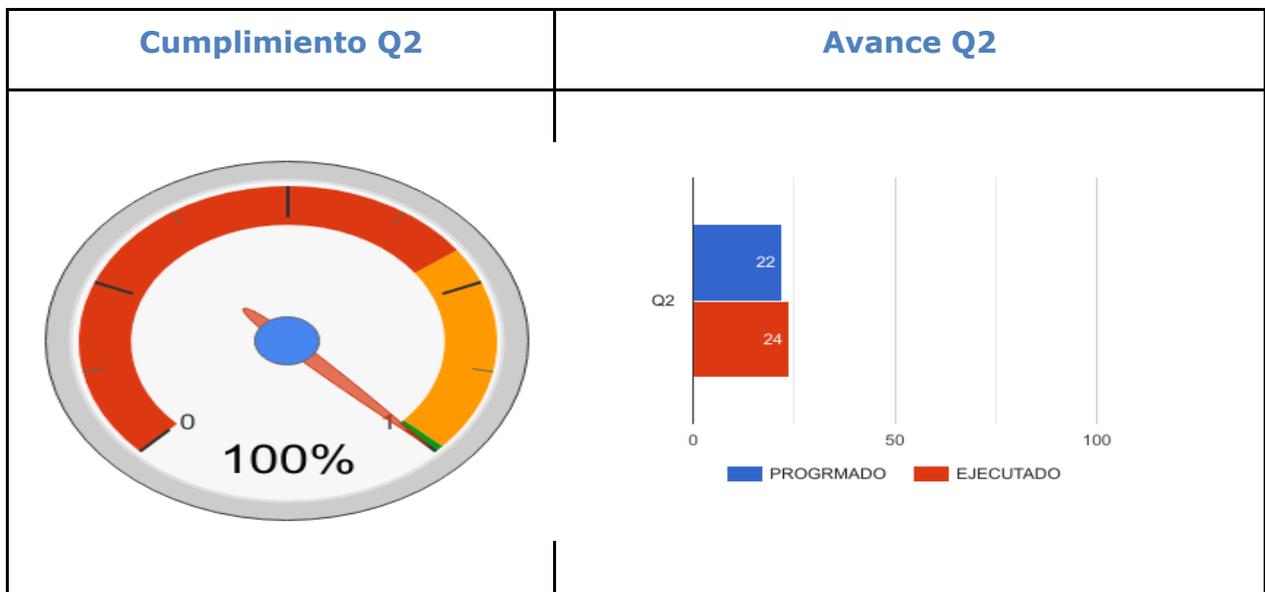

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS** Portafolio/Programa/Proyecto: **CANAL DEL DIQUE**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA01)_Proyectos terminados	# 1	1	0	0	0	1	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA02_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA02)_Proyectos terminados	#1	1	0	1	0	0	1
AEA03_Contratar obras de construcción o re-fuerzo del Canal Dique	(AEA03)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	#1	639	0	0	0	639	0
AEA04_Terminar obras de construcción o re-fuerzo del Canal Dique	(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	#1	279	0	279	0	0	279
AEA05_Elaborar la Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	(AEA05)_Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	#1	2	0	0	2	0	0
AEA06_Desarrollar la Gestión Predial del Canal de Dique	(AEA06)_Diagnóstico o Gestión Predial, elaborado	#1	1	0	1	0	0	1

Bitácora de Seguimiento

(AEA01)_Proyectos contratados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para mediados de mayo de 2020. Están pendientes 10 metros de cuneta y formalizar su entrega. Para abril de 2020 no se registra avance por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

	<p>Mayo</p>	<p>El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para finales del Q2 o inicios del Q3 de 2020. Ya se terminaron los 10 metros de cuneta. Los temas pendientes para el cierre según el Comité Sectorial del Macroproyecto Canal del Dique son:</p> <p>1) Paz y salvo de manifestaciones ciudadanas (personería): -Acta de concertación para arreglo de 300 m de vía. -Cierre de 6 quejas (arreglos de vivienda). -Se envió oficio a la Personería con soportes para conciliación.</p> <p>2) Paz y salvo ambiental (CARDIQUE): -Se envió informe y georreferenciación de siembra.</p> <p>3) Foro final de Auditoría Visible: -Cambio de estrategia para realizarlo a través de folleto y entregarlo puerta a puerta. Se está haciendo la solicitud de regiones.</p> <p>4) Acta de entrega a la Alcaldía de Arjona: -Planos récord. -Informes de cierre. -Planos prediales.</p>
	<p>Junio</p>	<p>El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. Corresponde a la contratación de los 639 metros de dique que faltan de la obra de Santa Lucía. Con corte al 30 de junio de 2020, se definió que la modalidad de contratación para dicha obra es por menor cuantía, esto acorde al presupuesto de la obra. Adicionalmente, se cuenta con un informe de precios unitarios estimados para la contratación del centro poblado.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Bitácora de Seguimiento

(AEA02)_Proyectos terminados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para finales del Q3 de 2020. Si bien la obra del centro poblado de Gambote finalizó el 19 de mayo de 2020 con una ejecución física del 100%, está pendiente la formalización de la entrega. Con corte al 30 de junio de 2020, se cuenta con el paz y salvo de la Personería Municipal.

Bitácora de Seguimiento

(AEA03)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para el Q4 de 2020. Corresponde a los 639 metros de dique que faltan.
	Mayo	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. Corresponde a los 639 metros de dique que faltan.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Junio	<p>El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. Corresponde a los 639 metros de dique que faltan de la obra de Santa Lucía.</p> <p>Es de aclarar que la modalidad de contratación definida para la obra de Santa Lucía es por menor cuantía, esto acorde al presupuesto de obra. El nuevo proceso de contratación debe ir en paralelo con la gestión predial. Adicionalmente, el ET-Macroproyecto Canal del Dique está adelantando las gestiones para adelantar el inicio de la obra.</p>
--	-------	--

Bitácora de Seguimiento

(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica es igual a 918 metros de dique. En ese orden de ideas, a abril de 2020, ya están construidos 279 metros de dique, restan 639 metros de dique que está previsto construirlos para el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. Es de aclarar, que por el aislamiento preventivo, hay 2 opciones; la primera que es en el mejor de los escenarios, se construyan los 639 metros de dique restantes en el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. La segunda opción, escenario crítico, hace que se construyan los 639 metros de dique en el Q1 (enero a marzo) de 2021.
	Mayo	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica es igual a 918 metros de dique. En ese orden de ideas, a abril de 2020, ya están construidos 279 metros de dique, restan 639 metros de dique que está previsto construirlos para

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. Es de aclarar, que por el aislamiento preventivo, hay 2 opciones; la primera que es en el mejor de los escenarios, se construyan los 639 metros de dique restantes en el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. La segunda opción, escenario crítico, hace que se construyan los 639 metros de dique en el Q1 (enero a marzo) de 2021. La opción 2 fue puesta en conocimiento de la OAPC para que se llevará a aprobación del Consejo Directivo.
	Junio	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica es igual a 918 metros de dique. En ese orden de ideas, al 30 de junio de 2020, ya están construidos 279 metros de dique. Restan 639 metros de dique para cumplir la meta y estos corresponden a la obra de Santa Lucía. Se sometió a aprobación del Consejo Directivo trasladar el cumplimiento de dicha acción estratégica para el Q1 (enero a marzo) de 2021. Durante el mes de junio de 2020, se realizó reunión en el municipio de Santa Lucía para resolver los problemas sociales y dar inicio a la obra.

Bitácora de Seguimiento

(AEA05)_ Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está en ejecución, se ejecutará en un 100 % en el Q2 (abril a junio) de 2020.
	Mayo	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para el Q3 (julio a septiembre) de 2020. Sin embargo, se sometió a aprobación del Consejo Directivo que dicha acción estratégica se desplazará para el Q4 (octubre a


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		diciembre) de 2020.
	Junio	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está previsto para el Q3 (julio a septiembre) de 2020. Sin embargo, se sometió a aprobación del Consejo Directivo que dicha acción estratégica se desplazará para el Q4 (octubre a diciembre) de 2020. Lo anterior, obedece a la dinámica de estructuración de la ANI.

Bitácora de Seguimiento

(AEA06)_Diagnóstico Gestión Predial, elaborado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	El indicador de cumplimiento para esta acción estratégica está en ejecución, se ejecutará en un 100% en el Q2 (abril a junio) de 2020.
	Junio	Con corte al 30 de junio de 2020 se terminó el diagnóstico de la gestión predial del contrato 185 Arce Rojas Consultores & Compañía S.A., evidenciando presuntos incumplimientos por parte del contratista. Como consecuencia del resultado se está elaborando el segundo informe de presunto incumplimiento del contrato en mención, y se está determinando la forma de proceder para la recuperación del recurso invertido.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

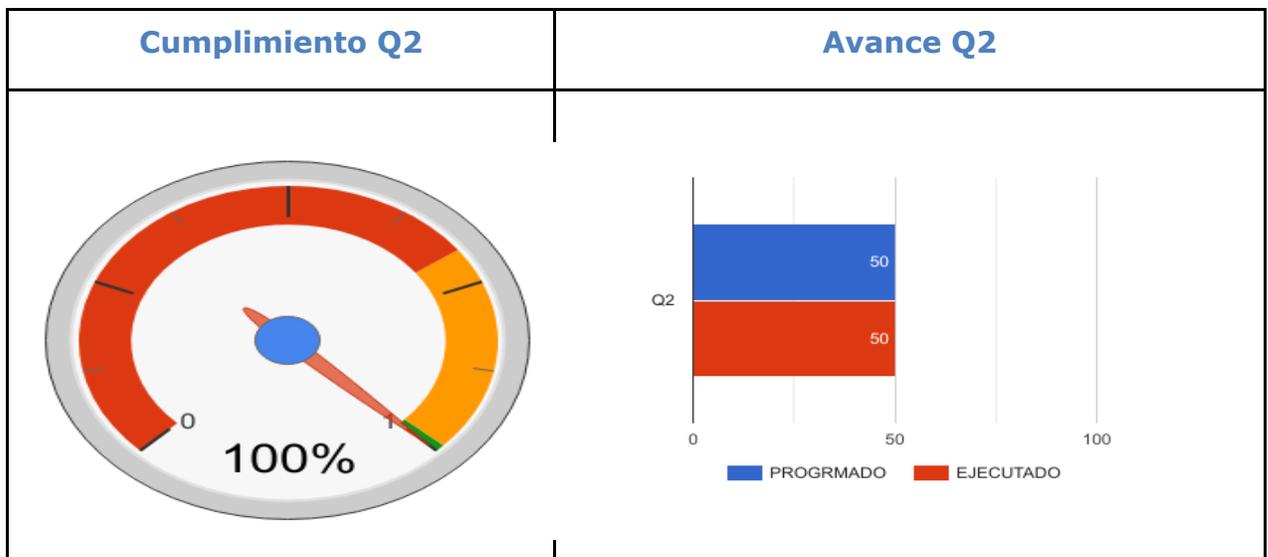

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: LA MOJANA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA07_Contratar Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA07)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué	#1	3	0	3	0	0	3

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	(Bolívar), contratadas								
AEA08_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	(AEA08)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)	#1	28	0	0	0	28	0	

Bitácora de Seguimiento


(AEA07)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El 3 abril de 2020 se suscribe el "ACTA DE DILIGENCIA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS" del proceso de invitación cerrada No. FA-IC-I-S-018-2019, el cual tiene por objeto "CULMINAR LOS DISEÑOS DE DETALLE CON LOS INSUMOS ENTREGADOS POR EL FONDO Y CONSTRUIR LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS CASCOS URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS (SUCRE) Y MAGANGUÉ (BOLÍVAR)", con la recepción de la propuesta por parte de un solo proponente UNIÓN TEMPORAL SAN MARCOS 2020.
	Mayo	Con el Rad. No. E-2020-003392, se notifica al consultor UNIÓN TEMPORAL SAN MARCOS 2020 la aceptación de la oferta del proceso de invitación cerrada No. FA-IC-I-S-018-2019.
	Junio	Aceptada la oferta de la Invitación Cerrada No. FA-IC-I-S-018-2019 en el mes de mayo, se finaliza el proceso con la suscripción del Contrato No. FA-IC-I-S-140-2020 con la Unión Temporal San Marcos 2020 el pasado 30 de junio de 2020, el cual contempla:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>1) Culminación de los Diseños de las obras de protección de inundación en San Marcos y Magangué;</p> <p>2) Obra de protección de inundación en San Marcos;</p> <p>3) Obra de protección de inundación en Magangué</p>
--	--	--

<p>(AEA08)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)</p>	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>Para el cierre del periodo el Convenio No. 018 de 2017 - SENA Majagual presenta un avance en la ejecución presupuestal de recursos de FONDO, Fecha de corte 31 de mayo de 2020, último extracto de subcuenta FA, del patrimonio Autónomo del proyecto, saldo: \$3,693,630,409.36, con lo cual, el ejecutado sería \$4,306,369,590.64, por ende, el porcentaje de ejecución del 53.83%, la cual, el sistema aproxima en 54%. El porcentaje actual del proyecto en PSA es del 49.17%.</p> <p>Es importante mencionar que la ejecución de las obras e interventoría de la fase I del convenio, han sido finalizadas por vencimiento de plazo, sin ser concluidas de manera satisfactoria (40.9%), en la actualidad, la ANIM se encuentra adelantando el procedimiento de presunto incumplimiento del contratista de obra. Por lo anterior, la ejecución física, se encuentra igual a la vigencia anterior y se mantendrá así, hasta que sea adelantado el procedimiento mencionado.</p>
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

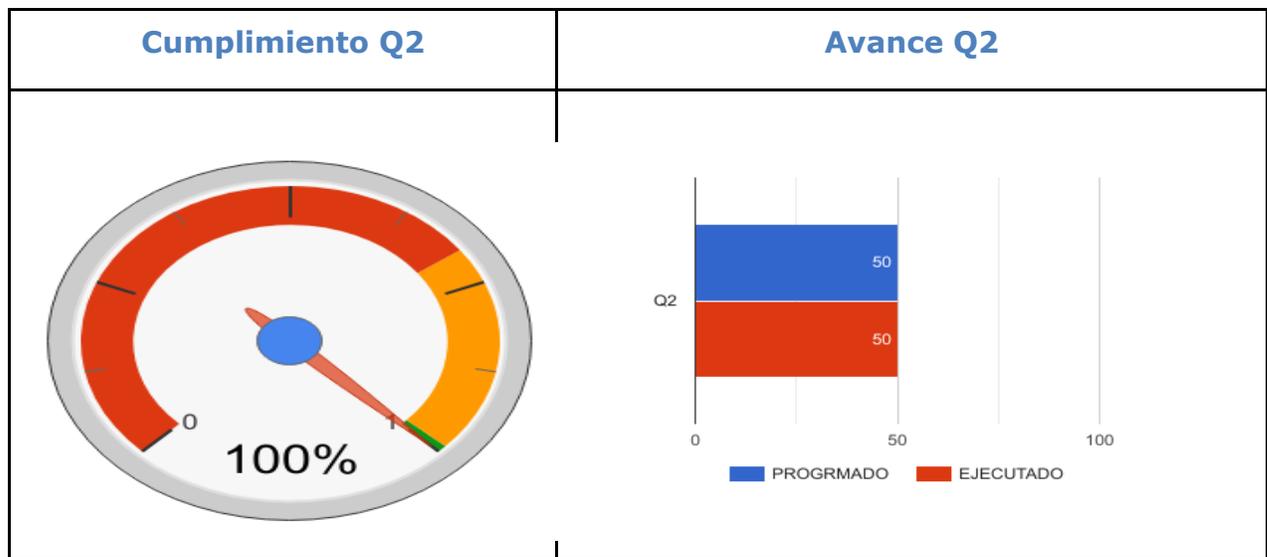

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA09)_Km de Jarillón, reforzado	#1	3.91	0	0	0	3.91	1.35
AEA10_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón	(AEA10)_Soluciones de vivienda, contratadas	#1	400	0	0	0	400	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

de Cali (INDICADOR PEI)								
AEA11_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA11)_Soluciones de vivienda, suministradas	#1	600	0	0	0	600	52
AEA12_Contratar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica	(AEA12)_Obras infraestructura estratégica, contratadas	#1	0	0	0	0	0	0
AEA13_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA13)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	#1	2	0	0	0	2	0

Bitácora de Seguimiento

(AEA09)_Km de Jarillón, reforzado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	<p>- Tramo II: Para las obras de reforzamiento del tramo II, se firmó el contrato de obra No. 2017-C-0160, de igual forma se firmó el contrato No. 2017-C-0199 para desarrollar la interventoría de la obra.</p> <p>Al corte del mes de marzo 2020, esta obra presenta un avance de reforzamiento del Jarillón de 0,2646 Km, soportado en el informe mensual de interventoría No.31 del periodo 21 de febrero al 20 de marzo de 2020.</p> <p>- Tramo III:</p>

		<p>Para las obras de reforzamiento del tramo III, se firmó el contrato de obra No. 0589-2017 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y Unión Temporal Protección Río Cauca, de igual forma se firmó el contrato No. 2017-C-304 entre el Fondo Adaptación y la firma Álvaro García Parra para desarrollar la interventoría de la obra. Al corte del mes de marzo 2020, esta obra presenta un avance de 0,2372 Km, soportado en el informe mensual de interventoría No.26 del periodo 21 de febrero al 20 de marzo de 2020.</p> <p>- Tramo IV</p> <p>Para las obras de reforzamiento del tramo IV, se firmó el contrato de obra No. 0572-2018 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y el Consorcio Ecoing, de igual forma se firmó el contrato No. 0700-2018 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y la firma Consorcio Interdiques para desarrollar la interventoría de la obra. Al corte del mes de febrero 2020, esta obra presenta un avance de 0,252 Km, soportado en el informe mensual de interventoría No.12 del periodo 21 de enero al 20 de febrero de 2020.</p> <p>- Sub tramos</p> <p>Para las obras de reforzamiento de subtramos, se firmó el contrato de obra No. 0663-2017 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y el Consorcio Obras Ambientales, de igual forma se firmó el contrato No. FA-CD-I-F-124-2018 entre el Fondo Adaptación y la firma Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S. para desarrollar la interventoría de la obra. Al corte del mes de febrero, esta obra presenta un avance de 0,23924 Km, soportado en el informe mensual de interventoría No.24 del periodo el 21 de enero y el 20 de febrero de 2020.</p>
	Junio	- Tramo IV: Conforme a las metas establecidas para

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>el año 2020 esta obra al corte del mes de junio 2020, presenta un avance de reforzamiento del Jarillón de 0,614 Km, soportado en el informe mensual de interventoría No.14 del periodo del 21 de marzo al 20 mayo de 2020. Es importante precisar que de esta obra se registró un avance de reforzamiento al corte del año 2019 de 0,289 Km para un total acumulado de 0,903 Km. De igual forma, se precisa que esta obra se realiza con recursos del Fondo Adaptación y de la CVC siendo esta último la entidad contratante.</p>
--	--	--

(AEA10)_Soluciones de vivienda, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(AEA11)_Soluciones de vivienda, suministradas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	El PROYECTO HABITACIONAL RIO CAUCA II, está asociado al contrato de promesa de compraventa No. 003 del 2018 derivado del contrato 181-2013 (entre COMFANDI y el Fondo Adaptación), y

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020


		<p>Número de contrato Fondo Adaptación 2013-C-0181-18-J0411 firmado entre el Fondo Adaptación y la Constructora Consorcio Latco S.A-A2, el 18 de julio de 2018.</p> <p>Conforme a las metas de entrega establecidas para el año 2020 este proyecto al corte del mes de junio 2020, efectuó la entrega de 48 apartamentos, soportado en las actas de entrega debidamente firmadas por los beneficiarios al Plan Jarillón de Cali y la constructora. Es importante precisar que de esta obra se registró un avance de entregas al corte del año 2019 de 220 VIP para un total acumulado 268 VIP; quedando pendiente de entrega 132 VIP. De igual forma, se precisa que este proyecto se realiza con recursos 100% del Fondo Adaptación.</p> <p>CARTA CHEQUE, el avance reportado corresponde al convenio derivado No. 016-2017 firmado entre el Municipio de Cali y el Fondo Adaptación el 9 de noviembre de 2017.</p> <p>Al corte del mes de junio de 2020, se han hecho efectivas (pagadas) cuatro compensaciones económicas a título de subsidio a diferentes beneficiarios del Plan Jarillón de Cali, soportadas en las promesas de compraventa y comprobantes de pago de cada una de las ellas.</p>
--	--	--

(AEA13)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Junio

Sin registro de avance en el indicador

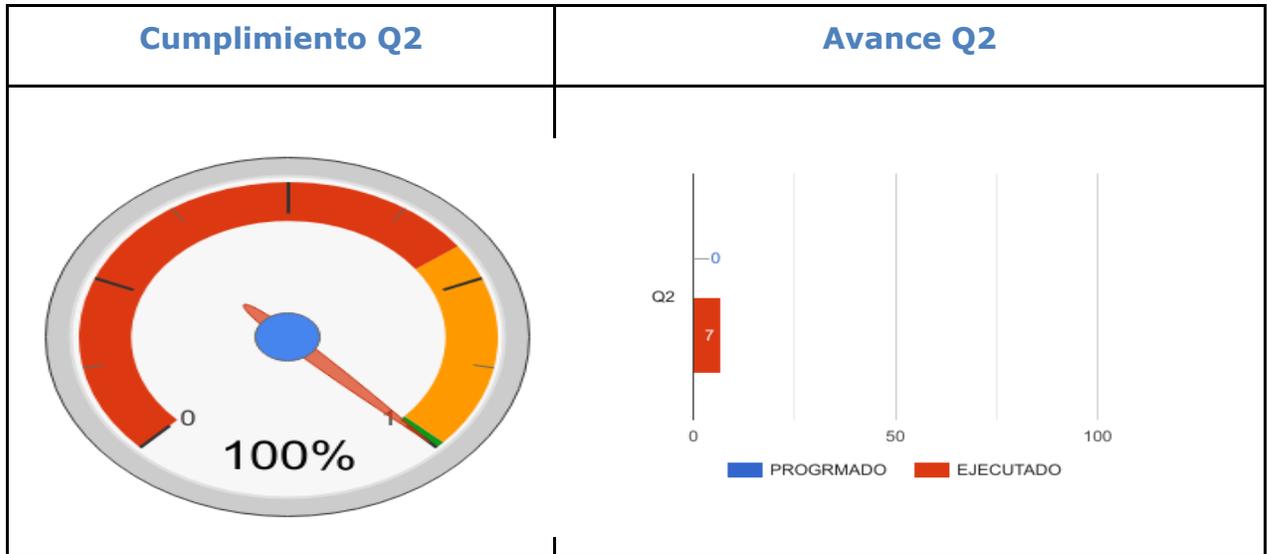

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE



Indicador

OE

Meta

Programación Trimestral

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)			2020	Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	AVANCE META (SEMÁFORO)
AEA14_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA14)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [2 pte veh+1 obra estab]	#1	3	0	0	0	3	0


Bitácora de Seguimiento

(AEA14)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [2 pte veh+1 obra estab]	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	<p>EL contrato inició el año suspendido, el Fondo reiterativamente requirió su reinicio, el cual se llevó a cabo el 24 de febrero de 2020, sin evidenciarse avance.</p> <p>El contrato tenía como fecha de terminación el 24/02/2020, sin embargo dada la emergencia sanitaria generada por el COVID - 19, la Gobernación de Santander de mutuo acuerdo con su contratista Consorcio Rio Fonce, suspendieron el contrato hasta el 11 de julio de 2020.</p> <p>Las obras presentan los siguientes porcentajes de ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabilización Represa La Laja - Obras Civiles - Municipio de Pinchote: 65% • Construcción Puente Hospital - Municipio de Onzaga: 62%

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

- Construcción Puente Vehicular -Municipio de San Joaquín: 88%

El Fondo Adaptación ha requerido el pronto reinicio de las obras considerando que el artículo 3 del Decreto 531 del 08 de abril de 2020 estableció algunas excepciones y permitió la circulación de algunas personas, entre otras, en las siguientes actividades: "(...) 18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas (...)", así mismo ha requerido a la Gobernación de Santander la presentación de un plan de cumplimiento del objeto del Convenio No. 061 de 2013 que le permita entregar las tres obras pendientes de ejecución correspondientes al Contrato No. 3553 de 2015.

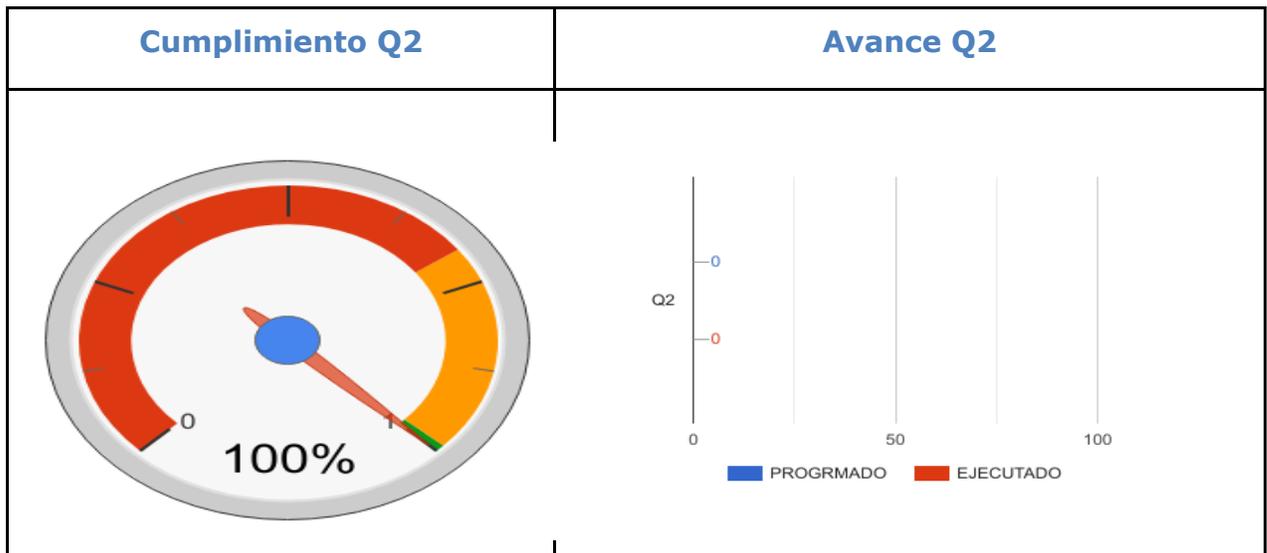

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: GRAMALOTE



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA15_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento I	(AEA15)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	#1	49	0	0	0	49	0
AEA16_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de	(AEA16)_Porcentaje de Avance	#1	43	0	0	0	43	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Equipamiento II	Proyectos de Infraestructura de Equipamientos							
AEA17_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA17)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	#1	153	0	0	153	0	9
AEA18_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA18)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	#1	192	0	0	0	192	20

Bitácora de Seguimiento

(AEA15)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	Enero	La meta correspondiente a este indicador es del 49% de avance en el Q4 por lo tanto en este indicador no se reporta avance.
	Febrero	El pasado 17 de febrero se firmó el contrato con el consorcio WA Gramalote 2020 para la construcción de los equipamientos Escenario Deportivo y Casa del Adulto Mayor. El cumplimiento de este indicador está previsto para el Q4 donde se debe avanzar hasta el 49% de ejecución.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador.
	Abril	El pasado 20 de abril se firmó el acta de inicio del grupo I de la construcción de los equipamientos correspondiente al Escenario Deportivo y la Casa del Adulto Mayor del municipio de Gramalote, con esta firma se inicia formalmente las etapas de preliminares de obra y preconstrucción.
	Mayo	El Contratista entregó la revisión preliminar de los estudios y diseños, realizó la implantación topográfica de los dos equipamientos y se realizaron modificaciones al diseño arquitectónico. Así mismo la Interventoría ha generado los correspondientes conceptos de los distintos

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		componentes por lo cual, el Contratista se encuentra realizando los ajustes, modificaciones, complementaciones y actualizaciones correspondientes. Avance del 38% de la etapa de pre construcción. En comité del 29 de mayo el Contratista presentó la Casa del Adulto Mayor en 3D del diseño arquitectónico.
	Junio	El Contratista se encuentra en la ejecución de la etapa de Preconstrucción y Preliminares de obra, la cual dura 3 meses. Al 30 de junio, el avance que presenta dicha etapa se encuentra en un avance programado y ejecutado del 75.93%, sin embargo, se evidencia que se podrá presentar un atraso por la demora en la entrega del estudio de suelos, siendo esta la ruta crítica del equipamiento 2.

Bitácora de Seguimiento

(AEA16)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	Enero	Se firmó el contrato con el contratista para la construcción de estos equipamientos grupo II el 31 de diciembre de 2019 (Casa de la Cultura y Casa del Campesino). No se registran avances cuantitativos debido a que la meta de avance se encuentra en el Q4 y es del 43%.
	Febrero	La meta para este indicador es de 43% y se cumple en el Q4, en este mes de febrero no se presentaron avances en este indicador.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El pasado 20 de abril se firmó el acta de inicio del grupo I de la construcción de los equipamientos correspondiente al Escenario Deportivo y la Casa del Adulto Mayor del municipio de Gramalote, con esta firma se inicia formalmente las etapas de preliminares de obra y preconstrucción.
	Mayo	El Contratista presentó plan de modificación, ajustes, complementación y actualización de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		diseños, se cuenta con concepto de Interventoría por lo cual el Contratista se encuentra realizando los ajustes a los diseños en los distintos componentes (eléctrico, hidrosanitario, arquitectónico y geotécnico). Avance del 34% de la etapa de preconstrucción.
	Junio	<p>Este grupo está conformado por el Equipamiento número 3: Casa de la Cultura y Equipamiento número 4: Casa del Campesino.</p> <p>El Contratista se encuentra en la ejecución de la etapa de Preconstrucción y Preliminares de obra, la cual dura 3 meses, el avance ejecutado para este grupo de equipamientos es de 60,87% que incluye actividades como el cerramiento del predio y la movilización del personal a territorio que realizará las actas de vecindad, entre otros.</p>

Bitácora de Seguimiento

(AEA17)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	Enero	La meta programada para este indicador es de 153 viviendas terminadas, sin embargo en el mes de enero no se reportaron terminación de viviendas, debido a que en el marco del otro sí número 10 del contrato 165 de 2015 se definió que para el 2020 las terminaciones de vivienda se harían a partir de febrero con 9 viviendas.
	Febrero	En el mes de febrero se terminaron 9 viviendas de acuerdo con el otro sí número 10 del contrato 165 de 2015. La meta de terminación de viviendas se cumple en el Q3 (153).
	Marzo	De acuerdo con el otro sí número 10 al contrato 165 de 2015, no se definieron terminaciones para el mes de marzo por este motivo no se reportan terminaciones para el mes de marzo.
	Abril	Durante el mes de abril no se terminaron soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote, el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		contrato se encuentra suspendido y sujeto a la finalización del aislamiento preventivo o a las disposiciones que se definan en el Gobierno Nacional.
	Mayo	Debido a la pandemia que ha decretado la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el COVID-19 y conforme con lo decretado por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Gramalote, acordaron suspender las actividades de obra a partir del 21 de marzo de 2020. Las obras se reanudaron el pasado 26 de mayo de 2020, por este motivo no se terminaron soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote.
	Junio	Durante el mes de junio no se reportó ninguna terminación de vivienda, debido a la suspensión del contrato durante los meses de abril y mayo de 2020 por causa de la pandemia y la emergencia económica y sanitaria decretada por el gobierno nacional.


Bitácora de Seguimiento

(AEA18)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	Enero	En el mes de enero se reporta 1 entrega. La meta de este indicador es de 192 viviendas y se cierra en el Q4.
	Febrero	En febrero se reportó la entrega de 11 viviendas, para un total de 12 viviendas entregadas en el 2020. La meta de este indicador es de 192 viviendas y se cierra en el Q4.
	Marzo	Para el mes de marzo se entregaron 7 soluciones de vivienda para un total de 19 viviendas durante el 2020. Esto traduce un total acumulado para el macro proyecto de 815 que equivale a un 82% de avance, para la meta total de 988 viviendas a entregar en el marco del mencionado contrato.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Abril	Durante el mes de abril no se entregaron soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote, el contrato 2015-C-0165 se encuentra suspendido y sujeto a la finalización del aislamiento preventivo o a las disposiciones que se definan en el Gobierno Nacional.
	Mayo	Debido a la pandemia que ha decretado la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el COVID-19 y conforme con lo decretado por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Gramalote, acordaron suspender las actividades de obra a partir del 21 de marzo de 2020. Las obras se reanudaron el pasado 26 de mayo de 2020, por este motivo no se entregaron soluciones de vivienda en el municipio de Gramalote.
	Junio	Durante el mes de junio el contratista entregó una solución de vivienda en el nuevo casco urbano de Gramalote, en total durante el 2020 se han entregado un total de 20 viviendas, sin embargo frente a la meta de 192 soluciones de vivienda en el Q4 se presenta un rezago, principalmente por que fue necesaria la suspensión del contrato durante los meses de abril y mayo debido a la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria y económica decretada por el Gobierno Nacional.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

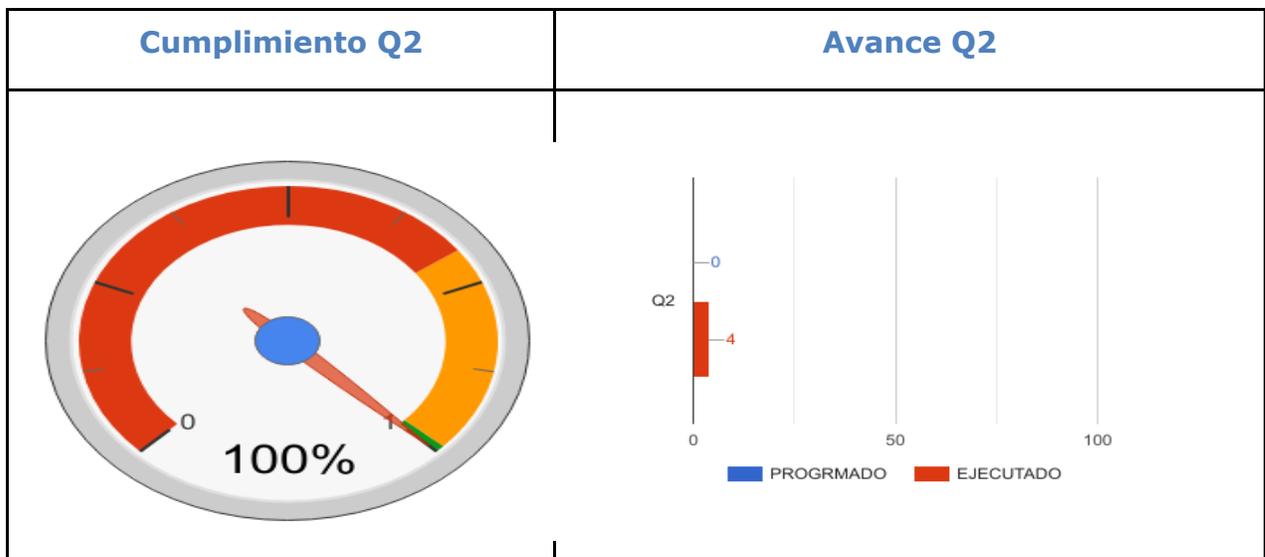

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: MEDIO AMBIENTE



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA19_Formular y/o	(AEA19)_POMCAS,	#3	3	0	0	1	2	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	entregados							
AEA20_Establecer el documento contractual entre el IDEAM y el Fondo Adaptación, en el cual se consolide el modelo de contratación de la Herramienta de integración tecnológica	(AEA20)_Documento contractual entre el IDEAM y el Fondo Adaptación, establecido	#3	1	0	0	0	1	0

Bitácora de Seguimiento

(AEA19)_POMCAS, entregados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Para dar cumplimiento a la meta de aprobar los productos de los POMCA, se ha avanzado con la aprobación de las fase de Prospectiva y Zonificación de los Ríos Canalete, Rio Las Córdoba y otros arroyos- NSS, y Río Medio y Bajo Sinú, y algunos avance parcial en los documentos de la fase de Prospectiva y Zonificación del Río Cali. Se ha trabajado en conjunto con la Corporación y la Interventoría para acelerar los procesos de aprobación de las fases pendientes de aprobación. Es de anotar que ha habido dificultades para avanzar en la protocolización de las consultas previas pendientes debido a la restricción de efectuar reuniones por el asilamiento preventivo


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

obligatorio por COVID-19.

Bitácora de Seguimiento

(AEA20)_Documento contractual entre el IDEAM y el Fondo Adaptación, establecido	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se estaba gestionando el ajuste del Convenio 004 de 2012 para que el IDEAM contratara la herramienta de información. En el Comité de Gestión y desempeño sostenido el 09 de junio de 2020 con participación de las directivas del Fondo, se analizó el Plan de Acción del Sector Medio Ambiente, donde se presentaron los posibles escenarios y análisis de riesgos para la contratación de la Herramienta de información e integración incluida en la postulación 175, de este análisis se concluyó que la alternativa a implementar es que sea el IDEAM como receptor y beneficiario del producto, contrate no solo la ejecución de la Herramienta sino también la respectiva Interventoría, por ser ellos quienes cuentan con el personal técnico calificado y con experiencia informática para este tipo contratación. Por lo anterior, se requirió reformular el indicador del plan de acción estableciendo como nueva meta la definir el modelo de contratación de la Herramienta de Información e Integración, desplazando el cumplimiento para el cuarto trimestre del 2020. Así las cosas, se trabajará en redefinir el convenio con el IDEAM que permita llevar a cabo este escenario.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

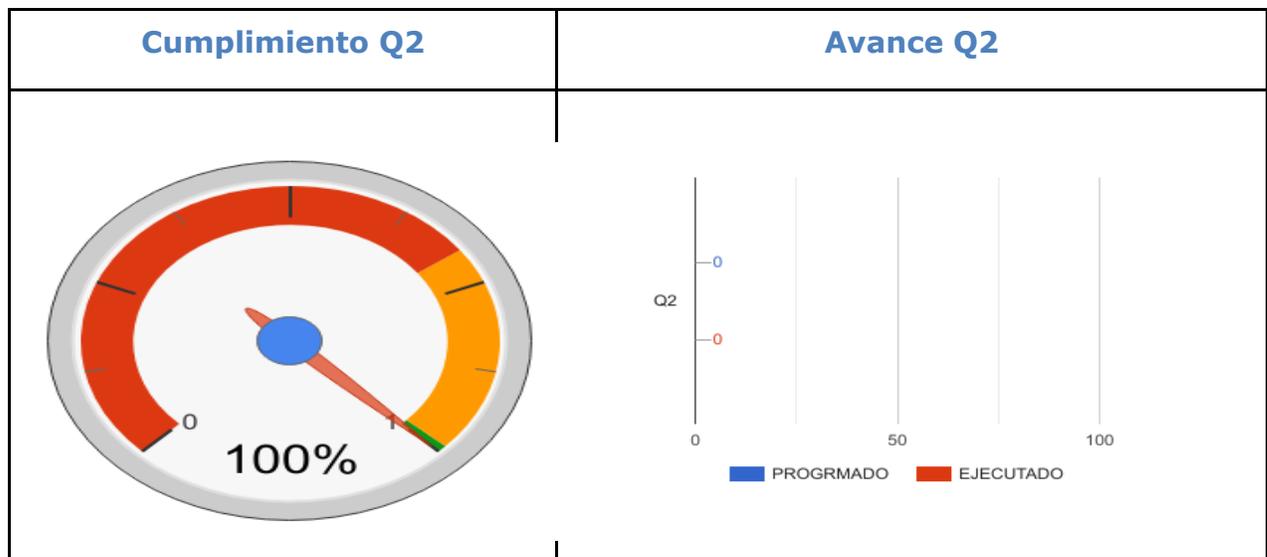

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA21_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA21)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	# 1	1	0	1	0	0	1

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA22_Ejecutar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA22)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, ejecutado	#1	1	0	0	0	1	0
AEA23_Terminar Proyectos Reactivar	(AEA23)_ Proyectos Reactivar, terminados	#1	0	0	0	0	0	0

Bitácora de Seguimiento


(AEA21)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	Enero	El proceso se ha gestionado con el radicado I-2019-009068 del 06 de diciembre de 2019 y está dentro de los plazos contractuales. Se estima suscripción del contrato en el mes de febrero de 2020.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Contratado.
	Abril	La meta se ejecutó en febrero mediante contrato FA-CD-I-S-066-2020
	Mayo	Contratado en Febrero
	Junio	Ya se registró avance cuantitativo en el mes de febrero de 2020

Bitácora de Seguimiento

(AEA22)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, ejecutado	Enero	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 31/01/2020 de acuerdo a lectura del PSA el cual reporta un avance planeado del 49.87% Vs. Un avance real del 49.99% con una desviación del 0%.
	Febrero	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 29/02/2020 de acuerdo a lectura del PSA el cual reporta un avance planeado del 56.63% Vs. Un avance real del

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		56.65% con una desviación del 0%.
	Marzo	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 25/03/2020 de acuerdo a lectura del sistema donde reporta un avance planeado del 62.52% Vs. Un avance real del 62.97% con una desviación del 0%.
	Abril	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 30/04/2020 de acuerdo a lectura del sistema donde reporta un avance planeado del 71.19% Vs. Un avance real del 71.19% con una desviación del 0%.
	Mayo	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 19/05/2020 de acuerdo a lectura del sistema, donde reporta un avance planeado del 79.41% Vs. Un avance real del 80.95% con una desviación positiva del 2%.
	Junio	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 24/06/2020 de acuerdo a lectura del sistema, donde reporta un avance planeado del 83.16% Vs. Un avance real del 80.95% con una desviación negativa del -2%.

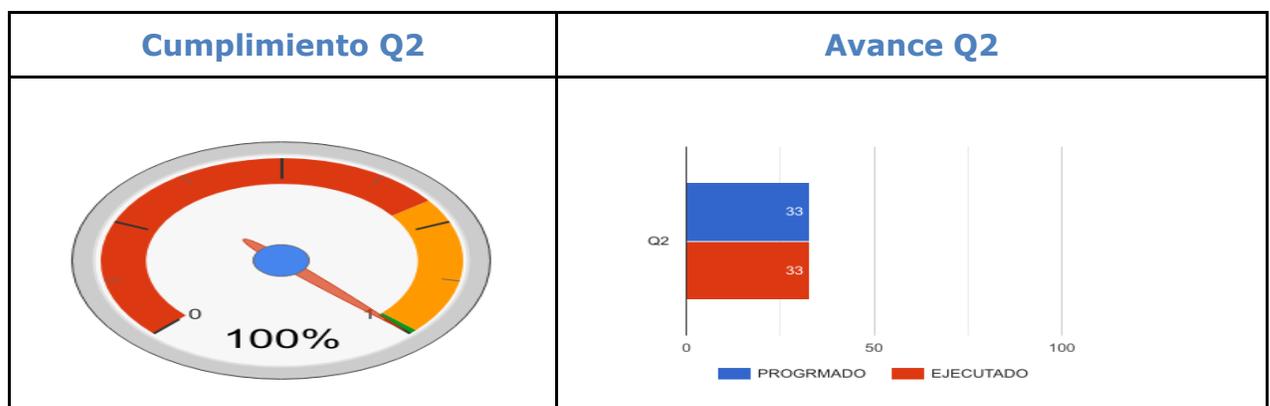


4.2. Área Subgerencia de Proyectos

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2020 en la Subgerencia de Proyectos. En estas se puede evidenciar el cumplimiento de la Subgerencia, respecto a las metas en el Q2 y el avance cuantitativo total, el cual se presenta de forma acumulativa con corte al cierre del Q2.

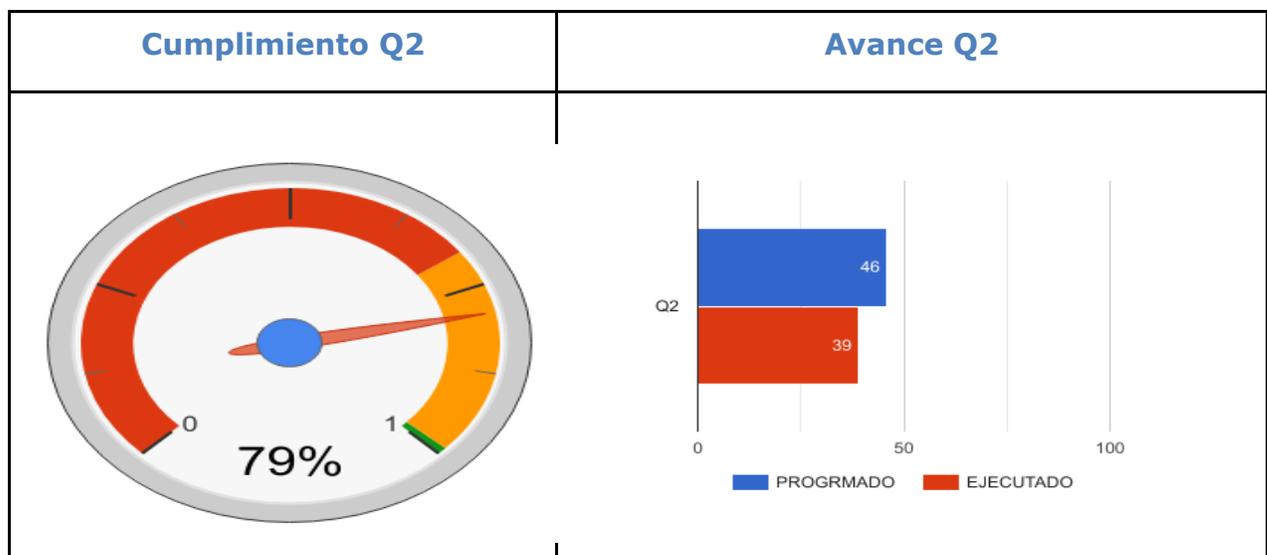

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEB01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	#3	1075	541	45	429	60	590
AEB02_Terminar soluciones de vivienda	(AEB02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	#4	2987	385	286	1303	1013	854
AEB03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEB03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	#4	3398	630	261	631	1876	1224

Bitácora de Seguimiento

(AEB01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	Enero	Se registra la contratación de 66 viviendas por parte de la estrategia de Nuevas Contrataciones.
	Febrero	Se hace el reporte consolidado de la meta contratadas en febrero/20, así: Nuevas contrataciones: 475 y operadores zonales: 4.
	Marzo	Se hace reporte consolidado de contratadas Marzo/20. Se tenía una meta planteada para nuevas contrataciones de 48 viviendas, de las cuales 3 en Cauca (Antioquia) fueron contratadas en febrero/20. Se está en proceso de contratación de las 45 viviendas en Caldas.
	Abril	No hubo avance y no se tenía metas planteadas para el mes de abril de 2020.
	Mayo	Se tenía programada la contratación de los proyectos de Dosquebradas (Risaralda), San Pablo (Bolívar) y Manatí (Atlántico), de los cuales ya fueron aprobados en comité Dosquebradas (Risaralda) y Manatí (Atlántico) y se encuentran para presentación a comité nuevamente los proyectos de San Pablo (Bolívar).
	Junio	Se reporta la ejecución de Meta Contratadas para el mes de Junio de 2020, incluyendo 45 viviendas de Nuevas Contrataciones.

Bitácora de Seguimiento

(AEB02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	Enero	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas terminadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Operadores Zonales: 38 viviendas distribuidas en los municipios de Carmen de Atrato (Chocó), Candelaria (Atlántico), Suarez (Cauca) y Guachené (Cauca). Nuevas Contrataciones: 18 viviendas distribuidas en los municipios de Ayapel San Benito y San Marcos bajo el contrato 279 de
---	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<p>2017.</p> <p>En total 56 viviendas fueron terminadas en enero de 2020.</p>
Febrero	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas terminadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas contrataciones: 17 viviendas distribuidas en el municipio de Espinal, Tolima • Operadores Zonales: 136 viviendas distribuidas en los municipios de Bagadó (Chocó), Nuquí (Chocó), Quibdo (Chocó), Plato (Magdalena), Curumaní (Cesar) y Calamar (Bolívar). <p>En total 153 viviendas fueron terminadas en febrero de 2020.</p>
Marzo	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas terminadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operadores Zonales: 22 viviendas distribuidas en los municipios de Calamar (Bolívar), Alto Baudó (Chocó), Medio San Juan (Chocó) y Uribia (La Guajira). • Directas: 71 viviendas distribuidas en los municipios de Ayapel San Benito y San Marcos bajo el contrato 279 de 2017 y en Sucre bajo el contrato 181 de 2017. • Nuevas Contrataciones: 83 viviendas distribuidas en los municipios de San Gil (Santander), Barrancabermeja (Santander) y Barranquilla (Atlántico). <p>En total 176 viviendas fueron terminadas en marzo de 2020.</p>
Abril	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas terminadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operadores Zonales: 76 viviendas distribuidas en los municipios de Guática (Risaralda), Pedraza (Magdalena), Chivata (Boyacá), Santa Rosa Viterbo (Boyacá), Corrales (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Choachí (Cundinamarca) y Carmen Darién (Chocó). • Directas: 158 viviendas en los departamentos de Sucre y Córdoba.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>En total 234 viviendas fueron terminadas en abril de 2020.</p>
	Mayo	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas terminadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none">• Directas: 40 viviendas de la estrategia Grupo 2 en los departamentos de Sucre y Córdoba. <p>Por otra parte, en este periodo se tenía inicialmente una meta planteada de 217 viviendas terminadas correspondientes a Operadores Zonales que no se pudieron reportar cumplidas debido a la contingencia por la emergencia COVID-19 que conminó a la suspensión de varios frentes de obra. Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló un replanteamiento de la meta que fue aprobado por el Consejo Directivo.</p>
	Junio	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas terminadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nuevas Contrataciones: 102 viviendas distribuidas en los municipios de Cauca (Antioquia) y Manatí (Atlántico).• Operadores Zonales: 10 viviendas distribuidas en los municipios de Chiscas (Boyacá), Chivatá y Toca (Boyacá) y Viotá (Cundinamarca).• Directas: 83 viviendas en el departamento de Sucre. <p>En total 195 viviendas fueron terminadas en junio de 2020.</p> <p>Por otra parte, no se logró terminar el número de viviendas planeado inicialmente debido a los retrasos en la ejecución de las obras, ocasionados por la emergencia COVID-19 y las controversias contractuales que actualmente cursan contra Comfenalco Valle y Comfenalco Santander. Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló un replanteamiento de la meta que fue aprobado por el Consejo Directivo.</p>


Bitácora de Seguimiento

(AEB03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	Enero	En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas entregadas del sector así: <ul style="list-style-type: none"> • Operadores Zonales: 3 viviendas distribuidas en los municipios de Cimitarra (Santander) y Carmen de Atrato (Chocó). • Directas: 34 viviendas distribuidas en los municipios de Ayapel San Benito y San Marcos (Sucre y Córdoba) y San Benito Abad (Sucre). En total 37 viviendas fueron entregadas en enero de 2020.
	Febrero	En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas entregadas del sector así: <ul style="list-style-type: none"> • Operadores Zonales: 244 viviendas distribuidas en los municipios de Bagadó (Chocó), Nuquí (Chocó), Quibdo (Chocó), Plato (Magdalena), Curumaní (Cesar), Calamar (Bolívar), Hatillo de Loba (Bolívar), El Banco (Magdalena) y Santa Ana (Magdalena). • Directas: 1 vivienda en el municipio de San Benito Abad (Sucre). • Nuevas contrataciones: 17 viviendas en el municipio de Espinal (Tolima). En total 262 viviendas fueron entregadas en febrero de 2020.
	Marzo	En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas entregadas del sector así: <ul style="list-style-type: none"> • Operadores Zonales: 171 viviendas distribuidas en los municipios de Calamar (Bolívar), Alta Baudó (Chocó), Medio San Juan (Chocó), Uribia (La Guajira), Candelaria (Atlántico), Suarez (Cauca), Hatillo de Loba (Bolívar), Campo de la Cruz (Atlántico), Sabanalarga (Atlántico) y la Unión (Nariño). • Directas: 77 viviendas distribuidas en los municipios de Sucre (Sucre) y Buesaco (Nariño). • Nuevas Contrataciones: 83 viviendas distribuidas en los municipios San Gil (Santander), Barrancabermeja (Santander) y Barranquilla (Atlántico).

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<p>En total 331 viviendas fueron entregadas en marzo de 2020.</p>
Abril	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas entregadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operadores Zonales: 52 viviendas distribuidas en los municipios de Pedraza (Magdalena), Chivata (Boyacá), Santa Rosa Viterbo (Boyacá), Corrales (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Choachí (Cundinamarca), Guachené (Cauca), La Unión (Nariño) y Chima (Santander). • Directas: 73 viviendas en los departamentos de Sucre y Córdoba. <p>En total 125 viviendas fueron entregadas en abril de 2020.</p>
Mayo	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas entregadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directas: 122 viviendas distribuidas en los municipios y departamentos de Sucre y Córdoba y Ayapel San Benito San Marcos (Sucre y Córdoba) • Operadores Zonales: 14 viviendas en el municipio de Guática (Risaralda). <p>En total 136 viviendas fueron entregadas en mayo de 2020.</p> <p>Por otra parte, no se entregó la totalidad de viviendas inicialmente planeadas para el periodo, debido a la suspensión de los frentes de obra ocasionados por la contingencia del COVID-19. Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló un replanteamiento de la meta que fue aprobado por el Consejo Directivo.</p>
Junio	<p>En este periodo se reporta la ejecución consolidada de viviendas entregadas del sector así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas Contrataciones: 102 viviendas distribuidas en los municipios de Caucasia (Antioquia) y Manatí (Atlántico). • Directas: 90 viviendas en Sucre (Sucre). • Operadores Zonales: 141 viviendas distribuidas

		<p>en los municipios de Sativa Norte (Boyacá), Manatí (Atlántico), Chiscas (Boyacá), Chivatá y Toca (Boyacá), Viotá (Cundinamarca) y Cucutilla (Norte de Santander).</p> <p>En total 333 viviendas fueron entregadas en junio de 2020.</p> <p>No se logró entregar el número de viviendas planeado inicialmente debido a los retrasos en la ejecución de las obras, ocasionados por la emergencia COVID-19 y las controversias contractuales que actualmente cursan contra Comfenalco Valle. Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló un replanteamiento de la meta que fue aprobado por el Consejo Directivo.</p>
--	--	--

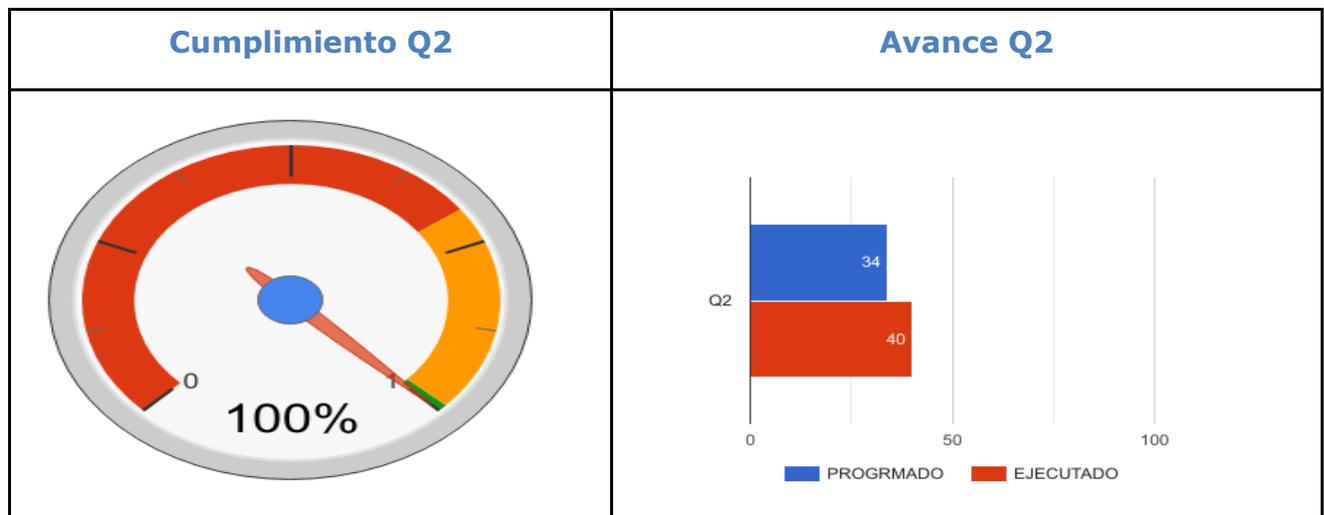

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades /Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB04_Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEB04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	#4	2	0	0	0	2	0
AEB05_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB05)_Sitios Críticos con Obras terminados	#4	7	5	0	0	2	6
AEB06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#4	7	2	5	0	0	7

Bitácora de Seguimiento

(AEB04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020


	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Para este mes no se tenían metas planeadas.
	Mayo	Para este mes no se tenían metas planeadas.
	Junio	No se tenían programadas metas para este periodo.

(AEB05)_Sitios Críticos con Obras terminados	Enero	Se firmó el acta de recibo del puente Hisgaura.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se firmó el acta de recibo de la interconexión vial Yatí-Bodega. La megaobra de aproximadamente 12 kilómetros, está compuesta por el puente de Santa Lucía que tiene un kilómetro de extensión y el puente Roncador, considerado uno de los más largos del país con 2,3 kilómetros de longitud. También hacen parte de este complejo vial, la carretera de Isla Grande (2,7 kilómetros), una vía para conectar el puente Roncador con el acceso al puerto de Bodega (2,9 kilómetros), y el mejoramiento de la vía actual entre Yatí y Santa Fe (3 kilómetros).
	Abril	Para este mes no se tenían metas planeadas.
	Mayo	Para este mes no se tenían metas planeadas.
	Junio	No se tenían programadas metas para este período.

(AEB06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	Enero	Se firmó el acta de entrega del puente Hisgaura.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Marzo	Se firmó acta de entrega proyecto Interconexión vial Yatí-Bodega. La megaobra de aproximadamente 12 kilómetros, está compuesta por el puente de Santa Lucía que tiene un kilómetro de extensión y el puente Roncador, considerado uno de los más largos del país con 2,3 kilómetros de longitud. También hacen parte de este complejo vial, la carretera de Isla Grande (2,7 kilómetros), una vía para conectar el puente Roncador con el acceso al puerto de Bodega (2,9 kilómetros), y el mejoramiento de la vía actual entre Yati y Santa Fe (3 kilómetros).
	Abril	Para este mes no se tenían metas planeadas.
	Mayo	Se realizó la entrega de un sitio crítico del proyecto vías de gramalote.
	Junio	La meta planeada para este período se cumplió antes de lo programado y se reportó en la herramienta durante el periodo de ejecución marzo.

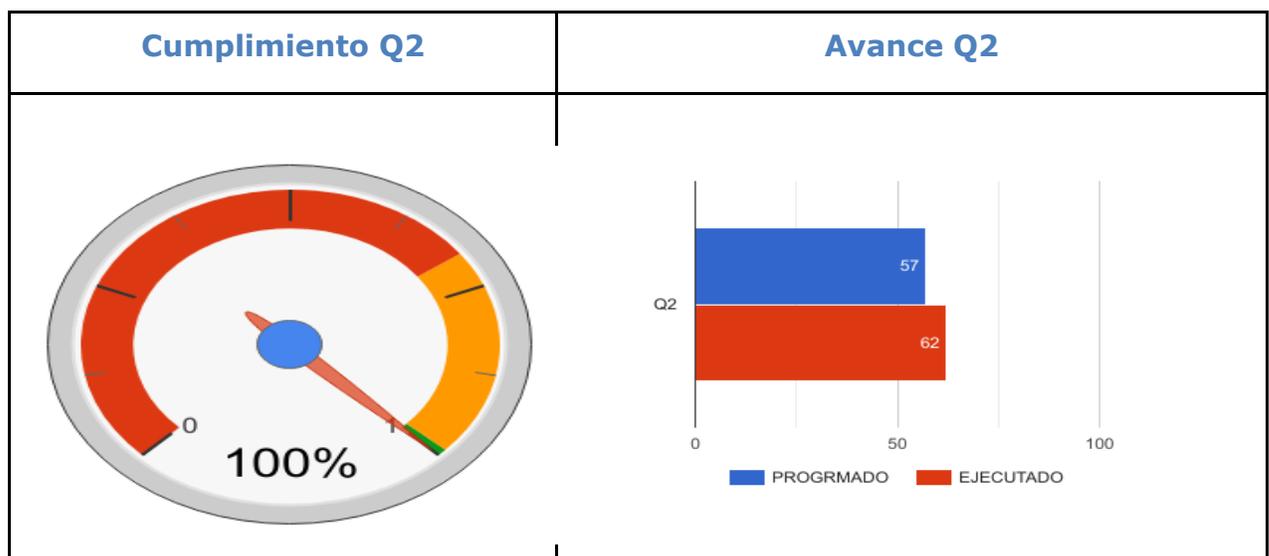

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB07_Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB07)_Sedes educativas con obras, contratadas	#2	0	0	0	0	0	0
AEB08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB08)_Sedes Educativas, terminadas	#2	31	7	4	14	6	8
AEB09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	#2	23	0	6	6	11	6

Bitácora de Seguimiento

(AEB08)_Sedes Educativas, terminadas	Enero	Para el mes de enero 2020 se cumplió con la meta propuesta y se terminó la ejecución de la sede educativa de ERM MARÍA AUXILIADORA - IE. DE LA
--------------------------------------	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	VICTORIA, en el Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, así como la sede educativa ER INDÍGENA OLGA MELBA (UNIÓN BALSALITO) - IE. COLEGIO INDÍGENA LA UNIÓN PICHIMA QUEBRADA en el Municipio de El Litoral del San Juan - Choco.
Febrero	Para el mes de febrero 2020 se cumplió con la meta propuesta de sedes educativas terminadas del sector educación y se terminó la sede ER INDÍGENA SANTA ROSA (PANGARA) - IE INDÍGENA GERARDO CHIRIPUA VALENCIA, en el Municipio de El Litoral del San Juan - Choco.
Marzo	Se cumplió con la meta de terminaciones propuestas para el sector de educación y en el mes de marzo se terminan las siguientes sedes: IE TECNICO AGROPECUARIA DE LA RINCONADA (2 sedes), en el Municipio de Mompós - Bolívar; SEDE CE MÉXICO - IE PLACIDO RETAMOZA, en el Municipio de San Jacinto del Cauca - Bolívar y SEDE PLATANAL -TÉCNICA AGROPECUARIA ELVIRA LÓPEZ DE FACIOLINCE, en el Municipio de San Martín de Loba - Bolívar.
Abril	La meta del indicador de sedes educativas a terminar del sector, para el mes de abril correspondía a 4 sedes distribuidas en los Departamentos de Bolívar y Córdoba, cuyas causales de no terminación obedecen a las siguientes: 1. SEDE CE LA CHAPETONA- El Peñón/Bolívar; 2. IE DE ARMENIA PRINCIPAL(2 sedes) -Pinillos/Bolívar, estos proyectos fueron contratados directamente por la Gobernación de Bolívar, actualmente se encuentran en proceso de presunto incumplimiento por parte de la Gobernación, dentro del cual, como compromiso, la interventoría debe validar y certificar la terminación de estas obras, visita programada para la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, no obstante y a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, este desplazamiento al sitio no ha podido ser efectuado y hasta tanto no

		<p>se supere tal situación garantizando las condiciones adecuadas de bioseguridad y movilidad que permitan el ingreso a la zona, no se podrá realizar este compromiso; 3. SEDE PRINCIPAL ESCUELA NUEVA LAS MUJERES - Moñitos/Córdoba, cuyo plazo contractual ya finalizó y el contratista se encuentra subsanando observaciones, así mismo, en trámite de la instalación de la energización definitiva.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>Para el mes de mayo se tenía proyectada la terminación de los proyectos de: a) CE DE REGENCIA – Montecristo / Bolívar, el cual se encuentra con plazo contractual vencido y en proceso de terminación de la obra por parte del Contratista, que es derivado del convenio 001 de 2016 suscrito con la Gobernación de Bolívar y que con ocasión a la radicación de solicitud de presunto incumplimiento por parte de la interventoría a la Gobernación, la Entidad territorial se encuentra consolidando la documentación a la que hubiere lugar con el fin de soportar dicho proceso administrativo, por lo cual no ha sido posible la terminación de esta SEDE, y b) la SEDE PRINCIPAL - IE SAN JOSE DEL PANTANO – Puerto escondido / Córdoba, cuyo proyecto se encuentra en etapa de subsanación de observaciones, no obstante se ha dificultado el ingreso del contratista a la zona a raíz de inconvenientes de orden público, así como la restricción de ingreso implementada por la Entidad Territorial como medida para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.</p> <p>Por Otra parte, y si bien es cierto el proyecto de San Zenón - EUM MARIA AUXILIADORA, del departamento de Magdalena estaba proyectado en el plan de acción del sector, con terminación en el mes de julio de 2020, debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector, se logró adelantar su terminación para el mes de mayo</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		de 2020.
	Junio	Para el mes de junio, se tenía prevista la terminación de cuatro (4) proyectos, así: SEDE PRINCIPAL SAN JERONIMO / Ayapel; SEDE PRINCIPAL ESCUELA NUEVA LAS MUJERES/ Moñitos, SEDE PRINCIPAL - IE SAN JOSE DEL PANTANO/ Puerto Escondido; SEDE PRINCIPAL LOS NIDOS - SEDE CE MARCO FIDEL SUAREZ / Ayapel , no obstante, y pese a la gestión adelantada por la interventoría, así como por la supervisión los proyectos, estos terminaron su plazo contractual y se encuentran en proceso de terminación de obras sin suscripción de acta de terminación a la fecha. Actualmente la interventoría y la Entidad han venido reiterando a la Gobernación de Córdoba, quien actúa en calidad de contratante, el inicio del proceso de posible incumplimiento, todo lo anterior con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.


(AEB09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Para el mes de marzo se tenía como meta del indicador de entregas de sedes educativas, la SEDE ERM MARÍA AUXILIADORA - IE DE LA VICTORIA, en el Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, no obstante y si bien es cierto la sede educativa ya fue entregada, se encuentra en proceso de suscripción la respectiva acta por parte de las Entidad Territorial, y como consecuencia de la prioridad dada a la emergencia sanitaria actual que afronta el país y la atención urgente requerida en Territorios, no ha sido posible la suscripción de dicha acta por parte de los funcionarios correspondientes.
	Abril	Con respecto a la meta de sedes por entregar del

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>sector educación para el mes de abril, es preciso indicar que de 4 sedes estimadas para la entrega, se cumplió con la entrega de las siguientes sedes del Litoral del San Juan – Choco: ER INDIGENA OLGA MELBA, SEDE ER LA MILAGROSA y ER INDIGENA SANTA ROSA, de las cuales dentro de la meta proyectada para abril 2020 no se encontraba la ER INDIGENA SANTA ROSA, no obstante esta sedes si se proyectó para el mes de mayo de 2020. Con respecto a las sedes que no se lograron entregar, es preciso indicar que el equipo de trabajo adelantó las acciones correspondientes con el fin de entregar la sede que no se logró este mes, no obstante la emergencia sanitaria COVID -19 ha retrasado los procedimientos de entrega de sedes debido a los bloqueos y restricción de ingreso a las zonas afectadas por tal situación.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>De conformidad a la meta de entregas planteada por el sector para el mes de mayo se tenían los proyectos de; a) IE TECNICO AGROPECUARIA DE LA RINCONADA – Mompós / Bolívar, proyecto que se logró entregar y cuya acta se anexa al presente registro; b) SEDE PLATANAL – San Martín de loba /Bolívar, para el cual el acta de entrega se encuentra en trámite de firmas por parte de la Entidad Territorial, y c) ER INDIGENA SANTA ROSA (PANGARA) – El Litoral de San Juan /Chocó, el cual fue entregado e hizo parte del cumplimiento de meta de abril de 2020. Por Otra parte, y si bien es cierto el proyecto de San Jacinto del Cauca - SEDE CE MÉXICO, del departamento de Bolívar estaba proyectado en el plan de acción del sector, con entrega en el mes de junio de 2020, debido a la gestión adelantada por el equipo de trabajo del sector, se logró adelantar su entrega para el mes de mayo de 2020.</p>
	<p>Junio</p>	<p>Al respecto de la meta de entregas, es preciso indicar que, de conformidad a última modificación del plan de acción del sector, para el mes de junio se tenía proyectada la entrega de las sedes de</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

RINCONADA – Mompós, y CE MÉXICO – San Jacinto del Cauca, del departamento de Bolívar, sedes que, en atención a la gestión adelantada por las partes, se lograron adelantar y entregar en el mes de mayo de 2020.

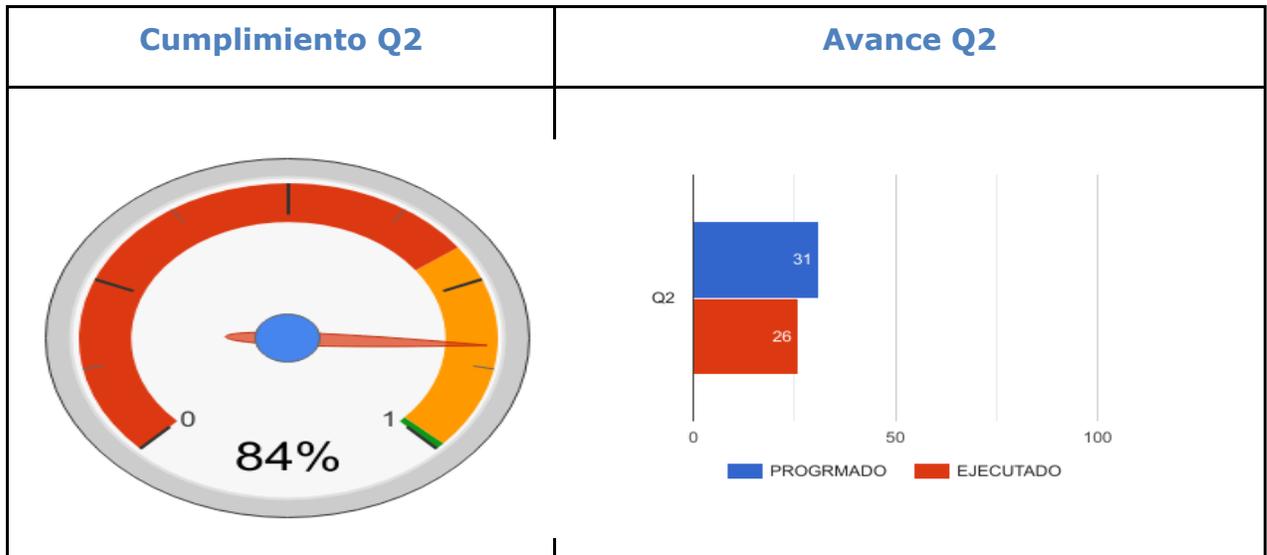

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS Portafolio/Programa/Proyecto: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB10_Contratar obras infraestructura de acue-ducto	(AEB10)_Obras de Infraestructura de acueducto, contratadas	#2	2	0	0	0	2	0
AEB11_Terminar obras infraestructura de acue-ducto	(AEB11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	#2	7	4	2	0	1	6
AEB12_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	7	0	0	3	4	1
AEB13_Contratar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado,	#2	1	0	1	0	0	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	contratadas							
AEB14_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	#2	5	3	2	0	0	3
AEB15_Entregar infraestructura de alcantari-llado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB15)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	7	0	3	3	1	2

Bitácora de Seguimiento

(AEB10)_Obras de Infraestructura de acueducto, con-tratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(AEB11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	De los 4 productos programados para el primer trimestre del plan de acción 2020, se avanzó en la terminación de la ejecución de 1 proyecto de acueducto en el municipio de Cúcuta, y no se logró terminar la ejecución de 3 productos de acueducto en el municipio de Ríosucio - Chocó por la necesidad de suspender las actividades pendientes de pruebas

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		hidráulicas como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional - Covid19 realizada a partir del 25 de marzo 2020. Se reprograma terminación de los 3 productos de Ríosucio para el segundo trimestre.
	Abril	Actas terminación y recibo final contrato 0042_ acueducto Plato-Magdalena
	Mayo	Terminación de 3 acueductos en Ríosucio Chocó
	Junio	Terminación acueducto Sevilla

(AEB12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Entrega 1 acueducto de Plato
	Junio	Sin registro de avance en el indicador


(AEB13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEB14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, termina-das	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	De los 3 productos de Alcantarillado programados para el primer Trimestre de Plan de Acción 2020, se logró la ejecución y terminación de 3 proyectos de Alcantarillado en el municipio de La Dorada - Caldas, Astrea - Cesar y Cúcuta (La Cañada).
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(AEB15)_Obras de alcantarillado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se avanzó con la entrega de Infraestructura de 1 proyecto de Alcantarillado en La Dorada - Caldas.
	Abril	Se tenía prevista la entrega en septiembre, pero se entregó en abril 2020
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

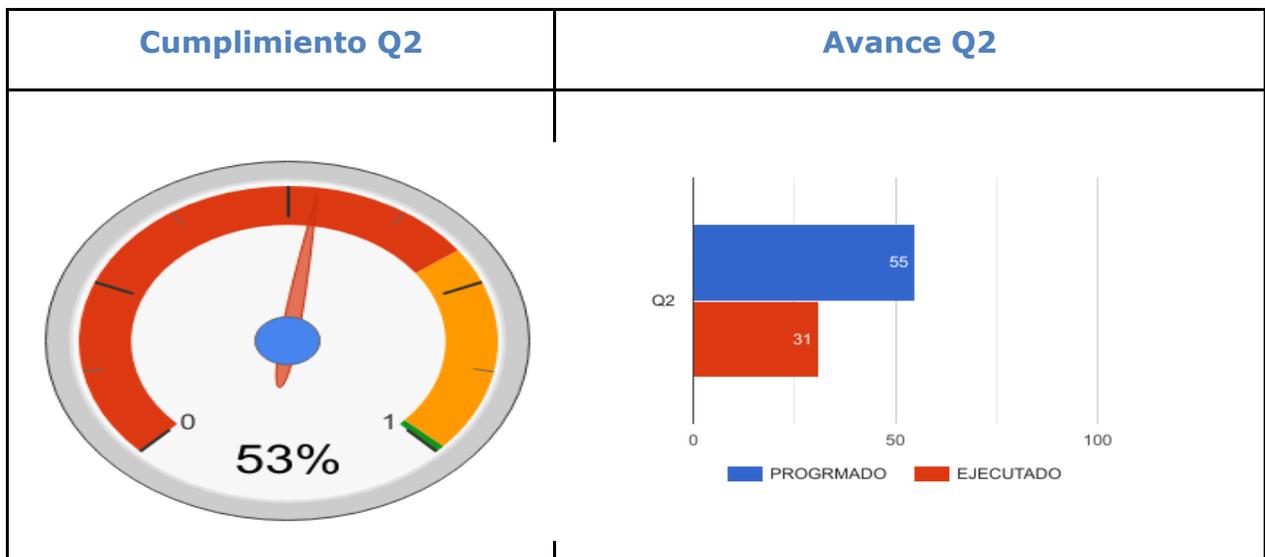

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB16_Contratar obras de infraestructura de IPS	(AEB16)_Obras de infraestructura de	#2	3	0	2	0	1	2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	IPS contratadas (o in-terventoría proyectos descen-tralizados)							
AEB17_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB17)_Obras de infraestruc-tura de IPS terminadas	#2	4	0	2	1	1	2
AEB18 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB18) Obras de infraestruc-tura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	#2	4	0	0	0	4	0


Bitácora de Seguimiento

(AEB16)_Obras de infraestruc-tura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descen-tralizados)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	En este periodo se contrató la IPS de Majagual
	Junio	En este periodo se contrató la IPS de Turbo

(AEB17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	En este periodo se terminaron dos IPS: San Cristóbal y Soplaviento.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Junio	Sin registro de avance en el indicador
(AEB18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

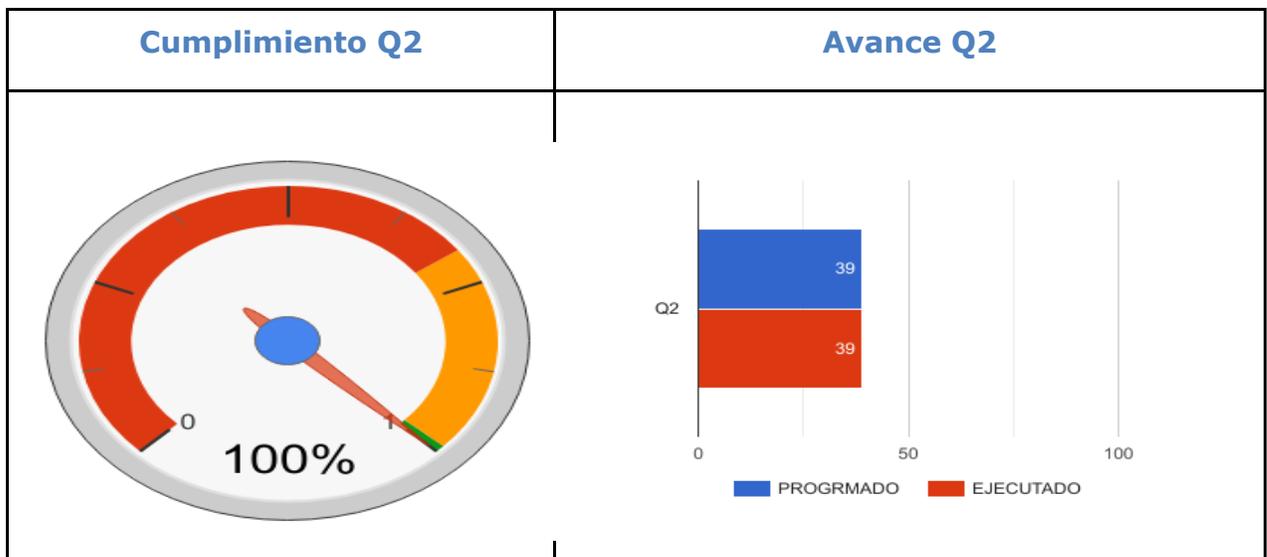


4.3. Área Subgerencia de Estructuración

En la Subgerencia de Estructuración, se gestionan las acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2020 en la Subgerencia de Estructuración. En estas se puede evidenciar el cumplimiento de la Subgerencia, respecto a las metas en el Q2 y el avance cuantitativo total, el cual se presenta de forma acumulativa con corte al cierre del Q2.

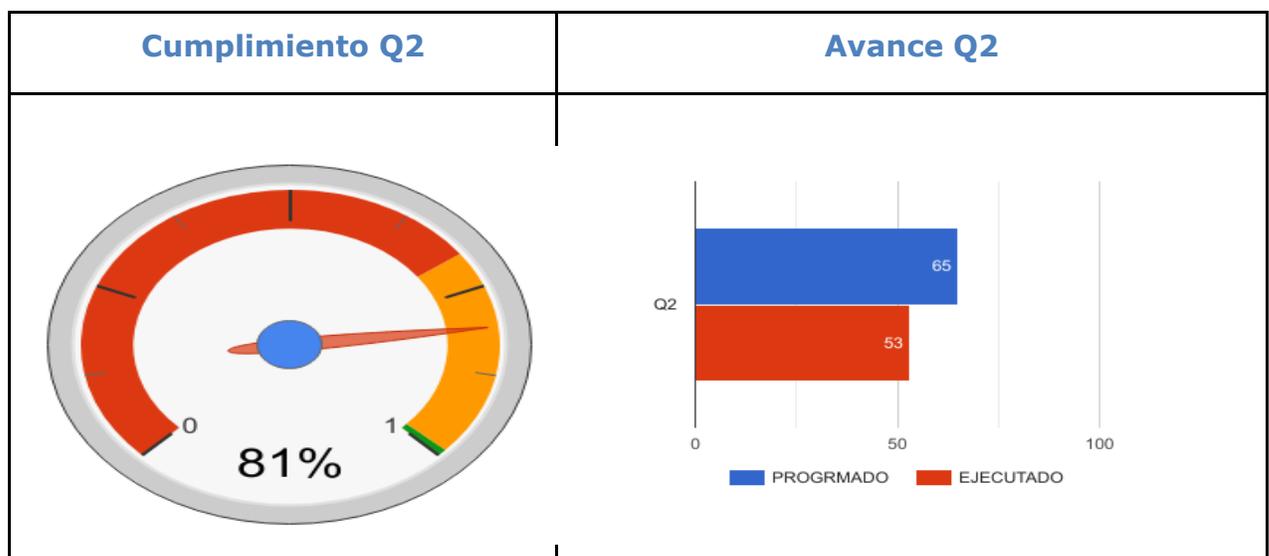

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Portafolio/Programa/Proyecto: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC01_Elaborar o actualizar estudios del sector y/o mercado	(AEC01)_Estudios de sector elaborados / Estudios de sector meta 2020	#2	5	1	2	1	1	3
AEC02_Estructurar el 100% de los estudios de mercado y/o sector de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	(AEC02)_Estudios de mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	#2	400	100	100	100	100	200
AEC03_Evaluación financiera y económica de las invitaciones abiertas y cerradas y las contrataciones directas.	(AEC03)_Procesos Evaluados Financieramente / Evaluaciones designadas por SG	#2	400	100	100	100	100	200
AEC04_Establecer políticas, lineamientos y metodología de identificación, selección,	(AEC04)_ Documentos de políticas, lineamientos y	#2	2	1	1	0	0	1

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

priorización y estructuración de nuevos proyectos	metodología para la recepción / identificación, selección, priorización estructuración de nuevos proyectos								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bitácora de Seguimiento

(AEC01)_ Estudios de sector elaborados / Estudios de sector meta 2020	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer Q, la Subgerencia de Estructuración elaboró los siguientes estudios de sector, como se detalla a continuación: 1. Estudio de sector para la interventoría de la construcción de la IPS del municipio de Turbo, 2. Estudio de sector para el proceso de prestación de servicios de la administración documental de la entidad, 3. Estudio de sector para la expedición de la tabla de honorarios de recursos de inversión de la entidad y el estudio de sector para la contratación de la plataforma Project Cloud
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Durante este periodo, la Subgerencia de estructuración realizó los siguientes estudios de sector: <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de sector para la Interventoría integral al reforzamiento estructural y terminación de las obras de construcción de la ESE centro de salud nuestra Señora del Carmen en el municipio de La Tola, Departamento de Nariño. • Estudio de sector para realizar diseño, desarrollo e implementación de la página web del Fondo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		Adaptación
--	--	------------

(AEC02)_Estudios de mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer Q, la Subgerencia de estructuración asesoró y realizó los respectivos estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos: 1.contratación del dictamen pericial para el proceso de Gramalote, Interventoría para la construcción la IPS del municipio de Turbo, Prestación de servicios de administración documental de la entidad, Realizar exámenes médicos de ingreso, periódico y demás de los funcionarios de la entidad, realizar el diseño, desarrollo e implementación del portal web del Fondo Adaptación y construir un patrimonio autónomo con los recursos para los recursos de inversión de la entidad, interventoría de las viviendas en el departamento de caldas y las compraventas de la nueva fase de los proyectos de Manatí, San Pablo y Dosquebradas.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se hace un ajuste al Q1, teniendo en cuenta que se cumplió con el 100% de lo pactado para esos 3 meses, en donde se evidenció que se estructuraron la totalidad de los estudios de mercados de acuerdo a las necesidades radicadas por las áreas técnicas en la Sugerencia de Estructuración.
	Junio	Durante este periodo, la Subgerencia de Estructuración asesoró y realizó los respectivos estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de avalúos comerciales para dos predios ubicados dentro del perímetro Urbano de Santa Lucía, Atlántico • Análisis financiero para la ejecución y entrega de viviendas en la modalidad de reubicación en los municipios de Málaga y Guaca en el departamento de Santander • Realizar diseño, desarrollo e implementación de la página web del Fondo Adaptación • Proveer soluciones de vivienda en el departamento de Risaralda • Interventoría integral a los contratos de ejecución y entrega de viviendas en el departamento de caldas • Proceso de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales para el vehículo de la entidad. • Proceso de adquisición, instalación puesta en funcionamiento de monitores interactivos para el Fondo Adaptación
--	--	---

(AEC03)_Procesos Evaluados Financieramente / Evaluaciones designadas por SG	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El equipo de la Subgerencia de Estructuración realizó alrededor de 15 evaluaciones financieras de los procesos de contratación adelantados por la entidad de acuerdo a los memorandos de designación que se fueron asignados por la secretaria general ,por lo anterior esta tarea se realiza de acuerdo a los procesos que apertura el Fondo Adaptación.
	Abril	Durante el mes de abril se realizaron las siguientes evaluaciones: 1 Culminación, diseños de detalle, construir y

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<p>estructurar de protección en los cascos urbanos de San Marcos y Magangué y su respectiva interventoría.</p> <p>2. Dotaciones de la ESE centro de salud de Guaranda - Sucre</p> <p>3. Dotación del Centro de Salud de Soplaviento - Bolívar</p> <p>4. Servicios integrales de administración y organización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad</p> <p>5. Dotación DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE Mahates - Bolívar</p>
Mayo	<p>La Subgerencia de Estructuración, se le asignaron evaluaciones financieras cumpliendo la totalidad de evaluaciones, que se describen a continuación:</p> <p>1. Culminar los diseños de detalle con los insumos entregados por el FA y construir las estructuras de protección contra inundaciones de los cascos urbanos de los municipios de San Marcos y Magangué.</p> <p>2. Interventoría integral del contrato que resulte del proceso: Culminar los diseños de detalle con los insumos entregados por el FA y construir las estructuras de protección contra inundaciones de los cascos urbanos de los municipios de San Marcos y Magangué.</p> <p>3. Cesión de contrato N.098 de 2018</p> <p>4. Cesión de contrato N.109 de 2018</p> <p>5. Cesión de contrato N.220 de 2016</p>
Junio	<p>La Subgerencia de Estructuración se le designaron evaluaciones financieras cumpliendo con la meta para el periodo, evaluaciones que se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación financiera de la Interventoría integral a la construcción de la IPS del centro de salud Don Bosco, en el corregimiento de Currulao municipio de Turbo, radicada en Secretaria General mediante memorando I-2020-003102

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluaciones financiera del proceso de prestación de los servicios integrales de administración y organización documental para el Fondo Adaptación de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y las especificaciones técnicas requeridas, radicada en Secretaria General mediante memorando I-2020-003035.
--	--	---

(AEC04)_ Documentos de políticas, lineamientos y metodología para la recepción / identificación, selección, priorización estructuración de nuevos proyectos	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>La Subgerencia de estructuración en un trabajo conjunto con Secretaria General, publicó el formato de estudio previo para las nuevas contrataciones de la entidad teniendo en cuenta el actual régimen de contratación que nos rige.</p> <p>Adicionalmente, se está trabajando en los nuevos lineamientos para la estructuración de nuevos proyectos de acuerdo a nueva visión de la entidad.</p>
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	La Subgerencia de Estructuración está adelantando el documento definitivo de lineamientos, metodología de identificación, selección y priorización de nuevos proyectos. Este documento podría ajustarse de acuerdo a la nueva visión y misión de la entidad.

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

Perspectiva Externa:

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.


OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva Interna:


OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Objetivo Estratégico #5: Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

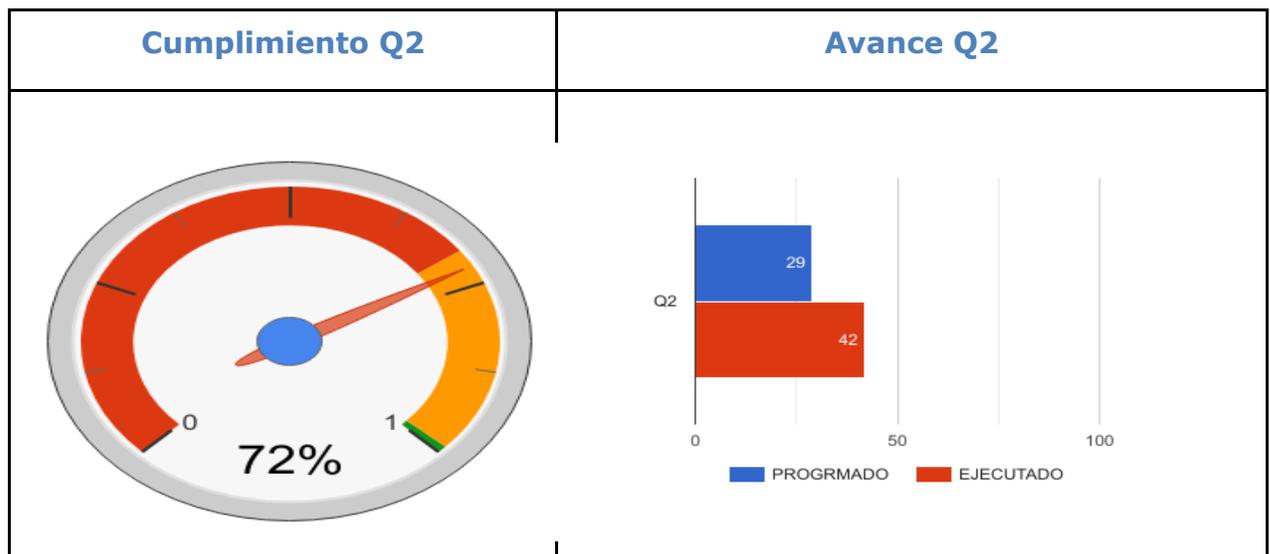

Objetivo Estratégico #6: Modernizar y fortalecer el Funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

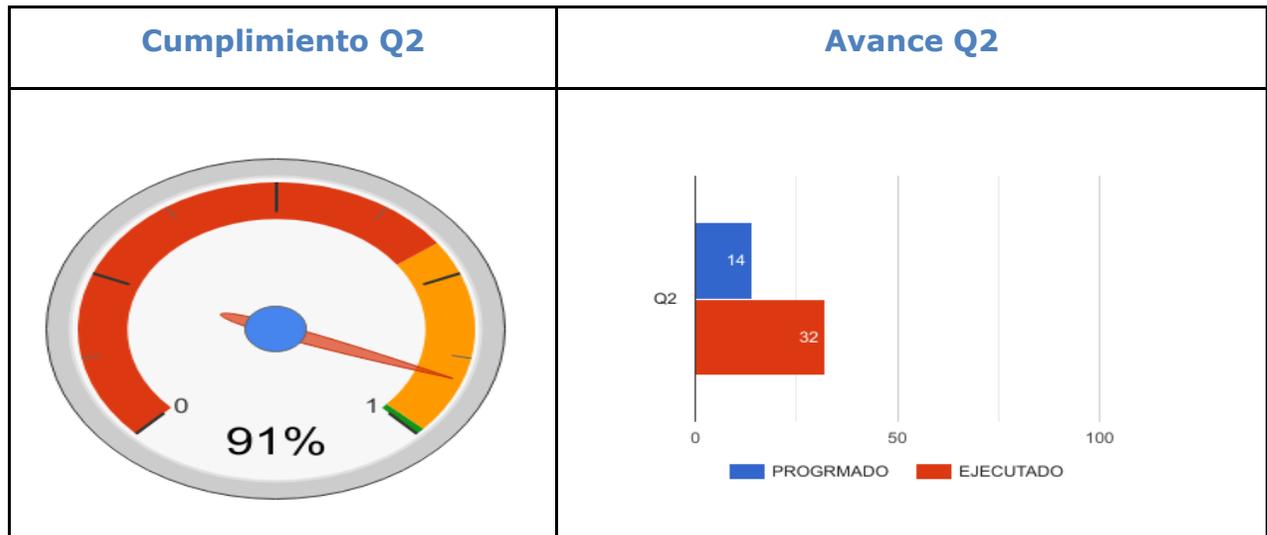


5.1 Avances cierre de brechas Políticas MIPG

Resultados MIPG / FURAG

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.

Con corte a 2018 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos y financieros:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

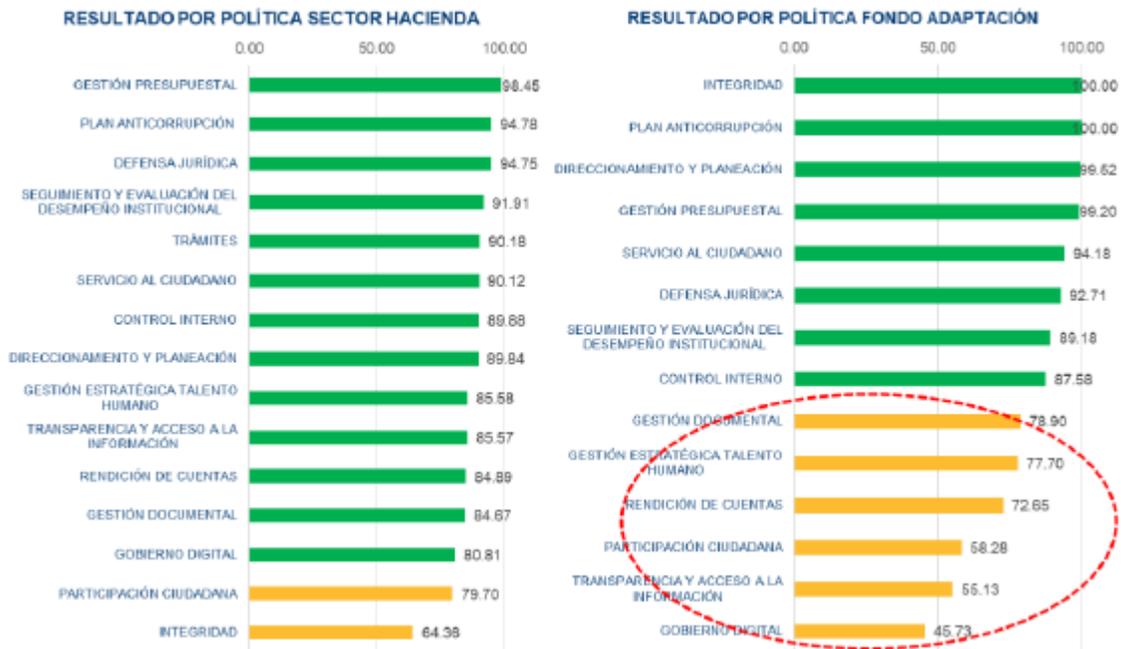

5.2 Área D: Subgerencia de Regiones



Fondo Adaptación

Área/Portafolio: **ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GESTIÓN SOCIAL**

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AED01_Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG)* PAAC-2020	(AED01)_Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG), implementada	#4	100	0	40	0	60	40
AED02_Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* PAAC-2020	(AED02)_Política de Interacción y Sostenibilidad Social, implementada	#4	100	0	40	0	60	40
PES2020_Identificar oportunidades de mejora como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	(PES2020)_Oportunidades de mejora identificadas, como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	#4	100	0	40	0	60	40

Bitácora de Seguimiento

<p>(AED01)_Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG), implementada</p>	Enero	<p>Para el mes de Enero se tenía planeado desarrollar 7 actividades de participación ciudadana y se ejecutaron 11, las cuales son descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se acompañaron 9 Espacios de Participación ciudadana para el sector de educación • Se realizaron 2 fortalecimientos a los Equipos Locales de Seguimiento -ELS - en la Vega y Miraflores del sector Salud
	Febrero	<p>Para este periodo se tenían programados 8 espacios de participación ciudadana y se realizaron 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se acompañaron 11 espacios de participación ciudadana por parte del sector educación y el macroproyecto de Jarillón de Cali. • Se realizaron 9 fortalecimientos a los Equipos Locales de Seguimiento, para el sector vivienda, salud y el macroproyecto de Jarillón de Cali.
	Marzo	<p>Para este periodo la meta era el acompañamiento a 8 espacios de participación ciudadana, sin embargo se realizaron 11.</p> <p>Distribuidos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACOMPAÑADOS: 10 por parte del sector de Educación • FORTALECIMIENTO ELS: 1 por parte del macroproyecto de Jarillón de Cali.
	Abril	<p>Este mes no hubo avances con este objetivo debido a que para dar cumplimiento al mismo, se deben realizar actividades en campo y con la comunidad. Esto no se pudo realizar ya que la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional desde el 24 de marzo al 25 de mayo no permite la interacción social, ya que el Estado decreto la cuarentena nacional.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Mayo	Salud • 3 espacios de participación acompañados (3 foros de seguimiento: IPS la Gabarra, Gramalote, Miraflores) Educación • 1 AUDITORÍAS VISIBLES ACOMPAÑADAS: 1 Auditoría de Foro de 50% con la comunidad de la Sede Escuela Mixta Urbana N. 1 de Gamarra Cesar Jarillón • 1 fortalecimiento a ELS
	Junio	• AV ACOMPAÑADAS 8: • Auditoria Visible acompañada (foro de seguimiento centro de salud Guaranda- Sucre. 1 • Mesa de gestión interinstitucional Santa Lucia Canal del Dique - Reactivación - Acompañamiento Foro Inicial Reactivar Café - Magdalena - Foro 50% alcaldía de Mompós • CORES: 2 : Chocó y Santander ELS FORTALECIDOS: 1 en el sector educación

(AED02)_Política de Interacción y Sostenibilidad Social, implementada	Enero	<p>Para el mes de Enero se realizaron 16 cierres sociales para el sector de vivienda, en los siguientes proyectos desarrollos con los operadores zonales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COLSUBSIDIO: Sogamoso, Chiquinquirá, Guaduas, Socha, La Uvita, Tocancipa, Mongüi) • COMFACESAR (Curumani, El Paso, Chimichagua rural, Chiriguana urbano, Curumani rural, Chiriguana urbana, Pelaya) • MINUTO DE DIOS (Purificación) <p>Además se realizaron 4 comités de seguimiento del sector vivienda de los siguientes contratos 222 de 2016,157 de 2015,178 de 2016 y 100 de 2019. Así como una actividad de relacionamiento del sector Educación.</p>
	Febrero	<p>Para este periodo se tenía como meta 6 espacios y se realizaron 9, distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de Seguimiento para el sector salud: Acta comité de seguimiento interventoría y contratista del hospital de Guaranda Sucre 27 de Febrero del 2020.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<p>Comité de seguimiento del sector Transporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 comité de seguimiento puente Hisgaura • 4 comité de seguimiento contrato Yatí, • 2 comité de seguimiento contrato la Cruz
Marzo	<p>Para este periodo realizaron 4 espacios de interacción social. Las actividades son las siguientes:</p> <p>Del sector de Reactivación Económica se realizó los siguientes espacios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité de Seguimiento del proyecto 338 de 2019 • Reactivar Café Magdalena – Santa Marta 16 y 17 de marzo de 2020 • Se aprobó el plan de gestión social del proyecto 338 de 2019 Reactivar Café Magdalena <p>Además se realizaron 2 comités de Seguimiento para el sector de Educación.</p>
Abril	<p>Para este mes, se realizaron 5 comités de seguimiento a los contratos en los sectores de Reactivación económica y educación:</p> <p>Reactivación Económica: Acta Comité de Seguimiento del proyecto 338 de 2019 Reactivar Café Magdalena – Santa Marta 14 de abril de 2020</p> <p>Educación: 4 comités de seguimiento a proyectos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta Reunión Teleconferencia Seguimiento Contrato 077 de 2017 Eduardo Ghisays 22042020 2. Acta Reunión de Seguimiento Obras Entregadas San Zenón 13-04-2020 3. Acta Reunión Seguimiento Proyectos Patos y Pavitas-Municipio de Piñón 27-04-2020. 4. Correo de Seguimiento a compromisos Sociales Plato y Pedraza 30-04-2020 <p>Además se revisaron y aprobaron dos actualizaciones a planes de gestión social del sector de acueducto y saneamiento básico en los</p>


		proyectos de Linares y Samaniego.
Mayo		<p>Vivienda: Plan de gestión social Achí – actualización - 3 comités de seguimiento: 1. Alcaldía de Santa Bárbara, Santander - 28-05-2020; 2. Comité de Seguimiento Protocolo Entregas de Vivienda - Fonvivienda - 04-05-2020; 3. Comité de Seguimiento Protocolo Entregas de Vivienda - Fonvivienda - 11-05-2020 Salud</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 comités de seguimiento (6 Actas de comités con interventorías y contratistas): 3 comités de seguimiento con el proyecto construcción del hospital puerto tejada- Cauca; 2 comités de seguimiento con el proyecto construcción Hospital de Miraflores – Boyacá; 1 comité de seguimiento con el proyecto construcción IPS la Gabarra - Norte de Santander Educación • 14 comités de seguimiento: Zona Bananera – Gamarra – Chimichagua – Plato – Liborina – Pedraza – Quibdo – Remolino – Santa Ana – Maicao – Piñón
Junio		<ul style="list-style-type: none"> • COMITÉS DE SEGUIMIENTO: 14: Sector Educación (Agrotomala, Sucre, c-077-2017, C-108-2019. C-113-2019, C-210-2018, Proyectos Patos y Pavitas Magdalena, C-528-2014. Consorcio construir 21, Liborina, Pijiño del Carmen y el Horno, Medio Baudó. Salud: IPS la Gabarra y Hospital de San Cristóbal - Bolívar. • PLANES DE GESTIÓN SOCIAL SECTOR VIVIENDA APROBADOS: 2 • PLANES DE GESTIÓN SOCIAL SECTOR SALUD APROBADOS: 3: IPS la Gabarra, Hospital Regional de Miraflores- Boyacá y Hospital de Puerto Tejada-Cauca. Pendientes incluir en la carpeta • PLANES DE GESTIÓN SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN APROBADOS: 6 • CIERRES SOCIALES VIVIENDA: 12: COMFACESAR: 5 Cierres Sociales Paz y Salvos de: Astrea, Becerril, Chimichagua, San Sebastián y Valledupar COLSUBSIDIO: 7 Cierres Sociales Paz y

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Salvos de: Caparrapí, Sativa Norte, Puerto Boyacá, Soacha (2), Gachetá y Sutatenza.
--	---

(PES2020)_Oportunidades de mejora identificadas, como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	Enero	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad esté enterada de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos para poder realizar las mejoras continuas a los procesos.</p> <p>En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el sector educación para los Foros Inicial, del 50% y el final. Además se reciben PQRSFD en los proyectos, es así como para este mes se tiene el registro para el sector de Salud y el Macro proyecto del Jarillón de Cali</p>
	Febrero	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad esté enterada de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos para poder realizar las mejoras continuas a los procesos.</p> <p>En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el sector educación y el Macro proyecto del Jarillón de Cali para los Foros Inicial, del 50% y el final.</p> <p>Además se reciben PQRSFD en los proyectos, es así como para este mes se tiene el registro para el sector de Reactivación Económica y el Macro proyecto del Jarillón de Cali.</p>
	Marzo	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad esté enterada de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos para poder realizar las mejoras continuas a los procesos.</p> <p>En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el sector educación para los Foros</p>

	<p>Inicial, del 50% y el final.</p> <p>Además se reciben PQRSFD en los proyectos, sin embargo, para este mes, no se registró ninguna en los proyectos.</p>
Abril	<p>En este objetivo no se obtuvo un avance, ya que para dar cumplimiento al mismo se debe trabajar en campo y con comunidad y dado que el Estado declaró la emergencia sanitaria desde el 24 de marzo hasta el 25 de mayo y al encontrarse en cuarentena el país con distanciamientos social, impide el trabajo con la gente.</p>
Mayo	<p>Se recibieron PQR en campo para los sectores de reactivación y salud. Se realizó sondeo de satisfacción para foro inicial en Gramalote - proyecto reactivación económica.</p> <p>Además se reportan reuniones de equipos locales de seguimiento donde se realizan algunas sugerencias al FA.</p> <p>"Se solicita que se realice una próxima reunión donde asista la administración municipal para que estos hagan seguimiento en salud al personal que va a entrar a laborar en la obra, y tener mayor seguridad frente a un caso de Covid 19".</p>
Junio	<p>Se reportan PQR de los sectores de salud, vivienda, educación y del macroproyecto Jarillón de Cali. Se realizan 5 foros iniciales, 1 foro del 50% y dos foros finales. 3 Reuniones de seguimiento de ELS.</p>

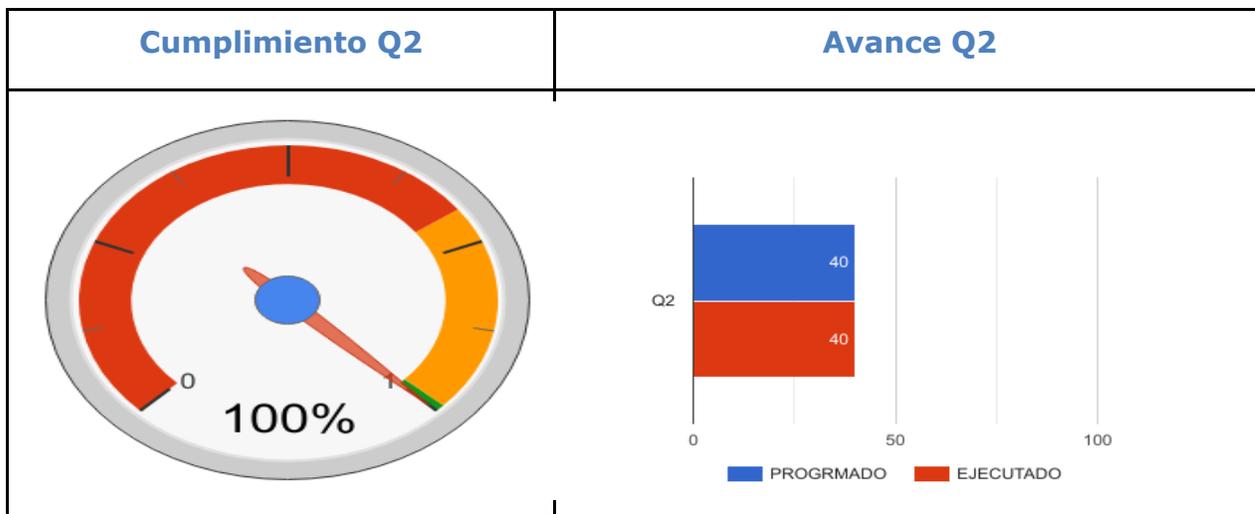

5.3 Área E: Gerencia - Comunicaciones



Fondo Adaptación

Área/Portafolio: ÁREA E – GERENCIA
Portafolio/Programa/Proyecto: COMUNICACIONES

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEE01_Ejecutar Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública* PAAC-2020	(AEE01)_Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública, ejecutada	#5	100	0	40	0	60	53
AEE02_Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas Externa e Interna de la Entidad* PAAC-2020	(AEE02)_Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	#5	100	0	40	0	60	41
AEE03_Aplicar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 _PES-2020	(AEE03)_Diagnóstico de la sección de Transparencia de la página web, elaborado	#5	1	0	0	0	1	1

Bitácora de Seguimiento

(AEE01)_Institucionalización	Enero	Sin registro de avance en el indicador
------------------------------	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública, ejecutada	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Para el cumplimiento de este indicador se han establecido tres acciones específicas que permiten avanzar en su cumplimiento:</p> <p>La primera, Realizar un diagnóstico de cumplimiento a Ley de Transparencia 1712 de 2014 en la página web institucional. Se avanzó en el diagnóstico y los resultados del mismo se encuentran documentados en el documento denominado "Diagnóstico Ley de Transparencia". En este se presenta una matriz detallada de aplicación de la Ley 1712 de 2014 con base a la Resolución 3564 de 2015, la cual brinda un análisis detallado de la implementación de la Ley de Transparencia.</p> <p>La segunda actividad tiene que ver con la inclusión en el micro sitio de contratación instrucciones que le permitan al usuario realizar una búsqueda eficiente. Al respecto, se incluyó en cada una de las secciones del sitio de contratación, instrucciones para realizar búsqueda de procesos.</p> <p>La tercera actividad, buscaba la publicación de un cronograma de actividades de rendición de cuentas en la página web, donde la ciudadanía puede consultar la programación de los espacios presenciales y virtuales destinados para la divulgación de temas relacionados con la gestión de la entidad, sus proyectos, macroproyectos y sectores. Febrero – Diciembre. El día 2 de marzo de 2020 se recibió y posteriormente se publicó el cronograma con todas las actividades de participación ciudadana a realizar en 2020.</p>
	Abril	1. Realizar un diagnóstico de cumplimiento a Ley de Transparencia 1712 de 2014 en la página web institucional: Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos dados por Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), en el mes de abril se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, encontrando que de los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014) la Entidad cumple en su totalidad. Para los siguientes tres ítems, el cumplimiento se evidencia así:

- Ofertas de empleo: el Fondo Adaptación está implementando una Política con el fin de promover la vinculación de contratistas a la Entidad o cambios internos de funcionarios cuando se generan las vacantes.
- Informes a organismos de inspección, vigilancia y control: en los informes pormenorizados de Control Interno publicados en la página web de la Entidad, en la sección "Rendición de Cuentas" se recogen algunas de las principales observaciones generadas por la oficina de control interno.
- Trámites: en el marco de la ley, el Fondo Adaptación no cuenta con competencia o función administrativa alguna, que den lugar a la existencia de trámites u otros procedimientos administrativos, por lo tanto la Entidad no publica nada en su página web frente a este tema.

2. Incluir instrucciones en el formulario de PQRSFD publicado en la web. Febrero - Junio

Como parte de la actividad planteada para su cumplimiento en el Q2 "Incluir instrucciones en el formulario de PQRSFD publicado en la web", el área de Gestión Documental se encuentra

		<p>realizando los últimos ajustes a la plataforma (acción realizada con contratista externo) para realizar su implementación final, junto con la herramienta Infodoc, en el transcurso del segundo trimestre de 2020.</p> <p>3. Publicación en la sección de Atención al ciudadano de "Información sobre los grupos étnicos en el territorio" Febrero - Junio</p> <p>El equipo de comunicaciones se encuentra en la consolidación de información existente referente a grupos étnicos con el fin de realizar su organización y publicación en el sitio web de la Entidad.</p> <p>Por otra parte, en el mes de abril se han adelantado las siguientes acciones con el fin de realizar la contratación para el nuevo sitio web:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descripción general del proyecto - consolidación de referentes técnicos. 2. Consolidación de Estudios Previos 3. Elaboración de Estudio de Sector
	<p>Mayo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar un diagnóstico de cumplimiento a Ley de Transparencia 1712 de 2014 en la página web institucional: en el mes de mayo se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, encontrando que el Fondo Adaptación cumple en su totalidad con los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014). 2. Incluir instrucciones en el formulario de PQRSFD publicado en la web: El cumplimiento de esta actividad quedó programado para el mes de junio. En la actualidad el área de Gestión Documental está realizando los ajustes a la plataforma de

		<p>Infodoc, herramienta que trae incluido el formulario de PQRSFD con las guías para su correcto diligenciamiento.</p> <p>3. Publicación en la sección de Atención al ciudadano de "Información sobre los grupos étnicos en el territorio": El equipo de trabajo de comunicaciones solicitó a la Subgerencia de Regiones la identificación de los proyectos donde haya grupos étnicos, con el propósito de consolidar y clasificar esa información para establecer la mejor forma de comunicar el tipo de intervención que realiza el Fondo en estos territorios.</p>
	<p>Junio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar un diagnóstico de cumplimiento a Ley de Transparencia 1712 de 2014 en la página web institucional: en el mes de junio se realizó seguimiento a todas las publicaciones y contenidos de la página web, encontrando que el Fondo Adaptación cumple en su totalidad con los 53 ítems dispuestos en la Resolución 3564 de 2015 (la cual brinda los lineamientos para la implementación adecuada de Ley 1712 de 2014). 2. Incluir instrucciones en el formulario de PQRSFD publicado en la web: El desarrollo de esta actividad se tenía planeada para su cumplimiento en el mes de junio. Dadas las circunstancias del Covid-19, el aislamiento preventivo y el trabajo en casa en el que se encuentran actualmente los colaboradores de la Entidad, ha dificultado la implementación del formulario por parte del área Gestión Documental. 3. Publicación en la sección de Atención al ciudadano de "Información sobre los grupos étnicos en el territorio": El equipo de trabajo de comunicaciones solicitó a la Subgerencia de Regiones la identificación de los proyectos

		<p>donde haya grupos étnicos, con el propósito de consolidar y clasificar esa información para establecer la mejor forma de comunicar el tipo de intervención que realiza el Fondo en estos territorios. Una vez consolidada la información, se creó espacio con respecto a las intervenciones realizadas por el Fondo Adaptación que benefician a grupos étnicos.</p>
--	--	--

<p>(AEE02)_Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública</p>	<p>Enero</p>	<p>En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”, se identificaron varias acciones encaminadas a divulgar información veraz sobre la gestión y generar confianza con los diferentes grupos de interés para que se conviertan en multiplicadores de esa información.</p> <p>Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar procesos de rendición de cuentas de manera permanente a través de diferentes canales y acciones.</p> <p>En el mes de enero se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados de prensa 8 • Notas publicadas en medios de comunicación 236 • Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video 8 • Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad 60 <p>En enero se registraron 236 noticias, de las cuales 98 fueron de impacto positivo, 102 neutras y 36</p>
---	--------------	--

		negativas, con un Free Press de \$1.882.004.456
	Febrero	<p>En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”, se identificaron varias acciones encaminadas a divulgar información veraz sobre la gestión y generar confianza con los diferentes grupos de interés para que se conviertan en multiplicadores de esa información.</p> <p>Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar procesos de rendición de cuentas de manera permanente a través de diferentes canales y acciones.</p> <p>En el mes de enero se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados de prensa 11 • Notas publicadas en medios de comunicación 218 • Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video 6 • Actualización de “En el Radar” 1 • Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad 146 <p>En febrero se registraron 218 noticias, de las cuales 116 fueron de impacto positivo, 68 neutras y 34 negativas, el 89% de la información fue de incidencia directa para la entidad y tuvieron un costo de Free Press de \$1.370.030.573.</p> <p>El cubrimiento de las noticias del Fondo Adaptación en medios nacionales (incluyendo medios online), generaron mayor impacto mediático con un registro de 141 noticias, de las cuales 69 fueron de incidencia positiva, 50 neutra y 22 negativa. En medios regionales la difusión fue de 75 noticias de</p>

		<p>las cuales 45 fueron de impacto positivo, 18 neutras y 12 negativas.</p> <p>Durante este mes también se registró el cubrimiento de un medio de la ciudad de Miami, de dos noticias relacionadas con los proyectos adaptados al cambio climático y la puesta en funcionamiento del puente Hisgaura.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”, se identificaron varias acciones encaminadas a divulgar información veraz sobre la gestión y generar confianza con los diferentes grupos de interés para que se conviertan en multiplicadores de esa información.</p> <p>Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar procesos de rendición de cuentas de manera permanente a través de diferentes canales y acciones.</p> <p>En el primer trimestre (enero, febrero y marzo), se mantuvo informada a la ciudadanía respecto a la gestión del Fondo a través de la publicación de comunicados de prensa, mensajes en redes sociales, espacios de diálogo virtual, herramientas de consulta ciudadana en la página web, entre otros. En el marco de la estrategia de rendición de cuentas en resumen en el trimestre se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados de prensa 29. (10 en el mes de marzo) • Notas publicadas en medios de comunicación 608. (154 en el mes de marzo).

- Número de espacios digitales de rendición de cuentas #ElFondoResponde 2
- Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video 15. (1 en el mes de marzo)
- Actualización de "En el Radar" 1
- Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad 331. (124 en el mes de marzo)

En el mes de marzo en particular se registraron 154 noticias, de las cuales 81 fueron positivas, 48 neutras y 25 negativas, el 96% de la información fue de incidencia directa para la entidad. Con este registro noticioso se obtuvo un Free Press de \$44.096.892.

En el periodo en mención (enero, febrero y marzo) se desarrollaron dos ejercicios de rendición de cuentas a través de medios virtuales, dando continuidad a la estrategia denominada #ElFondoResponde, que consiste en realizar una transmisión en directo vía Facebook Live en la que el líder de un sector responde las inquietudes de la comunidad respecto a los proyectos que ejecuta la entidad.

En cuanto a la estrategia de comunicación interna, en el trimestre se desarrollaron varias acciones encaminadas a satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, para contribuir a la construcción de un ambiente laboral que permita potencializar el trabajo en equipo y visibilizar los resultados de la entidad.

Asimismo, se fortalecimiento de canales internos con la publicación de información a través del Noticiero Interno, intranet, carteleras digitales y mailings.


	Abril	<p>Comunicación Externa: Es así como, en este mes se informó a la ciudadanía respecto a la gestión del Fondo a través de la publicación de comunicados de prensa, mensajes en redes sociales, espacios de diálogo virtual, herramientas de consulta ciudadana en la página web, noticiero externo.</p> <p>Comunicación Interna: Asimismo, se fortalecieron los canales internos con la publicación de información a través del Noticiero Interno, intranet, carteleras digitales y mailings.</p>
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	<p>Comunicación Externa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados de prensa: 10 • Notas publicadas en medios de comunicación: 93 • Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video: 11 • Actualización de "En el Radar": 1 • Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad: 125 <p>Comunicación Interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piezas de comunicación interna para mantener informados a los colaboradores de las acciones institucionales y lineamientos de la entidad: 45 • Piezas informativas de lenguaje claro: 2 • Contenidos audiovisuales: 4 • Actividades de diálogo con los colaboradores: 4 • Fortalecimiento de canales internos para mantener una comunicación activa e informar periódicamente a los colaboradores: *5 emisiones del noticiero, Actualización y fortalecimiento de AdaptaNET, *18 slides diseñados y publicados, *7 notas informativas en *Inclusión de (1) botón de fácil acceso en el

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>home de la intranet para la plataforma TI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campañas de promoción y divulgación de temas institucionales y misionales: 3
--	--	---

(AEE03)_Diagnóstico de la sección de Transparencia de la página web, elaborado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	<p>Como parte de la actividad planteada para su cumplimiento en el Q4 "Realizar el diseño, desarrollo e implementación del portal web del Fondo Adaptación, incluyendo la migración de los contenidos publicados en la actual página web, acorde a los lineamientos dados por gov.co (directiva presidencial 02 de 2019), Gobierno Digital y los parámetros dados por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 con el nivel de conformidad AA" se han adelantado las siguientes acciones con el fin de realizar la contratación para el nuevo sitio web que cumpla con los requerimientos planteados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar descripción general del proyecto 2. Realizar matriz de riesgos implícitos en la contratación 3. Estructuración del proyecto (Formato de Cotización, Carta de Estudio de Mercado y Estudio de Sector, tarea conjunta con la Subgerencia de Estructuración de Proyectos) 4. Publicación de Estudio de Mercado para recepción de cotizaciones en página web y SECOP.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

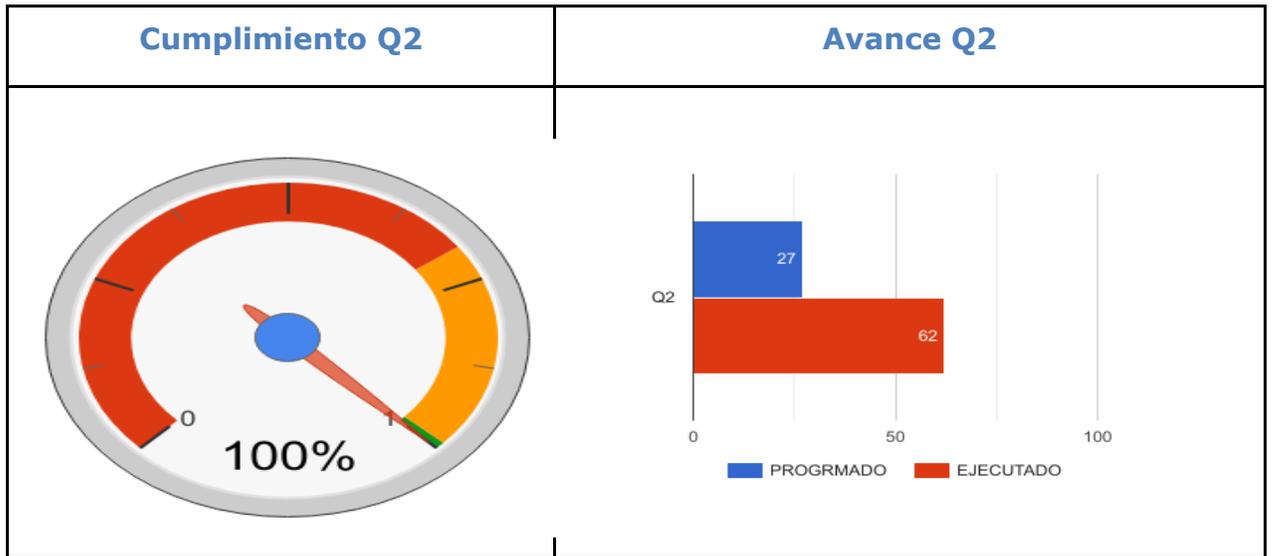

5.4 Área F: Oficina de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF01_Implementar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG)*	(AEF01)_Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG), implementada	#3	100	0	40	0	60	40
AEF02_Rediseñar la Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales*	(AEF02)_Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales, rediseñada	#6	100	0	40	0	60	60
AEF03_Rediseñar el Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional*	(AEF03)_Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional, rediseñado	#6	100	0	40	0	60	40
AEF04_Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción PAAC-2020	(AEF04)_Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción, ejecutada	#6	100	0	40	0	60	40

Bitácora de Seguimiento

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEF01)_Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	En este periodo se avanzó con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

(AEF02)_Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales, rediseñada	Enero	En el mes de enero se inició el trabajo de consolidación de una propuesta de reestructuración del Fondo Adaptación enmarcada dentro del alcance establecido en el Artículo 46 de la Ley 1755 de 2019 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad",
	Febrero	Articulado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se viene trabajando en los elementos del alcance de la reestructuración del Fondo Adaptación para que sean incluidos en la propuesta de Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible.
	Marzo	Se realiza una primera presentación al Consejo Directivo para discutir los principales elementos de alcance y contexto que pueden enmarcar la reestructuración institucional.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Durante el primer semestre de 2020 en el indicador de avance de Estructura Organizacional, la Oficina de Planeación adelantó el proyecto de ley con las observaciones por parte del equipo del Fondo y la justificación técnica correspondiente. Estos documentos fueron enviados a Hacienda para

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		continuar con el proceso. Hasta la fecha no se han recibido comentarios.
(AEF03)_Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional, rediseñado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se desarrolla un instrumento para hacer aplicado con los líderes de procesos y poder establecer el estado de cada proceso y procedimiento y definir una ruta de actualización basada en criterios técnicos y objetivos.
	Marzo	Se inicia el trabajo de aplicación del instrumento de valoración de estado de procesos y procedimientos con los diferentes líderes de proceso de acuerdo a un cronograma aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	La OAP en el marco del decreto 1499 de 2017 donde se establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y dentro del cumplimiento del objetivo estratégico No. 6 "Modernizar y fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión a largo plazo", establece la siguiente acción estratégica "Rediseñar el Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional" la cual incluye el desarrollo de pruebas de recorrido a los procesos de la Entidad que permitan establecer y cerrar las brecha existentes, así como generar una mayor articulación de procesos y procedimientos al interior del Modelo Operativo Institucional, durante el primer semestre de 2020, se realizaron reuniones con los líderes de los macroprocesos de Gestión de Talento Humano, Gestión de Servicios y Defensa Judicial, logrando generar nuevas caracterizaciones de procesos más efectivas y que generan valor a los procesos enunciados.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEF04)_Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>El mapa de riesgos del Fondo Adaptación, el cual incluye el detalle de los riesgos anticorrupción se encuentra publicado en la página web de la Entidad. Así mismo, la Entidad cuenta con la Política de Riesgo y los lineamientos para la gestión del riesgo institucional los cuales incluyen una descripción de los principales elementos del proceso de riesgo en la Entidad y el paso a paso establecido por el Fondo Adaptación para el seguimiento y la gestión del riesgo.</p> <p>En el primer trimestre del año se socializó con todas las áreas de la entidad los riesgos y controles asignados por área de acuerdo con la MATRIZ DE RIESGO 2019-2022.</p>
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	La Oficina de Planeación lideró con corte a abril de 2020 el seguimiento a los riesgos de corrupción de la Entidad. Los resultados se encuentran documentados en un informe el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. Así mismo, los resultados se socializaron en el Comité de control interno de junio.

Cumplimiento Q2

Avance Q2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

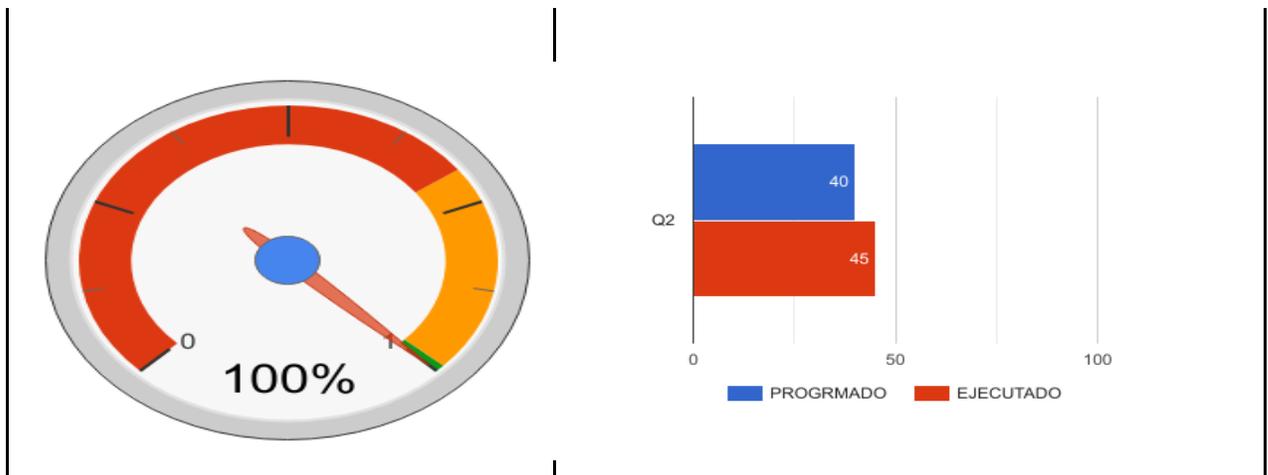

Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Portafolio/Programa/Proyecto: TECNOLOGÍA



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF05_Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnología (PETI) de acuerdo al mapa de ruta 2020	(AEF05)_Plan Estratégico de TI 2020 ejecutado.	#5	100	0	25	0	75	25
AEF06_Implementar la Política de Seguridad Digital (MIPG)*	(AEF06)_Política de Seguridad Digital (MIPG), implementada	#5	100	0	40	0	60	0


Bitácora de Seguimiento

(AEF05)_Plan Estratégico de TI 2020 ejecutado.	Enero	Se presentó al Comité Estratégico el Plan de Tecnología, incluyendo la estrategia de fortalecimiento de la arquitectura empresarial. El comité sugirió revisar la ejecución de esta actividad teniendo en cuenta el momento de la entidad y focalizar el trabajo hacia la integración de los sistemas de información, el fortalecimiento de los mismos y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de apoyo.
	Febrero	Sobre las sugerencias realizadas por el Comité Estratégico se presentó una nueva propuesta de Plan de Tecnología con los énfasis solicitados. Se excluye esta actividad de las priorizadas por el año. Se va a realizar el cambio de la actividad en el marco del Comité Táctico y el Comité de Gestión y Desempeño
	Marzo	Se realiza la solicitud de cambio de actividad a la Oficina de Planeación.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	“En el proyecto de Fortalecimiento en la Gestión de Información se han realizado importantes avances, a saber: 1) Estudios previos y de mercado para la adquisición de los equipos de cómputo, b) Actualización del sistema PSA en su plataforma base de Project Server, c) Contratación para el diseño y elaboración del nuevo sitio WEB de la entidad, d) Actualizaciones en SIFA de la nueva estructura presupuestal y de pagos por intervenciones y productos y su integración con el sistema PSA e) Contratación del Oficial de Seguridad para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, f) Etapa precontractual para las nuevas actualizaciones en el sistema SIFA. De otro lado también se realizó la contratación para la seguridad

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		física de la entidad a través del CCTV y controles de acceso y la contratación para los monitores interactivos.
--	--	---

(AEF06)_Política de Seguridad Digital (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se presenta en el marco del Comité Estratégico del Fondo el Plan de Tecnología incluyendo el fortalecimiento de la Política de Seguridad Digital del Fondo. Se aprueban las actividades planteadas.
	Marzo	Se avanza en la estructuración de una contratación que permitirá mejorar la política de seguridad y desarrollar una ruta de implementación de la misma en el corto plazo.
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se avanzó en la contratación del oficial de seguridad de la entidad. Este oficial de seguridad será el encargado de apoyar a la entidad en la implementación del Modelo de seguridad y privacidad de la información y de la política de seguridad digital.

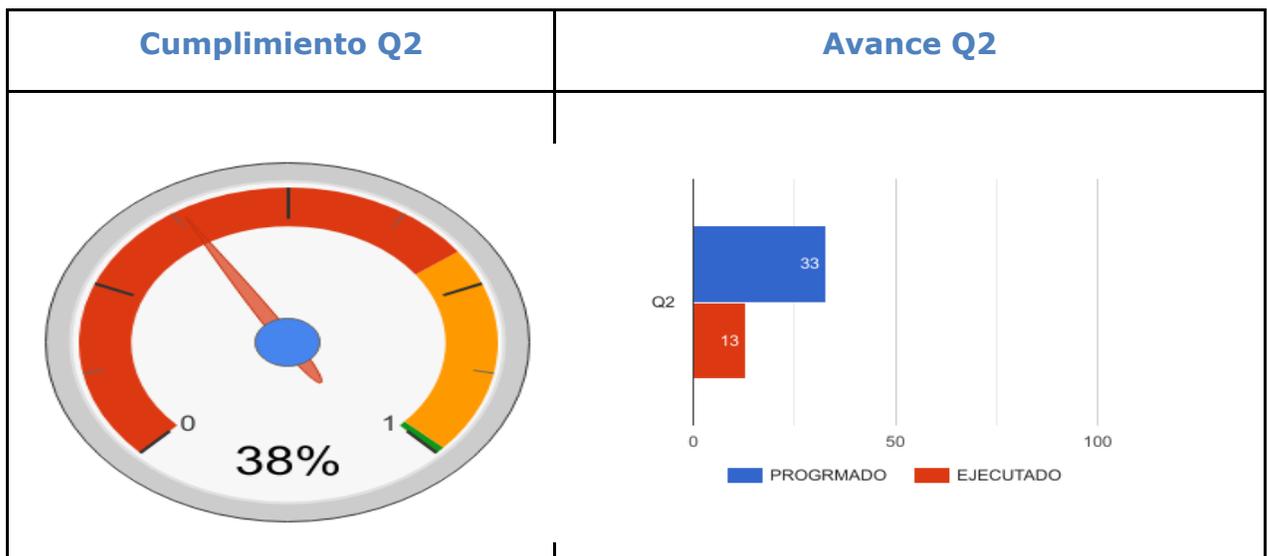


5.5 Área G: Secretaria General



Las gráficas a continuación muestran la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2020 en Secretaria General. En estas se puede evidenciar el cumplimiento respecto a las metas en el Q2 y el avance cuantitativo total, el cual se presenta de forma acumulativa con corte al cierre del Q2.

Cumplimiento Q2	Avance Q2
-----------------	-----------

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

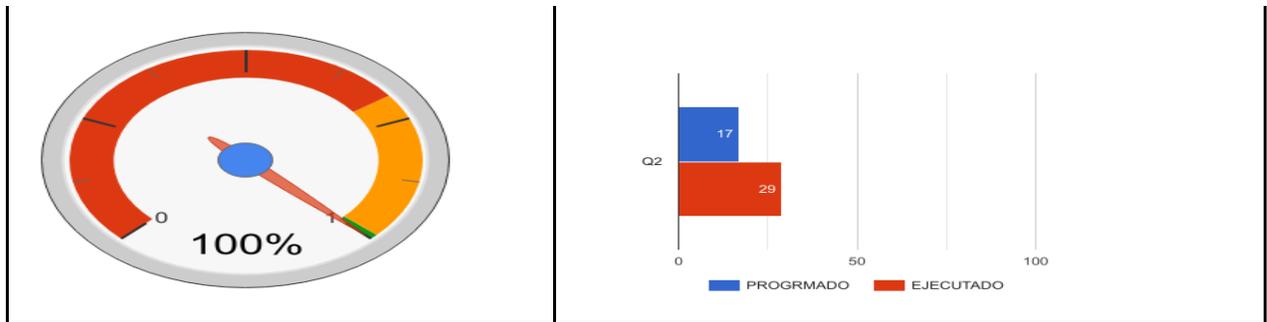

Área/Portafolio: **ÁREA G – SECRETARIA GENERAL** Portafolio/Programa/Proyecto: **TALENTO HUMANO**



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG01_Implementar la Política de Talento Humano (MIPG)*	(AEG01)_Política de Talento Humano (MIPG), implementada	#6	100	0	0	0	100	50
AEG02_Implementar Política de Integridad (MIPG)*	(AEG02)_Política de Integridad (MIPG), implementada	#6	100	0	0	0	100	50
PES2020_Participar en las reuniones sectoriales de	(PES2020)_Sesiones de Reuniones	#6	100	0	0	0	100	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Talento Humano	sectoriales de Talento Humano							
PES2020_Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH	(PES2020)_Sesiones de capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política	#6	100	0	0	0	100	0
PES2020_Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida	(PES2020)_Sesiones de colaboración en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida	#6	100	0	0	0	100	0
PES2020_Ajustar los planes MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del FURAG aplicada en el 2020	(PES2020)_Planes MIPG - Talento Humano, ajustados de conformidad con la medición FURAG aplicada en 2020	#6	1	0	0	0	1	0
PES2020_Reportar avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad	(PES2020)_Avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad, realizado	#6	100	0	0	0	100	0
Ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes ejecutado	#6	100	0	40	0	60	50

Bitácora de Seguimiento

(AEG01)_Política de Talento Humano (MIPG), implementada	Enero	En el mes de enero se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:
---	-------	--

		<ul style="list-style-type: none"> •Celebración mensual de cumpleaños •Incentivo Día de cumpleaños •Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad •Flexibilidad Laboral •Colecta Pro computadores •Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad •Flexibilidad Laboral •Colecta Pro computadores •Reuniones del COPASST •Reunión del Comité de Convivencia Laboral •Revisión de la Política y Objetivos de SST por parte del COPASST y Alta Dirección. •Capacitación en uso y mantenimiento de EPP y peligro y riesgos para el personal de aseo.
	<p>Febrero</p>	<p>En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Celebración mensual de cumpleaños •Incentivo Día de cumpleaños •Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad •Día sin carro •Turnos de descanso semana santa •Reuniones del COPASST •Reunión del Comité de Convivencia Laboral •Diseñar el Plan de Trabajo anual del SG-SST •Capacitaciones al COPASST •Capacitaciones al Comité de Convivencia •(SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos de condiciones de salud musculoesquelética y puestos de trabajo con nuevos ingresos al año 2020 •(SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y sintomatología alta por DME identificados en el PVE 2019(al puesto de trabajo y al individuo) •(SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en oficina a trabajadores de planta

		<p>ubicados en nuevas instalaciones (ESCUELAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> •(SVE-DME) Implementación de jornada de actividad terapéutica y pausas activas para la prevención de DME •Realización de la Evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 y aprobación por parte de Gerencia.
	<p>Marzo</p>	<p>En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día de la Mujer y del Hombre La fecha de celebración programada para celebrar el día del hombre era el 20 de marzo, sin embargo, por la situación de emergencia por el Covid-19 y las medidas de prevención tomadas por la Entidad, en esta fecha ya se encontraban realizando trabajo en casa por lo que se envió una tarjeta de felicitación por parte de La Entidad. Una vez se retomen las actividades, se les dará un detalle aportado por CAFAM. • El 9 de marzo se llevó a cabo la celebración del día de la mujer en el que fueron invitadas 155 mujeres del Fondo. Los hombres aportaron recursos para el compartir, el cual consistió en donas y gaseosa, y con apoyo de CAFAM hubo un músico, detalles para cada una y 3 boletas dobles de cine Colombia que fueron rifadas por el Gerente del Fondo. • Celebración mensual de cumpleaños • Conforme al Plan Integral de Bienestar Social 2019, mensualmente se celebran los cumpleaños de los colaboradores del Fondo Adaptación compartiendo un ponqué con apoyo de Cafam para todos los cumpleaños. En esta ocasión, las celebraciones se llevaron a cabo los días 30 de enero y 27 de febrero de 2020. • Incentivo Día de cumpleaños. Como parte del Plan Integral de Bienestar y Estímulos, integrado en el Plan Integral de Bienestar

Social, se otorgó un día libre para el disfrute de cumpleaños en familia, como parte de incentivo o salario emocional promovido por la Entidad a 20 funcionarios del Fondo, así:

- Adicionalmente, en coordinación con entidades financieras, EPS, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación, cooperativas y otras empresas del sector privado, a través de un stand instalado en la cafetería del Fondo Adaptación, dan a conocer sus servicios y productos. Con relación a esta actividad, contamos con la visita de las siguientes entidades privadas:

Juriscoop	18 de febrero
Alpina y Ramo	24 de febrero
Scotiabank Colpatria	27 de febrero
Visita Móvil CAFAM	28 de febrero
Peau Body Cream	5 de marzo
(Masajes relajantes en cuello y espalda)	
Coomeva Medicina Prepagada	12 de marzo

- Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad. Pensando en la seguridad de los colaboradores del Fondo Adaptación, se autorizó la salida temprano de las instalaciones de la entidad por las movilizaciones presentadas por el Paro Nacional en los días 21 de enero y 21 de febrero.
- Flexibilidad Laboral. Como parte de los incentivos no pecuniarios implementados, en el marco del Plan Integral de Bienestar Social, el pasado 21 de enero se emitió la Resolución 021 de 2020 "Por la cual se establece el horario de trabajo y de atención al ciudadano en el Fondo Adaptación", en el cual se incluye en el Capítulo II el horario flexible y la jornada laboral de los servidores públicos de la Entidad, en el que se han acogido 22 personas a la fecha de corte. Resolución 021 de 2020
- Colecta Pro computadores. El 31 de enero de

		<p>2020 se hizo la entrega de la donación en dinero a 3 personas víctimas del hurto a la Entidad en el mes de noviembre que son: Yaneth Velasco del Sector Vivienda, Erika Bernal del Sector Educación y Jorge García de la Subgerencia de Riesgos.</p> <p>Las otras 5 personas que también fueron víctimas, cedieron su parte de la donación a las 3 mencionadas anteriormente, lo cual se hizo en partes iguales en presencia del Gerente, la Secretaria General y 3 testigos que son la Diana Durán, Líder del E.T. Talento Humano y Servicios, Viviana Sánchez Técnico de Talento Humano y Alejandra Silva profesional I de la Gerencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Día sin carro. El jueves 6 de febrero el distrito estableció Día sin Carro, por lo que se puso a disposición los parqueaderos del Edificio Avianca y además se realizó un concurso el cual consistía en tomarse una foto usando un medio alternativo de transporte. <p>En el concurso participaron 17 personas y mediante sorteo los 3 ganadores fueron Diana Bernal – Secretaria General, Ana María Niño – Contratista de Comunicaciones y Andrés Mendivelso – Contratista tercerizado de Radicación, a quienes se le otorgó tarjetas de regalo del Centro Comercial Cafam Floresta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Turnos de descanso semana santa. El 27 de febrero se emitió la Circular Interna 003 de 2020 en el que se establecen 2 turnos de descanso para semana santa: 1). 8 de abril y 2). 13 de abril. Estos debían ser compensados entre el 2 al 11 de marzo de 2020.• Medidas de bienestar del trabajo en casa. Por la situación de emergencia del Covid-19, el
--	--	--

		<p>Fondo diseñó una red de apoyo psicosocial con tres profesionales psicológicas que trabajan en el Fondo quienes se ofrecieron hacer parte de esta red, en la que los colaboradores que sientan ansiedad, estrés u otra situación psicológica, puedan acceder a este apoyo para él o ella y su familia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reuniones del COPASST. Se hace acompañamiento a las reuniones de los meses de enero, febrero y marzo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Igualmente, se hace seguimiento y control de cierre de las acciones generadas en la ejecución de sus actividades. <p>De igual manera, se participa con el COPASST en los procesos de investigación de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo del presente informe.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunión del Comité de Convivencia Laboral <p>Se hace acompañamiento a la reunión trimestral del Comité de Convivencia Laboral el día 21 de febrero de 2020 en las instalaciones de la Entidad. Se hace seguimiento a los compromisos y se establecen nuevas estrategias para el fortalecimiento del Comité.</p> <ul style="list-style-type: none">• Diseñar el Plan de Trabajo anual del SG-SST. En el mes de febrero de 2020 se formaliza el plan de trabajo anual como lo establece la normatividad legal vigente con actividades de gestión, seguimiento e intervención. El documento es aprobado por parte de la Gerencia.• Capacitaciones al COPASST. Se realiza la capacitación en Investigación de AT y técnicas de entrevistas a los miembros del COPASST los
--	--	---

días 26 de febrero y 02 de abril de 2020.

- Capacitaciones al Comité de Convivencia. Se realiza la capacitación en Resolución de conflictos a los miembros del Comité de Convivencia el día 21 de febrero de 2020.
- Revisión del PIC por parte del COPASST y la Alta Dirección.
El día 26 de marzo de 2020 se deja el precedente en el acta para realizar la socialización del PIC 2020 ante el COPASST en la próxima reunión.
- Realizar curso de 50 horas a COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
Se realiza la inscripción de los 8 miembros del COPASST y los 8 miembros del Comité de convivencia para adelantar el Curso de 50 horas del SG-SST como lo establece normatividad actual.

Los resultados son los siguientes:

Comité de Convivencia

Total inscritos	8	8
Total certificados	6	6

Revisión de la Política y Objetivos de SST por parte del COPASST y Alta Dirección.

- En acta 004 del 28 de enero de 2020 se hace la socialización de la política y objetivos de SST ante el COPASST. Igualmente, en la reunión de revisión por la dirección el día 11 de marzo se socializa al comité táctico de la Entidad, la Política de SST, objetivos y otros documentos.
- (SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos de condiciones de salud musculoesquelética y puestos de trabajo con nuevos ingresos al año 2020

		<p>Se inician las actividades correspondientes al Sistema de Vigilancia Epidemiológico Desordenes Musculoesqueléticos con el Proveedor de la ARL Positiva.</p> <ul style="list-style-type: none">• (SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y sintomatología alta por DME identificados en el PVE 2019(al puesto de trabajo y al individuo) <p>El día 28 de febrero de 2020 se realiza inspección de puesto de trabajo a la funcionaria Alejandra Lamprea que presenta sintomatología.</p> <ul style="list-style-type: none">• (SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas instalaciones (ESCUELAS) <p>Se inician con las escuelas terapéuticas a los colaboradores con sintomatología osteomuscular los días 14 y 28 de febrero de 2020 dirigida por fisioterapeutas de la ARL Positiva.</p> <ul style="list-style-type: none">• (SVE-DME) Implementación de jornada de actividad terapéutica y pausas activas para la prevención de DME <p>Se realizan actividades de pausas activas a todo el personal de la Entidad los días 14 y 28 de febrero de 2020 dirigida por fisioterapeutas de la ARL Positiva.</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitación en uso y mantenimiento de EPP y peligro y riesgos para el personal de aseo. Charla COVID -19 por parte de Medico Ocupacional de la ARL Positiva a todos los colaboradores. <p>En el periodo del informe, se adelantan actividades de capacitación en prevención del riesgo. La primera capacitación enfocada al uso y mantenimiento de EPP, peligros y riesgos del</p>
--	--	---

		<p>personal de aseo. La segunda enfocada a la prevención del COVID-19 adelantada por un médico de la ARL.</p> <ul style="list-style-type: none">• Realización de la Evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 y aprobación por parte de Gerencia. <p>Como lo establece la ley colombiana en temas de SST, en febrero de 2020 se adelanta la evaluación de estándares mínimos del SG-SST obteniendo un puntaje de 85.5% de cumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none">• Medición de ruido ocupacional por parte un higienista de la ARL. <p>En el mes de marzo de 2020 se adelanta estudio de ruido por parte de un higienista de la ARL Positiva en las nuevas instalaciones del Fondo Adaptación.</p> <ul style="list-style-type: none">• Actividades de prevención y mitigación del COVID-19. El Fondo Adaptación dentro del marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y como medida para prevenir la propagación del Coronavirus COVID-19 dentro del territorio nacional, la Entidad ha establecido las actividades detalladas en el informe adjunto teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional y demás instituciones que apoyan la prevención y contención del COVID-19.• Revisión y ajuste del profesiograma Se adelantan reunión con el Medico de la ARL para realizar la actualización del profesiograma de la Entidad con el fin de identificar los exámenes, paraclínicos y vacunas de acuerdo
--	--	---

		<p>con las actividades de los funcionarios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Valoración cefalocaudal /anamnesis/ charla lavado de manos y uso de tapabocas por parte de Enfermera ARL. <p>El día 24 de marzo se realiza una valoración a los funcionarios y contratistas de la Entidad por parte de una Enfermera de la ARL Positiva con el siguiente alcance:</p> <ul style="list-style-type: none">• Explicación lavada de manos• Uso adecuado de tapabocas• Valoración cefalocaudal /anamnesis. <ul style="list-style-type: none">• Inducción en el SG-SST a subgerente de regiones y funcionarios nuevos - virtual <p>Los días 25 de marzo y 01 de abril de 2020 se adelanta la inducción a los nuevos funcionarios de la Entidad con el fin de explicar de forma general y específica los lineamientos del Sistema de Gestión de SST en la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisión por la dirección y rendición de cuentas de la gestión del Sistema de Seguridad y salud a corte diciembre 2019 y proyección 2020 ante el Comité Táctico el día 11 de marzo de 2020. <p>El día 11 de marzo de 2020 se hace la rendición de cuentas del SG-SST a corte 2019 ante el Comité Táctico de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Diseño de circulares internas 006, 007, 008, 009, 010 sobre medidas preventivas ante el COVID-19 <p>Con el fin de informar oportunamente los mandatos del Gobierno Nacional y establecer lineamientos internos en temas de prevención y contención del COVID-19, la Entidad ha</p>
--	--	--

		<p>establecido diferentes circulares (Circulares 06 10) a dirigidas a todos los colaboradores</p> <p>Elaboración protocolo "Información y seguimiento" Medidas preventivas COVID-19.</p> <p>Se diseña protocolo para la prevención de Covid-19 y se establecen otros lineamientos.</p>
Abril		<p>En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:</p> <p>PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día de la Secretaria: El 26 de abril dio inicio la celebración del día de la secretaria. • Día del niño: En coordinación con Comunicaciones se invitó a todos los funcionarios con hijos para participar de las actividades programadas por Cafam en vivo por sus redes sociales con la realización de dinámicas dirigida a los niños, el cual se llevó a cabo el 25 de abril. • Tarjeta mensual de Feliz cumpleaños: Se envió una tarjeta de cumpleaños por parte de La Entidad a cada colaborador en su mes de cumpleaños. • Incentivo Día de cumpleaños: se otorgó un día libre para el disfrute de cumpleaños en familia, como parte de incentivo o salario emocional promovido por la Entidad a 20 funcionarios del Fondo. • Turnos de descanso semana santa: La Gerencia dispuso que el día de descanso compensado para todos los funcionarios sería el miércoles 8 de abril de manera unificada. • Cofradía a Fondo: El 3 de abril se lanzó la estrategia Cofradía a Fondo con el cual se busca que entre compañeros se acojan unos a otros realizando un acompañamiento permanente y manteniendo una comunicación cercana durante el confinamiento en casa, por la situación generada

por el Covid-19.

- Diligenciamiento Declaración de Bienes y Rentas: El Equipo de Trabajo Gestión del Talento Humano solicitó a través de equipo de comunicaciones, el diligenciamiento del formato de declaración de bienes y rentas en el SIGEP para todos los funcionarios con plazo máximo el 31 de mayo de 2020.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de abril se realizaron o participaron de 6 eventos de entrenamiento o capacitación con 206 personas capacitadas o entrenadas.

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST)

- Reuniones del COPASST
- Capacitaciones al Comité de Convivencia
- (SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos de condiciones de salud musculoesquelética y puestos de trabajo con nuevos ingresos al año 2020
- (SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y sintomatología alta por DME identificados en el PVE 2019 (al puesto de trabajo y al individuo)
- (SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas instalaciones (ESCUELAS)
- (SVE-DME) Implementación de jornada de actividad terapéutica y pausas activas para la prevención de DME
- Elaboración de los estudios previos para el Suministro de elementos de emergencia para Fondo Adaptación.
- Elaboración de los estudios previos para el

		<p>Suministro de elementos para la atención al COVID-19.</p>
	<p>Mayo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diligenciamiento Declaración de Bienes y Rentas El Equipo de Trabajo Gestión del Talento Humano solicitó a través de equipo de comunicaciones, el diligenciamiento del formato de declaración de bienes y rentas en el SIGEP para todos los funcionarios con plazo máximo el 31 de mayo de 2020. <p>PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día de la madre • Tarjeta mensual de Feliz cumpleaños • Incentivo Día de cumpleaños • Actividad Wellness con Cafam <p>PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN</p> <p>En el marco del Plan Institucional de capacitación del Fondo Adaptación, en el mes de mayo se realizaron o participaron de 7 eventos de entrenamiento o capacitación con 143 personas capacitadas o entrenadas.</p> <p>PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones del COPASST • Reuniones del Comité de Convivencia • (SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y sintomatología alta por DME identificados en el PVE 2019 • (SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas instalaciones (ESCUELAS) • (SVE-DME) Implementación de jornada de actividad terapéutica y pausas activas para la prevención de DME

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de Bioseguridad de la Entidad: Se realiza el Protocolo de Bioseguridad de la Entidad y se formaliza mediante la Circular 014 de 20 de mayo de 2020. • Socialización Protocolo de Bioseguridad de la Entidad: Se realiza la socialización del Protocolo de Bioseguridad al Comité estratégico, comité táctico y al personal de la Entidad que va a ingresar de manera permanente o esporádica. • Capacitación en Prevención COVID -19: Se adelanta capacitación en prevención de COVID-19 dirigido al personal de la Entidad que va a ingresar de manera. • Seguimiento al Protocolo de Bioseguridad en la Entidad: Se realiza el seguimiento diario al cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad dentro de la Entidad. • Capacitaciones y charlas en prevención del COVID – 19: Capacitaciones a los colaboradores que asisten a la Entidad de manera presencial en temas de prevención del COVID, lavado de manos, uso de tapabocas, prevención en transporte público, recomendaciones en hogar. • Actualización de los documentos referente al COVID: Matriz de peligros, matriz de EPP y plan de emergencias: Se hace la actualización de varios documentos que son exigidos por la ley colombiano para incluir el virus del COVID-19.
	Junio	Se adjunta en carpeta en Drive el informe de avance de la Política de Talento Humano Durante el primer semestre estaba pendiente de aprobación el PIGA 2020 en el plan de Acción, plena aprobación del comité MIPG.

Bitácora de Seguimiento

(AEG02)_Política de Integridad (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	<p>La Gerencia del Fondo Adaptación, como actividad encaminada a fortalecer las buenas conductas de los servidores públicos bajo la cultura de la legalidad y la ética de lo público y asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular, solicitó a todos los colaboradores de la Entidad, ya sea por vinculación en la planta de personal o por contrato de prestación de servicios, realizar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofertado por la Función Pública.</p> <p>En el desarrollo del mismo, el Equipo de Trabajo de Gestión del Talento Humano y Servicios ha realizado el seguimiento pertinente, por lo cual, se informa que, a la fecha de este reporte, 146 colaboradores han realizado el curso siendo este el 54% de la totalidad de personal.</p> <p>Es importante aclarar que se sigue haciendo el seguimiento solicitando reiteradamente a los líderes de equipo de trabajo requerir la realización del curso a todo el personal a su cargo o bajo su supervisión.</p>
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se adjunta en carpeta en Drive el informe de avance de la Política de Integridad

Bitácora de Seguimiento

(PES2020)_Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones de capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones de colaboración en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

(PES2020)_Planes MIPG - Talento Humano, ajustados de conformidad con la	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

medición FURAG aplicada en 2020	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento


(PES2020)_Avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad, realizado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Bitácora de Seguimiento

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y Gestión de Bienes ejecutado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Se realizó registro de la matriz inicialmente consolidada por el área de Talento Humano, donde está toda la información realizada durante el primer semestre de la vigencia 2020, con todo lo

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	relacionado con el PIGA. Se cumple con el 46.5% ejecutado del 50% proyectado para el primer semestre del 2020 de las actividades del PIGA 2020
--	--

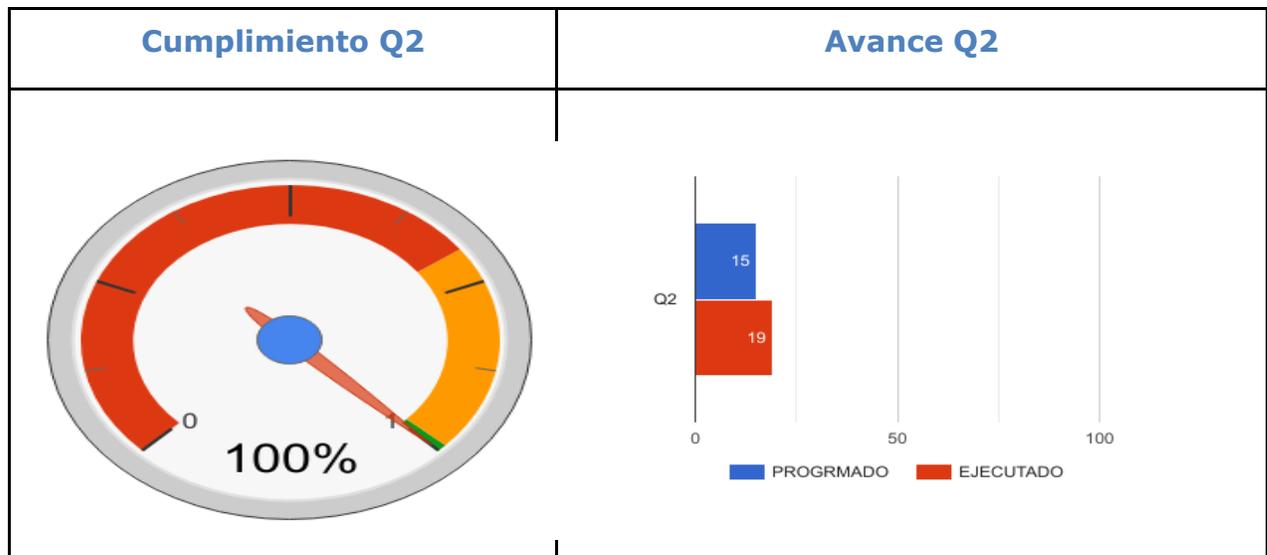

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: ATENCIÓN AL CIUDADANO



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEG03_Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG)* PAAC-2020	(AEG03)_Política de Servicio al Ciudadano (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	40
PES2020_Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	#6	100	0	0	0	100	40

Bitácora de Seguimiento

(AEG03)_Política de Servicio al Ciudadano (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Implementar la Política de Servicio al Ciudadano, la cual está formulada en el Protocolo de Atención al Ciudadano, actualizado en 2019, publicado en la página web de la Entidad y socializado en el mes de diciembre de 2019. Teniendo en cuenta que dicho Protocolo es un documento guía, dirigido a todos los colaboradores de la Entidad, donde se establecen los principales fundamentos que se consideran deben ser conocidos y practicados por todos los implicados en el servicio y la atención al ciudadano, así como los procedimientos que deben ser adoptados y aplicados en forma permanente, con miras a brindar una atención con calidad, bajo los lineamientos definidos en la Política Pública de Servicio al Ciudadano. Por lo anterior la estrategia adoptada para la implementación consistirá en


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>enviar cápsulas informativas con piezas claves del Protocolo con el fin que todos en el Fondo Adaptación, como se mencionó anteriormente, conozcan y apliquen los lineamientos allí establecidos, como por ejemplo: trámite y gestión de PQRSFD, los canales de atención de la Entidad, atención prioritaria, atención a personas con algún tipo de discapacidad física o mental, Carta de trato Digno, entre otras. Esta actividad se realizará con el apoyo del ET de Comunicaciones. Para junio, presentamos las indicaciones para la correcta atención telefónica de los ciudadanos. Adicionalmente, se socializó a través de correo de Prensa los términos de respuesta a las PQRSFD durante el periodo de la emergencia sanitaria, según Art 5° Decreto 491 del 28/03/2020. Así mismo y mediante correo electrónico se socializaron los pasos a seguir al momento de dar cierre final de las PQRSFD desde INFODOC, lo anterior, considerando que es un punto con alta prioridad, toda vez que está dirigido controlar el riesgo de incumplimiento en el trámite oportuno de las PQRSFD.</p>
--	--	--

<p>(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano</p>	<p>Enero</p>	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
	<p>Febrero</p>	<p>Sin registro de avance en el indicador</p>
	<p>Marzo</p>	<p>Durante este mes no se realizó ni agendo la Mesa Sectorial de Atención al Ciudadano. El 24 de febrero de 2020 se realizó la invitación a la capacitación en veedurías y participación ciudadana a cargo de la Personería de Bogotá, la cual se programó inicialmente para el próximo miércoles 25 de marzo del 2020, a las 9:00 a.m. en el auditorio Esteban Jaramillo en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior como compromiso adquirido en la segunda mesa sectorial de Atención al Ciudadano, realizada el pasado 30 de octubre. Dicho evento no se llevó a cabo y será reprogramada una vez pase la emergencia sanitaria</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		que vive nuestro país.
	Abril	Con corte al 31 de marzo de 2020, Ministerio de Hacienda no realizó agenda para Mesa Sectorial de Atención al Ciudadano, sin embargo el 24 de febrero de 2020 realizó la invitación a la capacitación en veedurías y participación ciudadana a cargo de la Personería de Bogotá, la cual se realizará el próximo miércoles 25 de marzo del 2020, a las 9:00 a.m. en el auditorio Esteban Jaramillo en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Carrera 8 No. 6 C – 38. Lo anterior como compromiso adquirido en la segunda mesa sectorial de Atención al Ciudadano, realizada el pasado 30 de octubre. Dicho evento no se llevó a cabo y será reprogramada una vez pase la emergencia sanitaria que vive nuestro país.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

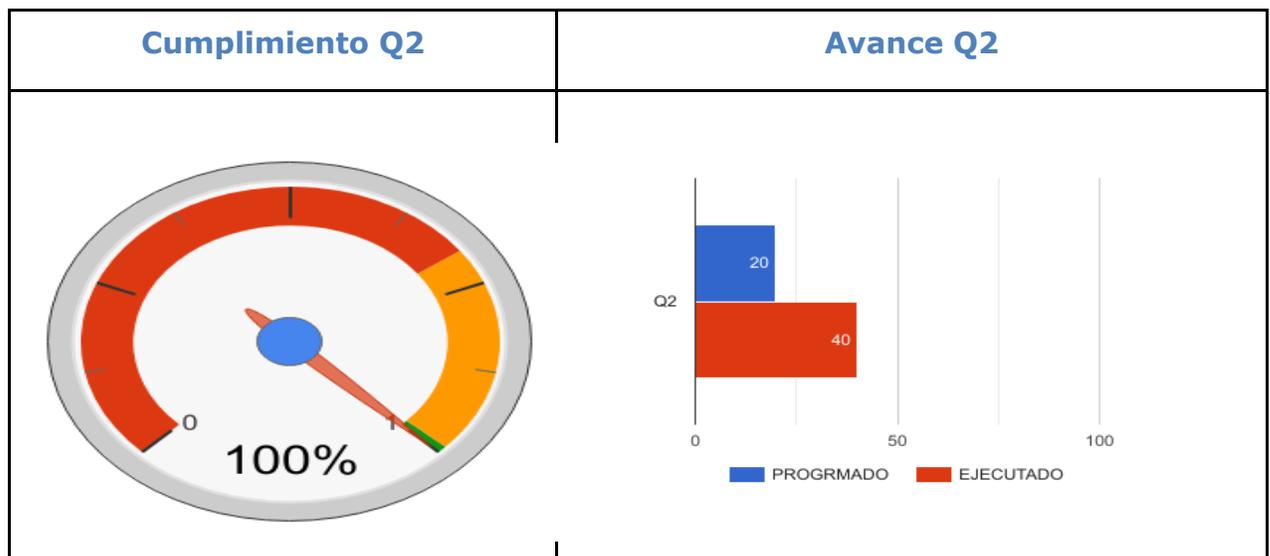

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG04_Implementar la Política de Gestión Documental (MIPG)* PAAC-2020	(AEG04)_Política de Gestión Documental (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	50
PES2020_Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP	(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	#6	100	0	0	0	100	25

Bitácora de Seguimiento

(AEG04)_Política de Gestión Documental (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se adelanta el borrador del documento de la Política de La Gestión Documental del Fondo Adaptación, este documento está sujeto a revisiones y modificaciones por parte de la Secretaría General.
	Abril	Se tiene documento en proceso de revisión.
	Mayo	El documento se encuentra en etapa de revisión para ser presentado en Comité de Gestión y Desempeño para aprobación.
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se participó en la mesa sectorial de Gestión Documental organizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 3 de marzo de 2020.
	Abril	Durante el mes de abril no se presentaron mesas sectoriales.
	Mayo	Durante el mes de mayo no se han citado mesas sectoriales.
	Junio	A la fecha no se han programado mesas técnicas sectoriales por parte del MHCP

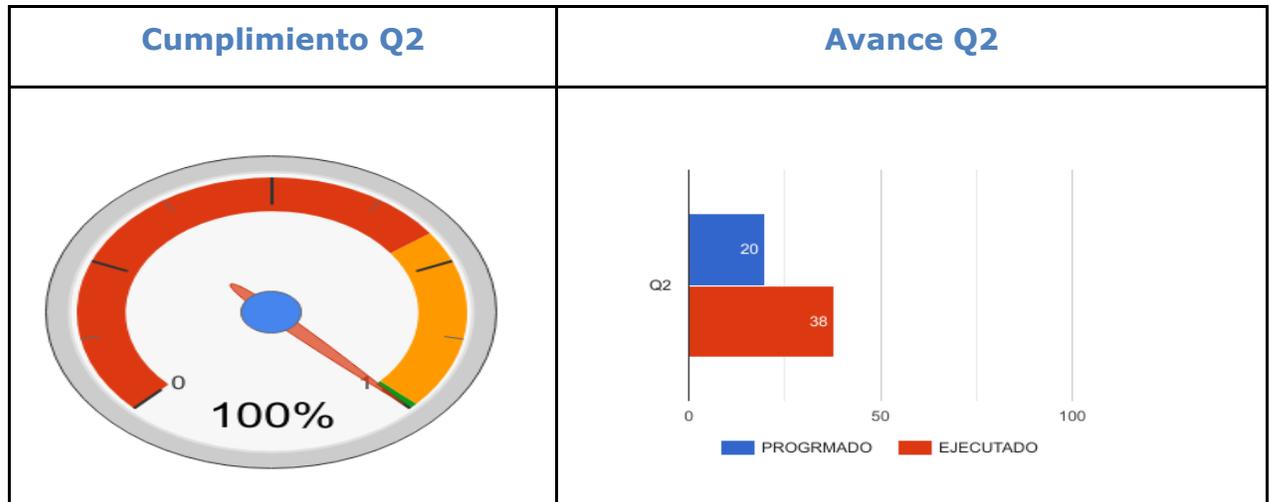

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG05_Ejecutar la Estrategia de Transparencia en las compras públicas (MIPG)*	(AEG05)_Transparencia en las compras públicas, ejecutada	#6	100	0	40	0	60	48.6

Bitácora de Seguimiento

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEG05)_Transparencia en las compras públicas, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

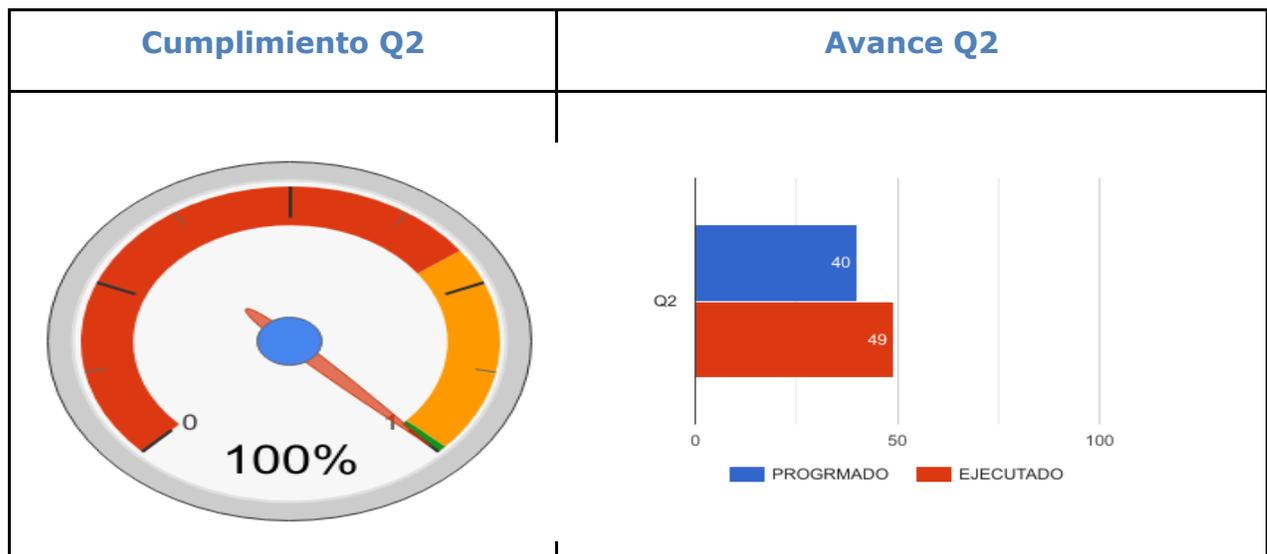

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARIA GENERAL
Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG06_Implementar la Política de Defensa Jurídica (MIPG)*	(AEG06)_Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	100
PES2020_Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	(PES2020)_Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	#6	100	0	40	0	60	40
PES2020_Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda	(PES2020)_Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	#6	2	0	0	0	2	1
Publicar Actos administrativos respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Actos administrativos respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021, publicados	#6	2	0	0	2	0	0
Realizar capacitaciones respecto a la Política de Prevención de Daño	Capacitaciones respecto a la Política de	#6	3	0	0	0	3	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Antijurídico 2020 2021	Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021, realizadas							
Implementar lineamientos respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021	Lineamientos respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021, implementados	#6	300	0	0	0	300	0

Bitácora de Seguimiento

(AEG06)_Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se reporta el avance conforme a la aprobación de la Política de Prevención de Daño Antijurídico por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Se desarrollaron las actividades y tareas tendientes a obtener una Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Entidad debidamente aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así mismo, aprobada por parte del Comité de Conciliación y adoptada mediante la resolución 136 del 23 de abril de 2020
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Asistencia a la primera sesión del Subcomité de Defensa Judicial del Sector Hacienda llevada a cabo el 10 de junio desde las 3:00 p.m. y las 5:30 p.m.


Actos administrativos respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021, publicados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Capacitaciones respecto a la	Enero	Sin registro de avance en el indicador
------------------------------	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021, realizadas	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Lineamientos respecto a la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2020 2021, implementados	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

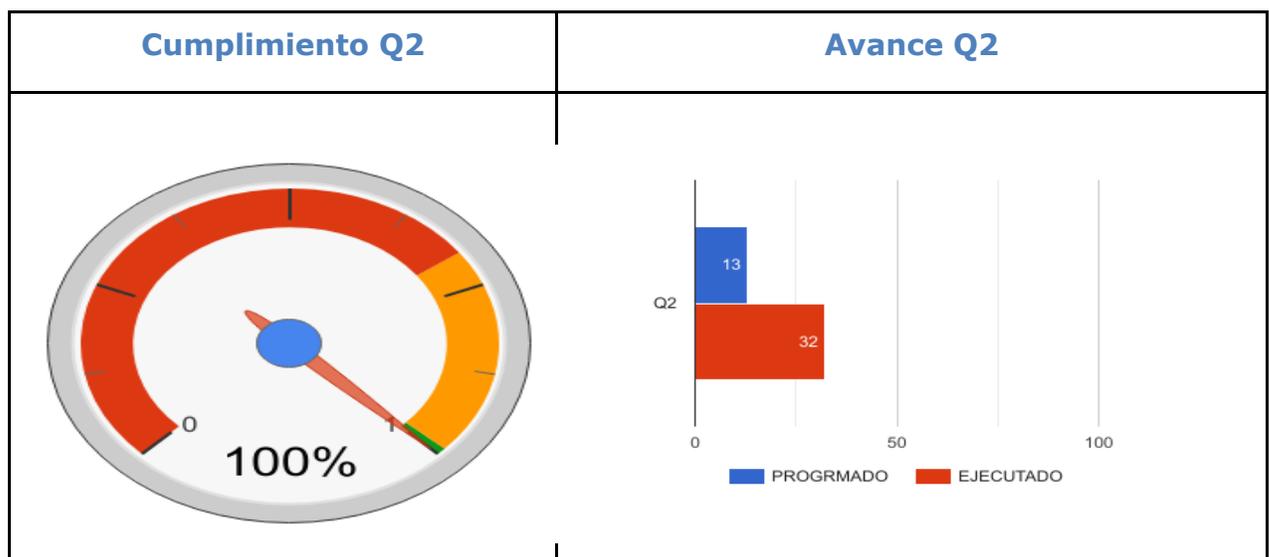



6. Seguimiento Indicadores Plan de Acción de Alcance

INDICADOR:	META 2020:	RESPONSABLES:	CALCULA:
Ejecución Plan de Contratación	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Contractual
Ejecución Presupuesto Total (obligación/apropiación)	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Funcionamiento	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de funcionamiento	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Inversión	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de inversión	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Total	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Reserva	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC reserva	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Vigencia	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC vigencia	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	10%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen con austeridad	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	<15%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMAFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
PRESUPUESTO	Ejecución Plan de Contratación	#6	100	0	0	0	100	0.06
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	#6	95	0	0	0	95	95
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Funcionamiento	#6	95	0	0	0	95	44
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Inversión	#6	100	0	0	0	100	99
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Total	#6	70	0	0	0	70	27
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Reserva	#6	100	0	0	0	100	46
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Vigencia	#6	70	0	0	0	70	0
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	#6	10	0	0	0	10	0
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	#6	15	0	0	0	15	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Bitácora de Seguimiento

Ejecución Plan de Contratación	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	El porcentaje de ejecución al mes de Abril 2020 es de 0,06.
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	Enero	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación total asignada a la Entidad, se han comprometido 1,13% que corresponden a los recursos de funcionamiento. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Febrero	Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la apropiación total asignada a la Entidad, se ha comprometido el 1,48% que corresponde a los recursos de funcionamiento. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Marzo	Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación total asignada a la Entidad, se ha comprometido el 1,91% que corresponde a los recursos de funcionamiento, toda vez que los recursos de inversión no han presentado movimiento. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Abril	Debido a que el avance registrado en meses anteriores es acumulado, se duplicó la información

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		en el aplicativo, al mes de Abril 2020 el total acumulado es de 2,51%
	Mayo	Debido a que el avance registrado en meses anteriores corresponde al acumulado, se duplicó la información en el aplicativo, al mes de mayo 2020 el total acumulado es del 2,88%.
	Junio	Indicador ejecución total a junio 2020 conforme reportes de ejecución de SIIF Nación.

Ejecución Presupuesto Funcionamiento	Enero	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han comprometido el 15,34% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Febrero	Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han comprometido el 20,16% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Marzo	Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han comprometido el 26% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Abril	Debido a que se registró en el aplicativo el % acumulado en los meses anteriores, se duplica el nuevo avance acumulado, toda vez que al mes de abril el % de ejecución es del 33,48%.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Mayo	Con corte al 31 de mayo de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se ha comprometido el 38,56% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Junio	Indicador ejecución de funcionamiento a junio 2020 conforme reportes de ejecución de SIIF Nación.

Ejecución Presupuesto Inversión	Enero	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han comprometido recursos toda vez que el proyecto de Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la información no ha solicitado los recursos. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Febrero	Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han comprometido recursos toda vez que el proyecto de Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la información no ha solicitado los recursos. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Marzo	Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		de inversión no se han comprometido recursos toda vez que el proyecto de Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la información no ha solicitado los recursos. La meta propuesta del 95% corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Abril	El porcentaje de ejecución al mes de Abril 2020 es de 0,06%.
	Mayo	El porcentaje de ejecución acumulado al mes de mayo 2020 es del 0,06%. El aplicativo solo recibe valores enteros.
	Junio	Indicador ejecución de inversión a junio 2020 conforme reportes de ejecución de SIIF Nación.

Ejecución PAC Total	Enero	El porcentaje de ejecución fue del 71,88% con respecto a la meta programada en el plan de pagos, la desviación de los \$21.888 millones no ejecutados, fueron aportados por Transporte con \$5.942 millones y vivienda con \$4.318 millones. Dentro de los pagos del mes de Enero están incluidos los pagos ejecutados correspondientes a las Cuentas por pagar de la vigencia 2019 y los pagos del mes de Enero de 2020. El día 22 de Enero se recibió por parte del Ministerio de Hacienda un giro de recursos por valor de \$80.737 Millones de Pesos. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de enero de 2020 frente a la meta total de la vigencia corresponde al 9%.
	Febrero	El porcentaje de ejecución fue del 95,71%. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por encima del 100%, como fue el caso de Medio ambiente,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<p>Jarillón de Cali, Gramalote y Educación. Estos cuatro sectores aportaron una cifra absoluta por encima de su meta de \$2.740 millones. Durante el mes de febrero se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$35.104 millones abonados el día 26 de febrero de 2020. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta total asignada de para el año, corresponde al 4%.</p>
Marzo	<p>El porcentaje de ejecución fue del 77,59%. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por encima del 100%, como fue el caso de Acueducto, Jarillón de Cali y Transporte. Estos tres sectores aportaron una cifra absoluta por encima de su meta de \$6.043 millones.</p> <p>Durante el mes de Marzo se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$57.443 mil millones abonados el día 27 de Marzo de 2020. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Marzo de 2020 en relación a la meta total asignada para el año, corresponde al 5%.</p>
Abril	<p>El porcentaje de ejecución fue del 29,46%. Esta ejecución fue obtenida bajo la circunstancia de la declaratoria del estado de emergencia y el confinamiento obligatorio.</p> <p>Durante el mes de Abril no se tramitó ninguna solicitud de giro de recursos al Ministerio de Hacienda, ya que del saldo de meses anteriores se contaba con recursos suficientes para amparar los pagos programados para el mes de Abril; y teniendo en cuenta que no se han agotado los recursos de reserva presupuestal, aún no se ha programado giro de recursos de vigencia. Con respecto a la meta total anual del PAC, de acuerdo a la herramienta que administra la Oficina Asesora de Planeación (Promedio Ponderado), el avance acumulado al mes de Abril es del 20%.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<p>Mayo</p>	<p>El porcentaje de ejecución fue del 73% para el periodo del mes de mayo.</p> <p>Durante el mes de Mayo no se tramitó ninguna solicitud de giro de recursos al Ministerio de Hacienda, ya que del saldo de meses anteriores se contaba con recursos suficientes para amparar los pagos programados para el mes de Mayo; y teniendo en cuenta que no se han agotado los recursos de reserva presupuestal, aún no se ha programado giro de recursos de vigencia.</p> <p>Con respecto a la meta total anual del PAC, de acuerdo a la herramienta que administra la Oficina Asesora de Planeación (Promedio Ponderado), el avance acumulado al mes de Abril es del 25%.</p>
	<p>Junio</p>	<p>El porcentaje de ejecución fue del 9,79% para el periodo del mes de Junio.</p> <p>Durante el mes de Junio se tramitó una solicitud de giro de recursos al Ministerio de Hacienda por valor de \$13.449 millones, la cual fue girada por la DTN, el día 30 de junio; y teniendo en cuenta que no se han agotado los recursos de reserva presupuestal, aún no se ha programado giro de recursos de vigencia.</p> <p>Con respecto a la meta total anual del PAC, de acuerdo a la herramienta que administra la Oficina Asesora de Planeación (Promedio Ponderado), el avance acumulado al mes de Junio es del 26%.</p>

	<p>Enero</p>	<p>El porcentaje de ejecución fue del 71,88% con respecto a la meta programada en el plan de pagos, la desviación de los \$21.888 millones no ejecutados, fueron aportados por Transporte con \$5.942 millones y vivienda con \$4.318 millones. Dentro de los pagos del mes de Enero están incluidos los pagos ejecutados correspondientes a las Cuentas por pagar de la vigencia 2019 y los</p>
--	--------------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Ejecución PAC Reserva		pagos del mes de Enero de 2020. El día 22 de Enero se recibió por parte del Ministerio de Hacienda un giro de recursos por valor de \$80.737 millones de pesos. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta total asignada de ejecución de recursos de la reserva para el año, corresponde al 15%.
	Febrero	El porcentaje de ejecución fue del 95,71%. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por encima del 100%, como fue el caso de Medio ambiente, Jarillón de Cali, Gramalote y Educación. Estos cuatro sectores aportaron una cifra absoluta por encima de su meta de \$2.740 millones. Durante el mes de febrero se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$35.104 mil millones abonados el día 26 de febrero de 2020. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta total asignada de ejecución de recursos de la reserva para el año, corresponde al 7%.
	Marzo	El porcentaje de ejecución fue del 77,59%. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por encima del 100%, como fue el caso de Acueducto, Jarillón de Cali y Transporte. Estos tres sectores aportaron una cifra absoluta por encima de su meta de \$6.043 millones. Durante el mes de Marzo se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$57.443 mil millones abonados el día 27 de Marzo de 2020. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Marzo de 2020 en relación a la meta total asignada de ejecución de recursos de la reserva para el año, corresponde al 9%.
	Abril	El porcentaje de ejecución fue del 29,46%. Esta ejecución fue obtenida bajo la circunstancia de la declaratoria del estado de emergencia y el confinamiento obligatorio.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>Durante el mes de Abril no se tramitó ninguna solicitud de giro de recursos al Ministerio de Hacienda, ya que del saldo de meses anteriores se contaba con recursos suficientes para amparar los pagos programados para el mes de Abril; y teniendo en cuenta que no se han agotado los recursos de reserva presupuestal, aún no se ha programado giro de recursos de vigencia. Con respecto a la meta total anual de la Reserva PAC, de acuerdo a la herramienta que administra la Oficina Asesora de Planeación (Promedio Ponderado), el avance acumulado al mes de Abril es del 34%.</p>
	<p>Mayo</p>	<p>El porcentaje de ejecución fue del 73% para el periodo del mes de mayo.</p> <p>Durante el mes de Mayo no se tramitó ninguna solicitud de giro de recursos al Ministerio de Hacienda, ya que del saldo de meses anteriores se contaba con recursos suficientes para amparar los pagos programados para el mes de Mayo; y teniendo en cuenta que no se han agotado los recursos de reserva presupuestal, aún no se ha programado giro de recursos de vigencia.</p> <p>Con respecto a la meta total anual de la Reserva PAC, de acuerdo a la herramienta que administra la Oficina Asesora de Planeación (Promedio Ponderado), el avance acumulado al mes de Mayo es del 44%.</p>
	<p>Junio</p>	<p>El porcentaje de ejecución fue del 9,79% para el periodo del mes de JUNIO.</p> <p>Durante el mes de Junio se tramitó una solicitud de giro de recursos al Ministerio de Hacienda por valor de \$13.449 millones, la cual fue girada el día 30 de junio; y teniendo en cuenta que no se han agotado los recursos de reserva presupuestal, aún no se ha programado giro de recursos de vigencia.</p> <p>Con respecto a la meta total anual de la Reserva</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		PAC, de acuerdo a la herramienta que administra la Oficina Asesora de Planeación (Promedio Ponderado), el avance acumulado al mes de Junio es del 46%.
--	--	--

Ejecución PAC Vigencia	Enero	En el mes de enero no se programó ejecución de recursos de la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos.
	Febrero	En el mes de febrero no se programó ejecución de recursos de la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos.
	Marzo	En el mes de Marzo no se programó ejecución de recursos de la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos.
	Abril	Para el mes de ABRIL no se programó ejecución de recursos de vigencia.
	Mayo	Para el mes de MAYO no se programó ejecución de recursos de vigencia.
	Junio	Para el mes de JUNIO no se programó ejecución de recursos de vigencia

Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

Porcentaje de reducción	Enero	Sin registro de avance en el indicador
-------------------------	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
	Abril	Sin registro de avance en el indicador
	Mayo	Sin registro de avance en el indicador
	Junio	Sin registro de avance en el indicador

