



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controls v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR 6-5 Bonheiden 712-1 NO
ADRES INSTALLATIE: Oude Brugleem 2-4
Laken

EIGENAAR: KIMMERS NV (App. A2-R)
Adres: op adres
OPDRACHTGEVER: D. de Clercq B.V.B.A.
Adres: Heerlebeem, Lemperweg 1 Oudmarc
INSTALLATEUR: J. de C.
Adres:
BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: Electabel
Teller nr.:
Index: [DAG] - NACHT

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 07-12-2005 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwaring ; Type der lokalen: Residentieel (App. A2-R)
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 met Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 85 ~~87-99~~
Aansluiting: Spanning Max 230 V Bescherming van de aansluiting: max 40 A A Alg. schakelaar: type: ADS 40 A / 0,3
Netaftakkabel: type: EXVB 4x50 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XVB 4x70 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; RA: 1,26 Ohm; RI tot: > 1 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40 A / 0,3 mA: van A tot J.
ADS 40 A / 0,03 mA: H - I - J.

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - ~~Controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 273) (ARAB art. 262)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P, E21, E21P, E32, E32P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - nee
NOTA'S Badkamer moet nog te plaatsen

Gezien en
[Handtekening]

3. INBREUKEN:

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is niet - conform. De algemene ADS ~~was~~ is ~~ward~~ is verzegeld en het (de) één draadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7 december 2005 (art. 271 AREI) (art. 273 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie ~~geen~~ geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK
VERENIGING VOOR
ARBEIDSVEILIGHEID DOOR
TECHNIEK EN CONTROLS
2820 BONHEIDEN
Agente D'Industrie
Tel: 015/55 51 51



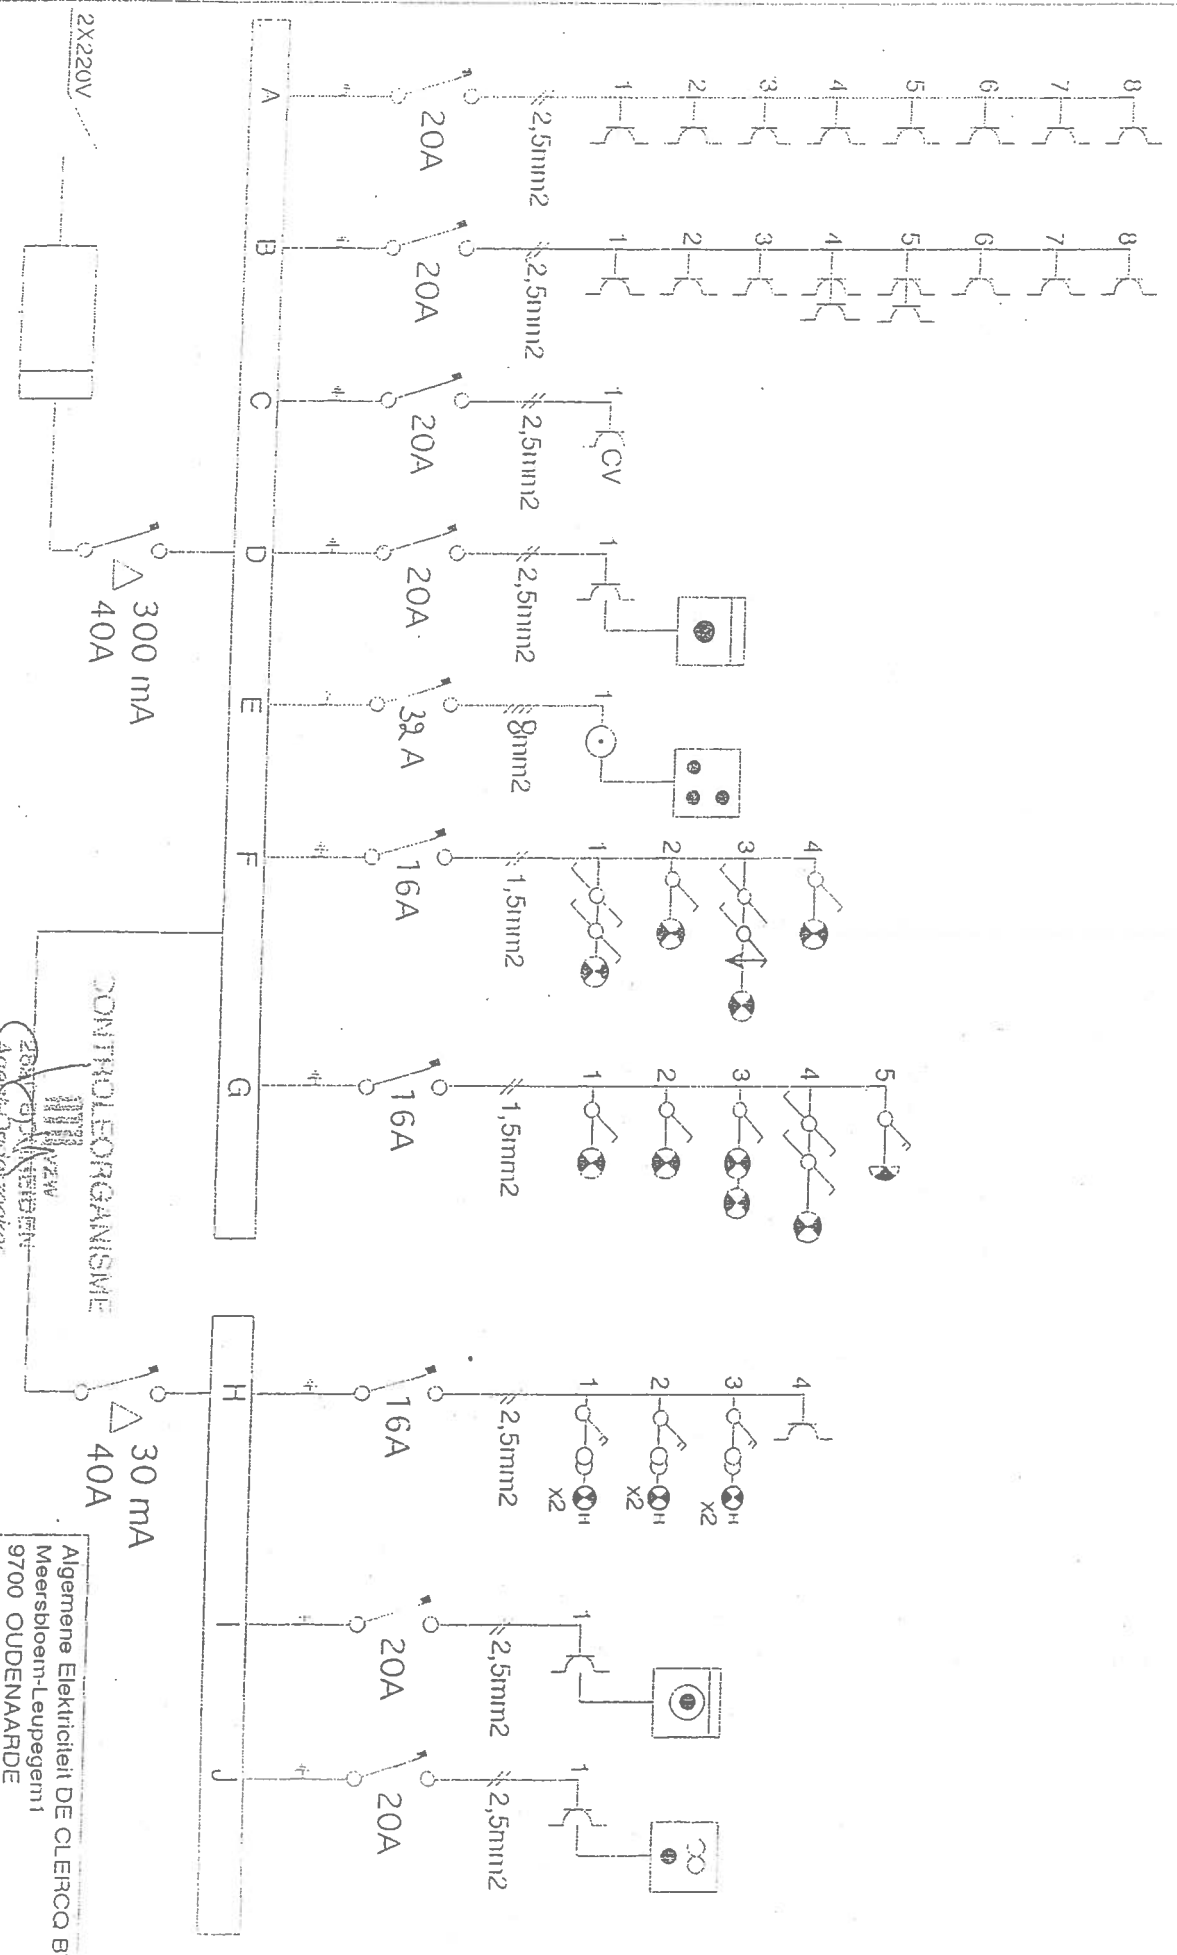

CONTROLEORGANISME

20A
 NIEUW
 Agem. Drua-zoeker
 Jan GOETTELIN

Algemene Elektriciteit DE CLERCO BVBA
 Meersbloem-Leupegem 1
 9700 OUDENAARDE
 HIMMOS NV DURMEZICHT (app A2-R)
 Oude Bruglaan 2-4
 9160 LOKEREN

