

Beredskabsplan for Assensvejens Vandværk Kildevej 9 5600 Faaborg



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Jr. nr.

13.02.00-104-02-14


E-mail : helgerosendahl@assensvejensvand.dk

Hjemmeside: <http://assensvejensvand.dk>

CVR: 29386714

Jupiter ID: 00081291

Senest opdateret: 18.12. 2017

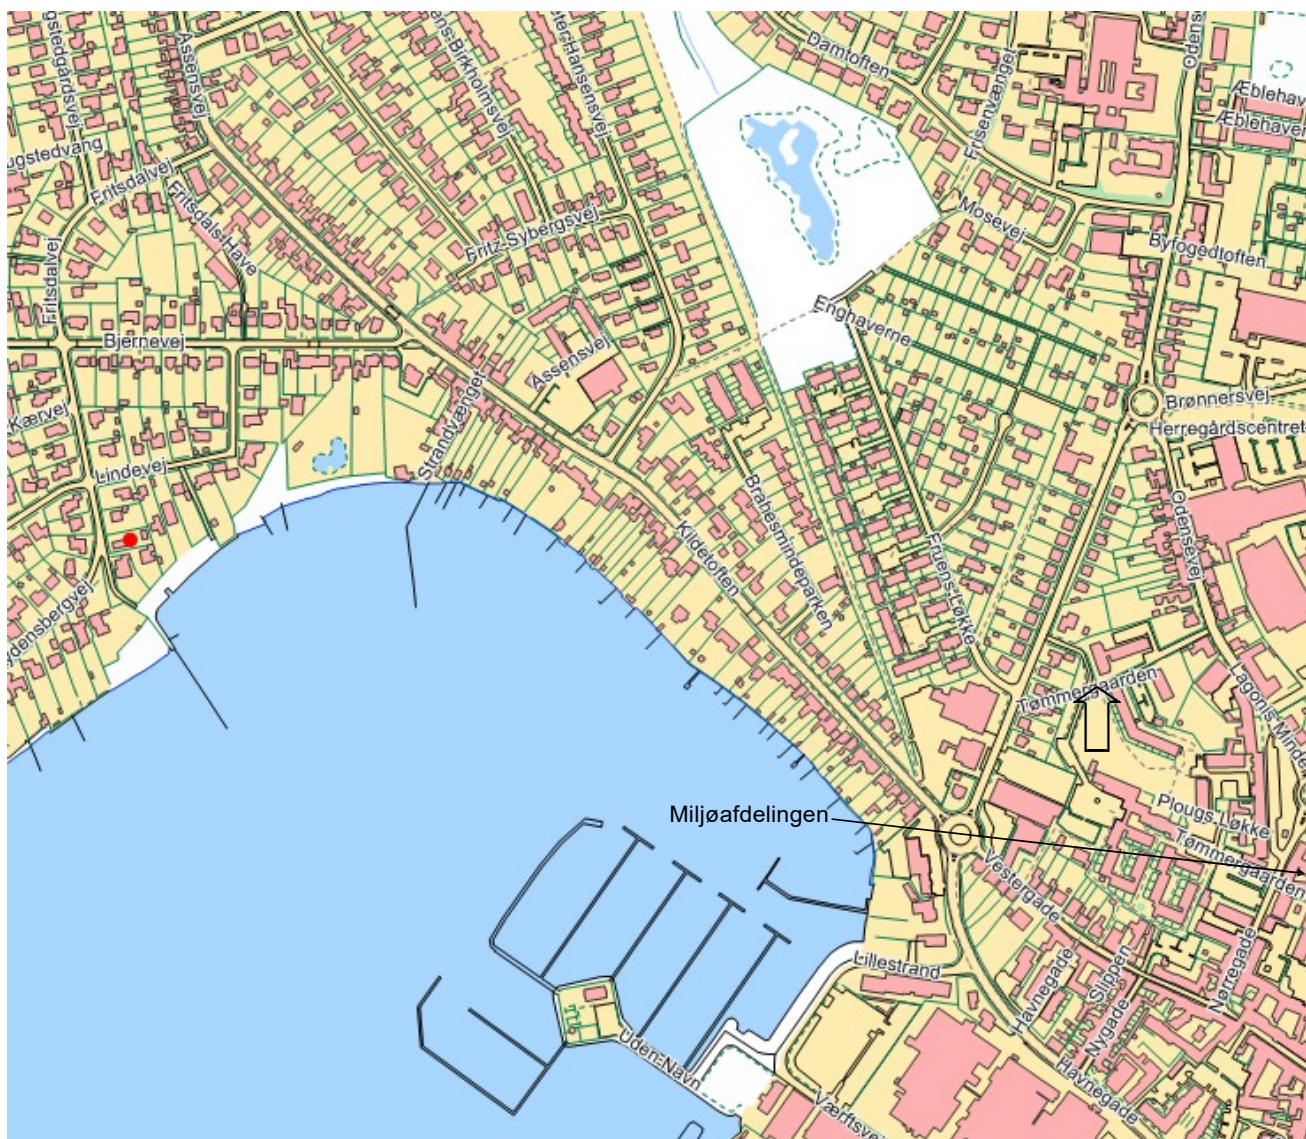

Rød prik angiver hvor vandværket ligger i Faaborg

Planens indehold:

Telefonliste over ansvarlige i vandværket	3
Telefonliste over følsomme forbrugere	4
Telefonliste over vandværkets firmaer	5
Kort over ledningsnettet	6
Nøgletal for ledningsnettet og prøvetagningssteder på nettet	7
Nødforbindelser/Trykforøgerstation	8
Vandforbrug på årsbasis og forbrugskategorier	9
Boringernes placering i forhold til vandværk	10
Indvindingsopland for Assensvejens Vandværk.	11
Skema over vandværkets analyser	12-13
Bemærkninger til skema over vandværkets analyser	14-15
Processkema over vandværket	16
Seneste tilsynsrapport	17-22
Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget.	23
Beskrivelse af kvalitetssikring og bestemmelser i forhold til vandforsyningsplanen	24

Alarmeringsliste

Vandværkets vagtnummer:

Funktion	Navn	Telefon	mobil
Kasserer	Helge Rosendahl	6261 8026	4011 1600
Bestyrelsesmedlem	Bo Hørkild Andersen	2577 7182	2251 9027

Vandværket har fordelt ansvaret for de forskellige opgaver på følgende måde.

Ansvarsområde	Kontaktperson	telefon	mobil
Alarmering af forbrugerne	Helge Rosendahl	6261 8026	4011 1160
Alarmering af forbrugerne	Bo Hørkild Andersen		2251 9027
Kontakt til pressen	Helge Rosendahl		
Kontakt til pressen			
Nødforsyning	Gærup vvv	6265 1111	4046 8765
Nødforsyning			
Genopretning	Gærup vvs	6265 1111	4046 8765
Genopretning			

Alarmering af forbrugerne sker med SMS

Eksport: Vandværk leverer ikke vand til ejendomme i andre kommuner.

Liste over følsomme forbrugere.

Følsomhedskategori betegner hvordan forbrugeren er følsom.

"K" er kvaliteten af vandet, "M" er forbruget af vand pr. år /365 døgn

Navn og adresse	Telefon	Mobil	følsomheds kategori	Mængde pr. døgn
Toftegårdsskolen Toftegårdsvej 7 5600 Faaborg	7253 0360		K 586 elever	
Toftegårdsskolens SFO Toftegårdsvej 7 5600 Faaborg	7253 3520		k	
<u>Toftegaardens Børnehaver:</u> Børnehuset Toftegården Saugstedvang 1 A 5600 Faaborg Børnehuset Saugstedgaard Assensvej 85A 5600 Faaborg	7253 4185		K 126 pladser	
Faaborg produktionsskole Nyborgvej 58 5600 Faaborg	6261 9105		K køkken kantine	

Liste over firmaer der i en beredskabssituation skal varetage drift, vedligehold og teknisk support

Område	Firma	Telefon	Mobil
Ledninger	Gærup vvs	6265 1111	4046 8765
VVS- installationer	Gærup vvs	6265 1111	4046 8765
EI- installationer	Faaborg EI-service	6261 3969	2090 3687
Styring	Faaborg EI-service	6261 3969	2090 3687
Laboratorie	Eurofins	7022 4266	
Entreprenør	Millinge Maskinstation	6261 9027	4062 3227
Teknisk rådgiver	Jørgen Krog Andersen	9666 1011	6039 9660

Kort over ledningsnettet



— Grænse for forsyningsområde

○ Nødforbindelse

— Ledningsnet

● Trykforøger

5 Sted for prøvetagning på ledningsnettet. Nummeret modsvarer nummeret i adresselisten på side 7.

Nøgletal for ledningsnettet

Afgangstryk	38 mVS
Terrænkote vandværk	5 m
Udpumpet	94.009 m ³
Antal tilslutninger	916 stk.
Ledningstab:	3,5 %
Forsyningsledninger	25 km og 5 km jordledninger
Materiale på ledningerne	PE
Tilbageløbssikring hos relevante virksomheder	Ingen virksomheder der kræver ekstra tilbageløbssikring.
Udskylningsmuligheder	Via brandhaner
Brandhaner på ledningsnettet:	10 brandhaner, vandværket ønsker ikke overtage nogen af dem.
Trykforøgere på ledningsnettet:	Saugstedlund 28A, Terrænkote 15 m. Afgangstryk IKKE OPLYST

Prøvetagningssteder på ledningsnettet:

Nr. i kort	Adresse	Postnummer	Prøvetagning i hane i:
1	Kildevej 12	5600 Faaborg	kælder
2	Saugstedlund 103	5600 Faaborg	bryggers
3	Saugstedlund 28A	5600 Faaborg	trykforøger
4	Toftegårdsvej 7	5600 Faaborg	køkken
5	Margrethevang 57	5600 Faaborg	bryggers
6			

Beskrivelse af nødforsyning og dens vedligehold.

Fast forbindelse med FFV VAND. Der er tale om en konstant åben forbindelse (Kan dække hele forsyningsnettet). FFV kan forsyne både fra vandværket og fra trykforøgeren på Saugstedlund. Det betyder at vandværk eller trykforøger kan tages midlertidigt ud af drift uden det har konsekvenser for forbrugerne.

Saugstedlund 29 A, 5600 Faaborg.

Forbindelse til FFV VAND. Det er en forsyningsforbindelse, da FFV VAND supplerer Assensvejens Vandværk med vand til fortynding af chlorid.

Kontakt til FFV VAND A/S:

Driftsleder Anders Fog, mobil 5167 1000

FFV Omstillingen og døgnvagt: 6261 1666



Vedligehold: Den er i daglig drift og vedligeholdes løbende som øvrigt materiel.

Indberetning 2015

Vandværk:

Assensvejens Vandværk

Udfyld venligst de grønne felter.

Oplysninger til Miljøportalen

Oppumpet mængde fra boring (målt)

kubikmeter

77391

Udpumpet mængde eget vand afgang vandværk (målt)

72071

Modtaget på vandværket/i beholder fra andet vandværk*

14208

Modtaget på ledningsnet fra andet vandværk*

0

Leveret til andet vandværk*

0

Udpumpet til vandværkets forbrugere

86279

* udfyldes på siden "Nabovandværk"

Oplysning til takstgodkendelsen

Solgt til forbrugerne i 2015

Fast bidrag (stk)

Kubikmeter

915

72071

Boringernes placering i forhold til vandværk

Den sorte streg er den nærmeste del af indvindingsoplandet.


På modstående side ses hele indvindingsoplandet.



Indvindingsopland for Assensvejens Vandværk.

Den sorte streg gennem kortet er en del af Anneksværkets indvindingsopland

Kortet er 1: 10.000, indvindingsoplandet er ca. 1,65 km²

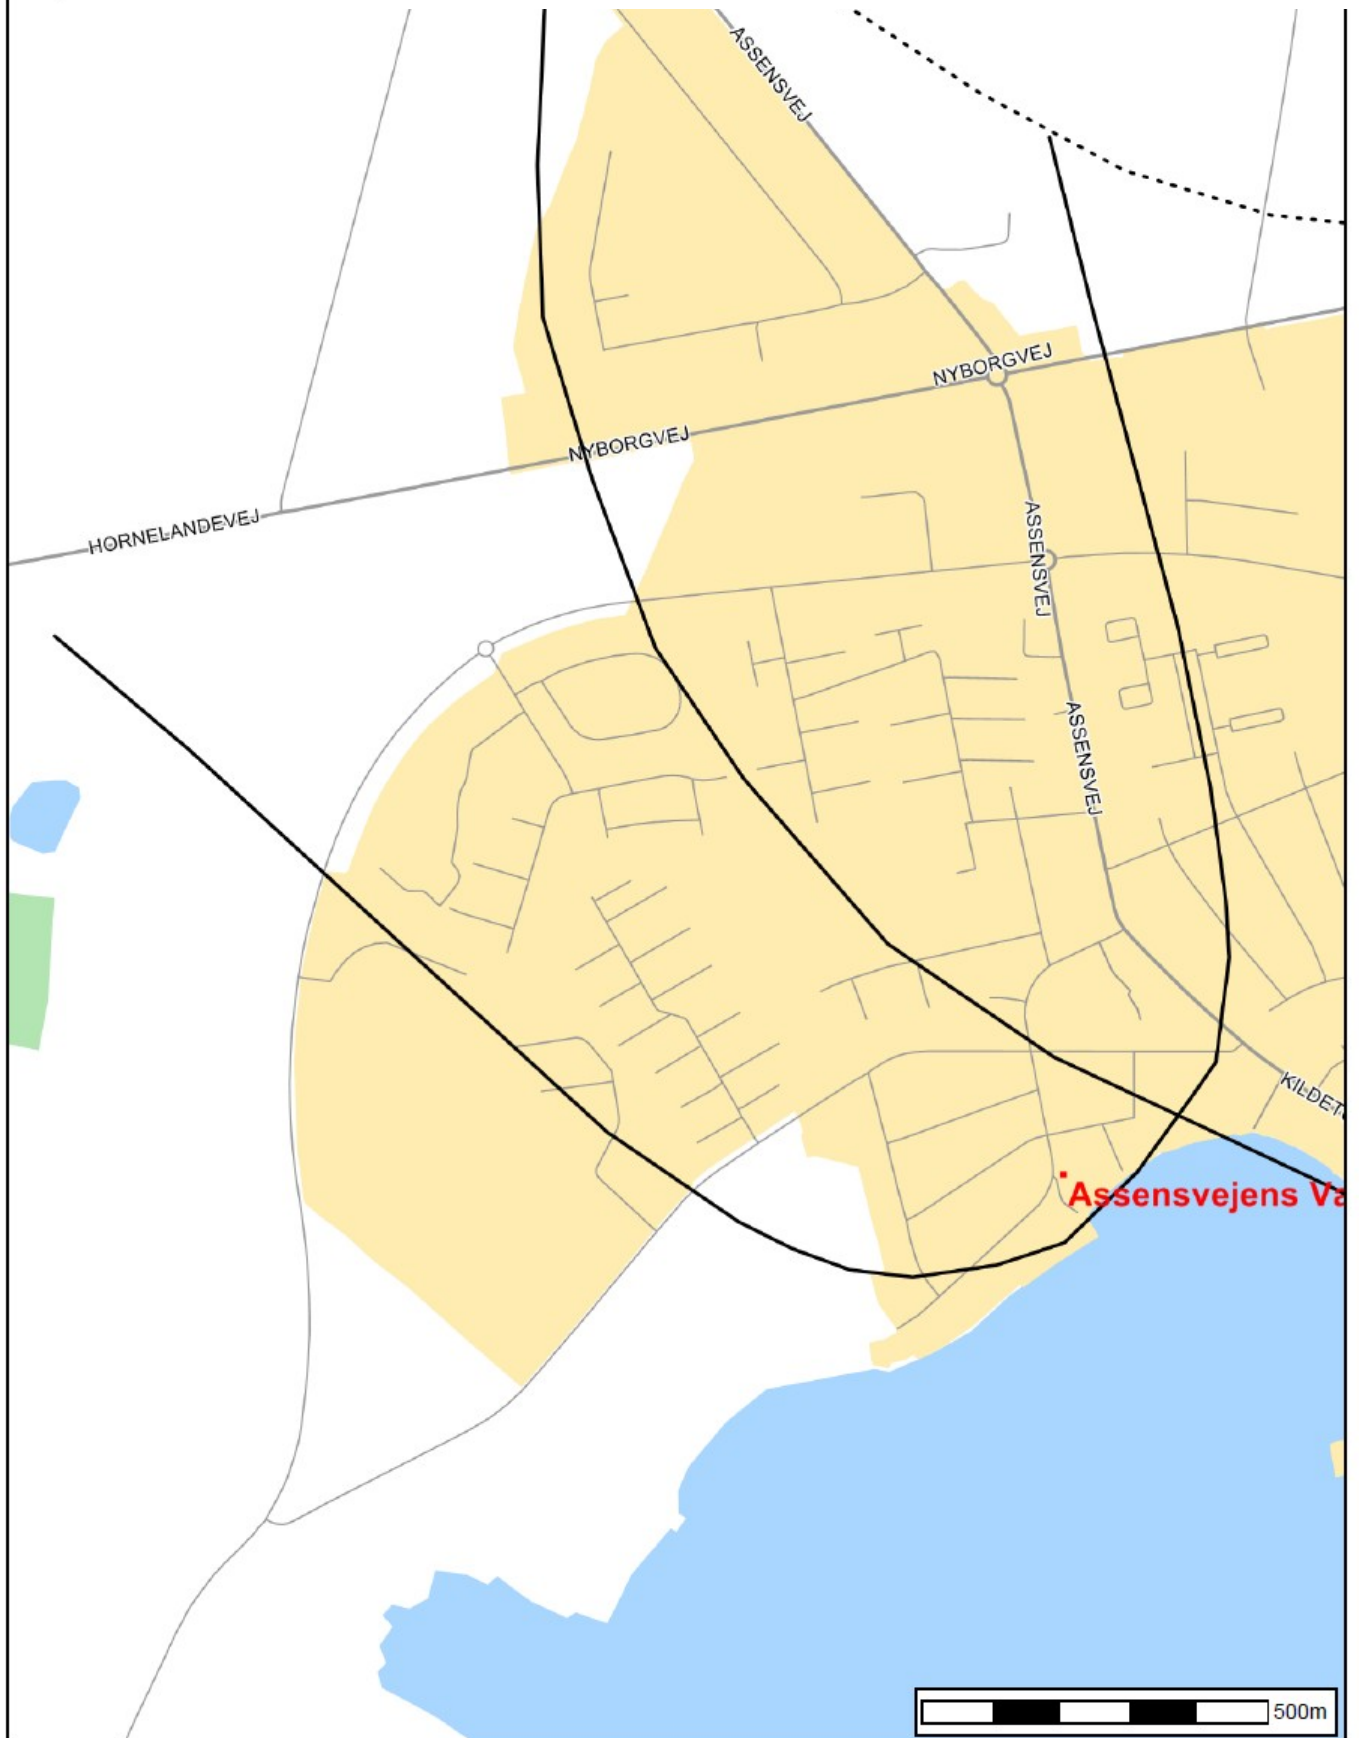

Vandanalyser 2010-2025

Ar 20XX 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[illegible][illegible][illegible]

Næsten samtlige begrænsede kontroller er taget på Saugstedlund 103. Vi skal tale med vandværket om at få mere repræsentative prøver fra ledningsnettet.

Den 5. april 2017 blev kontrolprogrammet ændret. Der er ikke længere krav om MTBE afgang vv.

Boringskontrol på næste side.

1/2 dag/måned for prøvetagningen

☒ Tilfredsstillende prøve

Stoffet er påvist, men grænseværdien er overholdt. Bruges kun for miljøfremmede stoffer.

Grænseværdi på en eller flere parametre er overskredet.

Logbog over overskridelser eller påviste miljøfremmede stoffer er på side 14-15

Boringskontrol:

DGU 163.160

1 gang hvert 4. år	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Obligatorisk program			3/5				17/10									
Halogenerede alifatiske kulbrinter				29/5												
MTBE				25/9												
1 gang hvert år*																
BAM				25/5	6/10	2/11	17/10									
Opfølgende prøve						2/2										

DGU 163.161

1 gang hvert 4. år	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Obligatorisk program				29/5												
Halogenerede alifatiske kulbrinter				29/5												
MTBE				29/5												
1 gang hvert år*																
BAM			18/10				17/10									
Opfølgende prøve						2/2										

DGU 163.209

1 gang hvert 4. år	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Obligatorisk program					13/5											
Halogenerede alifatiske kulbrinter						2/11										
MTBE		18/1				2/11										
1 gang hvert år*																
BAM			18/10	16/10		2/11	17/10									
opfølgende prøve						2/2										

Fra én af boringerne

hvert år:	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Chlorid	7/10	20/10	18/10	16/10	6/10	2/11										
Natrium	7/10	20/10	18/10	16/10	6/10	2/11										
Ledningsevne	7/10	20/10	18/10	16/10	6/10	2/11										
Chlorid	7/10	20/10	18/10		6/10	2/11										
Natrium	7/10	20/10	18/10		6/10	2/11										
Ledningsevne	7/10	20/10	18/10		6/10	2/11										

Den 5. april 2017 blev kontrolprogrammet ændret: ikke længere krav om halogenerede alifatiske kulbrinter og MTBE på boringerne.

1/2 dag/måned for prøvetagningen

Tilfredsstillende prøve

Stoffet er påvist, men grænseværdien er overholdt. Bruges kun for miljøfremmede stoffer.

Grænseværdi på en eller flere parametre er overskredet.

Bemærkninger til analyseprogrammet:

Vandværkets boringer ligger tæt ved kysten. Indholdet af klorid og natrium har i mange år været højt. Der fortyndes med vand fra FFV VAND, for at opnå acceptabel vandkvalitet.

For at følge udviklingen i indholdet af chlorid og natrium, er der ekstra kontrol med disse stoffer. Jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes vandindvindingstilladelse af 22.09.2008.

Vandværket tager frivilligt supplerende analyser for BAM i boringerne hvert år, efter aftale med kommunen den 10. marts 2011.

Det øvrige kontrolprogram er fastsat af Faaborg Kommune den 29.januar 2002.

I tabellen indføres årets resultater af **BAM** i µl/l på vandværk og boringer

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vandværk	0,032	0,032	0,030	0,022	0,019	0,019	0,013									
vandværk						0,023	0,021									
163.160			0,035	0,042	0,037	0,030	0,03									
163.161			<0,01	<0,01	0,017	0,011	0,014									
163.209		0,036	0,043	0,049	0,046	0,039	0,043									

I tabellen indføres årets resultater af **chlorid** i mg/l på vandværk og boringer

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vandværk	240			210	190	190/ 220	210A									
163.160	260	260	260		240	260	270									
163.161	270	270	270	280	270	280	280									
163.209	280	280			280											

I tabellen indføres årets resultater af **natrium** i mg/l på vandværk og boringer

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
vandværk	130			130	110	130										
163.160	140	140	150		140	160	160									
163.161	180	140	160	160	170	170	180									
163.209	140	180			170											

Logbog for afvigende analyser og andre hændelser, se næste side.

Logbog for afvigende analyser og andre hændelser

Dato	Kontrol	Overskridelser	Grænse-værdi	Bemærkninger
07/10/2010	Udvidet kontrol	Colif. bakt. 3 MPN/100 ml	må ikke påvises	Opfølgende kontrol 18/01/2011 var tilfredsstillende.
07/10/2010	Udvidet kontrol	Turbiditet 0,39 FTU	0,3 FTU	
07/10/2010	Udvidet kontrol	Farvetal 5,3 mgPt/l	5 mgPt/l	
20/06/2011	Begrænset kontrol	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	må ikke påvises	Der tages opfølgende kontrol
05/07/2011	Opfølgende kontrol	Colif. bakt. 2 MPN/100 ml	må ikke påvises	Der tages opfølgende kontrol
11/08/2011	Opfølgende kontrol	Kimtal ved 22 °C 550 CFU/ml. Kimtal ved 37 °C 70 CFU/ml	22 °C: 200 CFU/ml 37 °C 20 CFU/ml	29/08/2011 Begrænset kontrol viser tilfredsstillende resultat.
20/10/2011	Udvidet kontrol	Turbiditet 0,035 FTU	0,3 FTU	
18.10.2012	Udvidet kontrol	Farvetal 5,6 mgPt/l	5mgPt/l	
16/10/2013	Udvidet kontrol	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	må ikke påvises	Det viser sig at forureningen kommer fra filtrerne. Der tages en lang række analyser og der foretages rensning af filtrerne . Opfølgende kontrol 07/01/2014 viste ingen coliforme men overskridelser af ammonium, nitrit og mangan.
16/10/2013	Begrænset kontrol	Colif. bakt. 4 MPN/100 ml	må ikke påvises	Følge af at filtrerne er forurenede.
01/04/2014	Normal kontrol	opfølgning på overskridelserne 07/01/2014		analysen viste tilfredsstillende resultater.
09/01/2015	Begrænset kontrol Saugstedlund 103	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	må ikke påvises	12/01/2015 Det er aftalt med Helge Rosendahl at der bestilles omprøve i dag.
14/01/2015	Opfølgende kontrol Saugstedlund 103	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	må ikke påvises.	Helge Rosendahl har allerede bestilt omprøve, da kommunen kontakter ham.
22/01/2015	Opfølgende kontrol Afgang vandværk	Colif. bakt. 1 MPN/100 ml	må ikke påvises.	28/01/2015 tilsyn på vandværket og trykforøger. Ingen umiddelbar forklaring. Prøve taget på trykforøger 22/01/2015 viste ingen coliforme bakterier. Prøve tages nu 5 på vandværk og en på ledningsnet.
02/02/2015	Opfølgende prøver	tilfredsstillende		Sagen afsluttes.
02/11/2015	Udvidet kontrol	Turbiditet 0,46 FTU	0,3 FTU	Skrevet til vv 13.11.2015
12/01/2016	Frivillig kontrol for chlorid	Turbiditet 0,4 FTU	0,3 FTU	Samtidig begrænset kontrol viser turbiditet 0,24 FTU derfor accepteres overskridelsen afgang vv.
17/10/2016	Udvidet kontrol	Farvetal 5,8 mg Pt/l	5 mg Pt/l	
17/10/2016	Udvidet kontrol	Turbiditet 0,38 FTU	0,3 FTU	


Processkema over vandværket

Tilladt indvindingsmængde: m³/år'

DGU 163.160

DGU 163.161

DGU 163.209

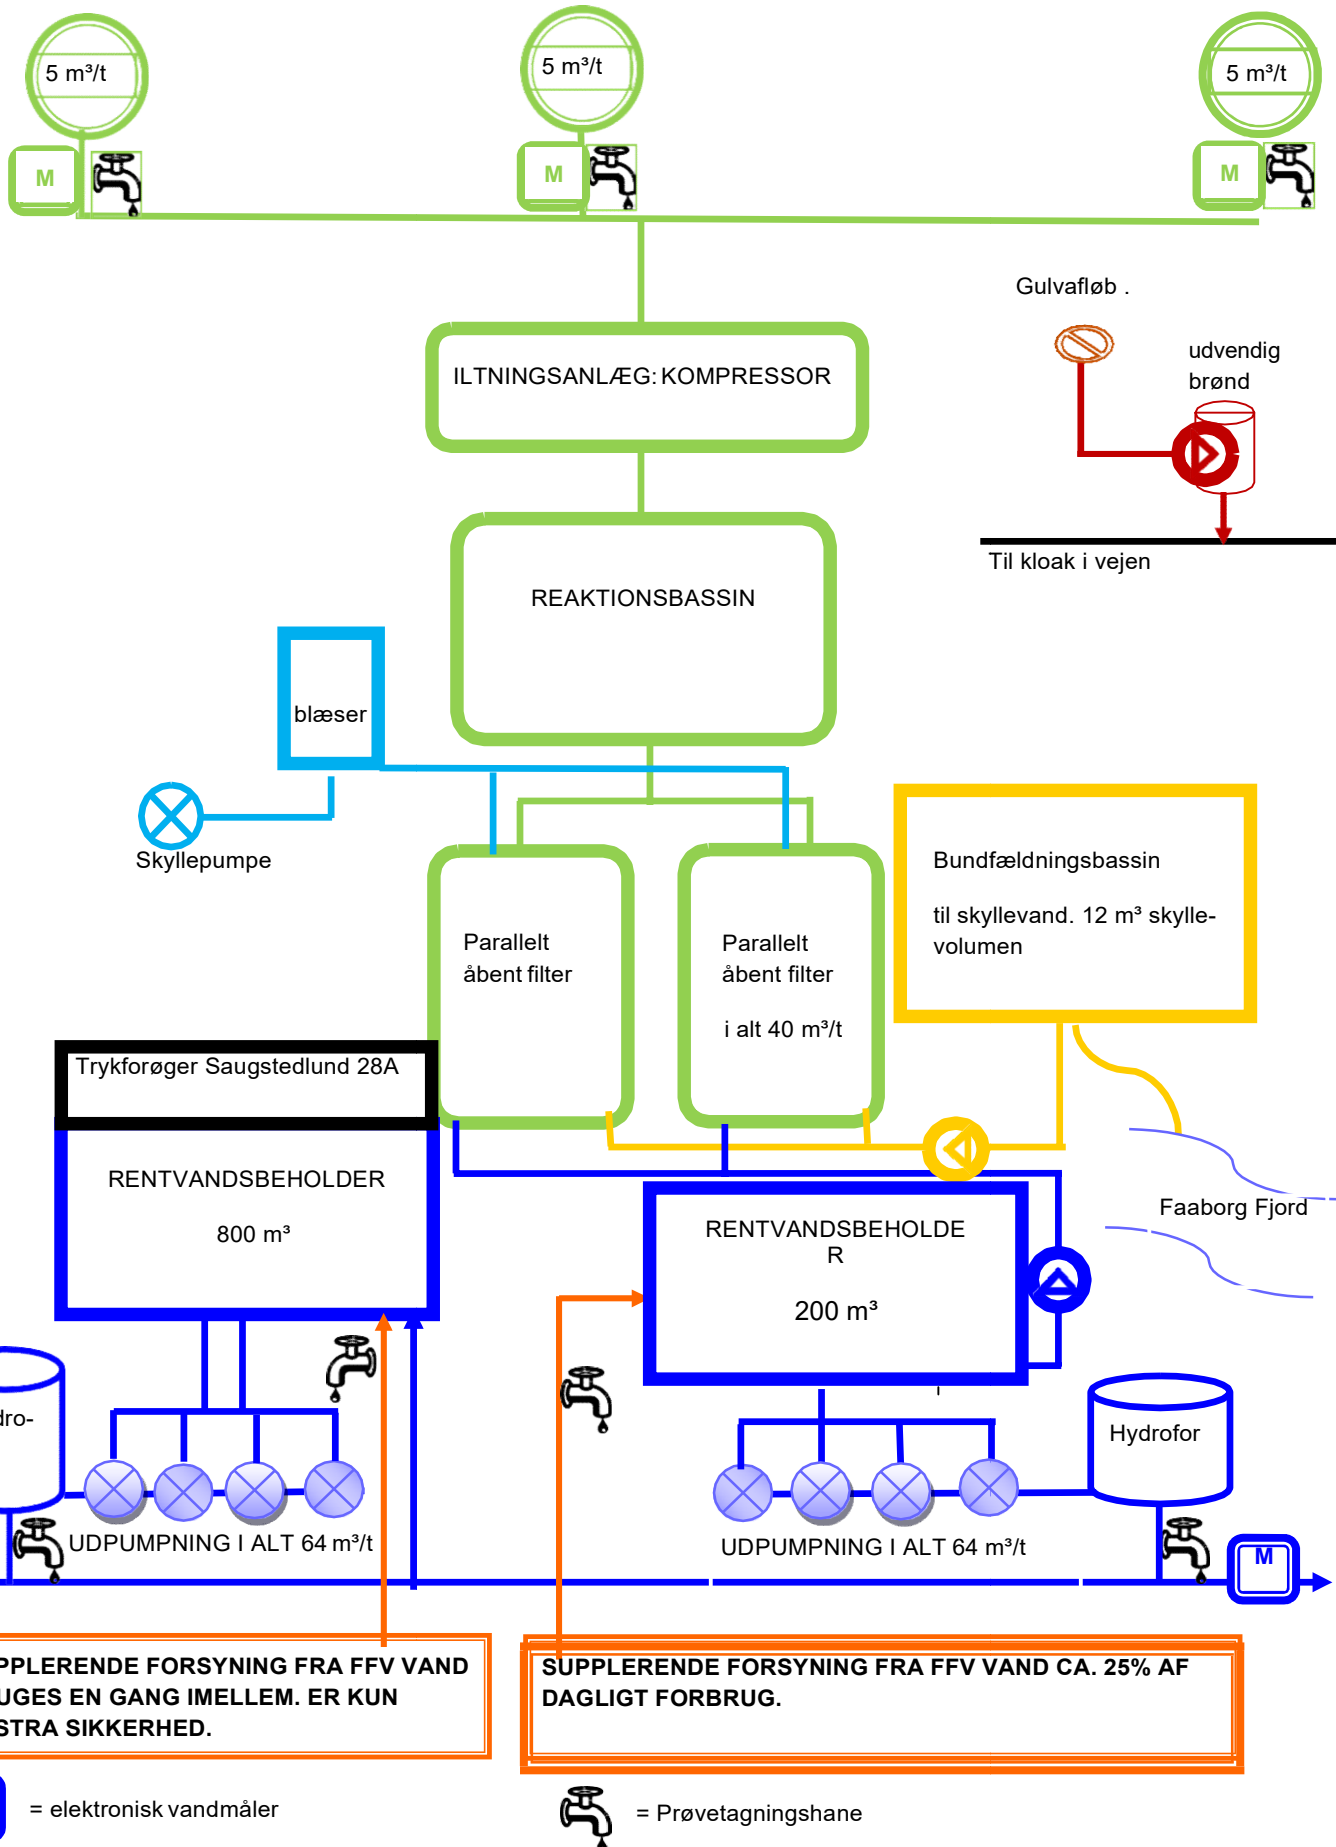

Tilsynsrapport for Assensvejens Vandværk den 28. januar 2015

I tilsynet deltog: Fra vandværket Helge Rosendahl, Henrik Svenson, fra Miljøafdelingen Elin Christophersen

Forklaring til "Tilstand"



= god



= bør forbedres



= skal forbedres

		TILSTAND	BEMÆRKNINGER
Vandværksbygning bygget 1957 Ventilationsåbninger sløjfet 2013. Ombygget	indhegning, aflåsning, alarm		
	bevoksning/udendørsareal		Meget velholdt, nyt stakit
	bygningsvedligehold		
Iltningsanlæg kompressor indeluftsventilation 2013 Årgang: ????	vedligehold		
	funktion		
	renhold		
Filteranlæg Åbne parallelle filtre Kapacitet 40 m³/t. Indeluftsventilation 2013 Årgang: 1957 Filtermateriale byttet 2013	vedligehold		
	funktion		
	renhold		
Blæser og skyllepumpe Filterskyl er automatisk Forbrug 9 m³ på hvert filter. Skyller for hver 200 m³ 2013 blæser udskiftet, pumpe kontrolleret.	vedligehold		
	funktion		
	renhold		
Prøvetagningshaner FFV VAND og afgang VV	afmærket		
Gulvafløb Klapventil i brønd	sikret mod rotter		
	sikret mod kloakvand		
Affugtningsanlæg Årgang: ????	vedligehold		
	funktion		
	renhold		
Trykstyring VLT, frekvensomformer Årgang: 2000	funktion		
	renhold		
Udpumpningsanlæg stk. 4 rentvandspumper , type CR-16 Kapacitet i alt 64 m³/t Årgang: 2000	vedligehold		
	funktion		
	renholdt		

		Tilstand	Bemærkninger
Hydrofor med forkompression Årgang: 2000 Renoveret/kontrolleret	Vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
Rentvandsbeholder Under og udenfor vandværksbygningen. Kapacitet 200 m ³ Uden overløb Årgang 1957 Renoveret /kontrolleret: 2010	rent omkring beholderen	●	
	ingen træer og buske tæt på beholderen	●	
	fri for synlige utætheder	●	
	tætte låger i aflåst bygning	●	
	beskyttet ventilationsåbning	●	
	fungerende alarm for høj/lav vandstand	●	
Bundfældningsbassin Opholdstid 18 timer Filterskyllevandet ledes til Faaborg Fjord via regnvandsledning. Årgang: 2000	beskyttet mod uvedkommende	●	
	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
Øvrige oplysninger Elektronisk vandmåler. Hjemmesiden opdateres løbende med vandværkets tekniske oplysninger		●	

Tilsynsrapport for Saugstedlund trykforøgerstation den 28. januar 2015

		Tilstand	Bemærkninger
Affugtningsanlæg Årgang: ????	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
Trykstyring VLT, frekvensomformer Årgang:	funktion	●	
	renhold	●	
Udpumpningsanlæg stk. 3 rentvandspumper , type CR-10 Kapacitet i alt ?? m³/t Årgang: 2014	vedligehold	●	
	funktion	●	
	renholdt	●	
Prøvetagningshane FFV VAND og afgang beholder	afmærket	●	
Hydrofor med forkompression Årgang: 2000 Renoveret/kontrolleret	Vedligehold	●	
	funktion	●	
	renhold	●	
Rentvandsbeholder Kapacitet 800 m³ Uden overløb og ventilationsåbning Årgang ca. 1986 Renoveret /kontrolleret: 2011	rent omkring beholderen	●	
	ingen træer og buske tæt på beholderen	●	
	fri for synlige utætheder	●	
	tætte låger		Ikke tilset ved tilsynet
	fungerende alarm for høj/lav vandstand		Ikke tilset ved tilsynet

Boring DGU nr. 163.160 Tilsynsrapport fra den: 28. januar 2015

Ligger inde i vandværket

Boringen er udført i 1962

Frit magasin. Rovandstand 4,2 mut.

Terrænkote m. 4,25 m o. DNN. Dybden er 12 mut.

Filtersat i ?? mut. Ingen oplysninger om jordlag.

Boringen er placeret under terræn i en tørbrønd.

Pumpestrategi: I drift samtidig med de andre boringer.

Elektronisk vandmåler.



Forklaring til "Tilstand"



= god



= bør forbedres



= skal forbedres



Beskyttelseszoner

Tilstand

Bemærkning

Fredningsbæltet er vandværkets grund, som skal være indhegnet.



25 m zone ikke aktuelt

BNBO, ja.

		Tilstand	Bemærkninger
Råvandsstationen er en tørbrønd. i vandværks bygningen.	Alarmsikring mod hærværk	●	
	Tæt i bund, sider og dæksel	●	
	Tør i bund og sider		Meget kondensvand
Borerørsafslutningen er under terræn.	Forerørsforsegling	●	
	Rørgennemføringer tætte	●	
	Renholdt og ryddeligt	●	
Brønden anlagt : 1962			
Boringen Ingen udluftning Pejlepunktet er: brøndkarm jf. Jupiter. Der pejles til brøndkarm.	Mærkning af boringen (DGU nr.)	●	
	Pejlemulighed	●	
	Angivelse af pejlepunkt	●	
	Prøvetagningshane	●	
	Vandtæt aflukning af borerør	●	

Boring DGU nr. 163.161 Tilsynsrapport fra den: 28. januar 2015

Ligger på vandværksgrunden længst væk fra vandværket.

Boringen er udført i 1962

Frit magasin. Rovandstand 4,8 mut.

Terrænkote 4,95 m. o. DNN. Dybden er 12 mut.

Filtersat i 7-12 mut. overlejret af ca. 6 m ler.

Boringen er placeret under terræn i en tørbrønd.

Pumpestrategi: I drift samtidig med de andre boringer.

Elektronisk vandmåler



Forklaring til "Tilstand"



= god



= bør forbedres



= skal forbedres



Beskyttelseszoner

Tilstand

Bemærkning

Fredningsbæltet er vandværkets grund, som skal være indhegnet.	●	
25 m zone ikke aktuelt		
BNBO, ja		

		Tilstand	Bemærkninger
Råvandsstationen er en tørbrønd	Aflåst dæksel/lem	●	
	Alarmsikring mod hærværk		
Borerørsafslutningen er under terræn.	Ventilation af tørbrønden	●	Der bør sættes filter i, mod insekter m.fl.
	Tæt i bund, sider og dæksel	●	
Der er terrænfald fra brønden.	Tør i bund og sider	●	
	Forerørsforsegling	●	
Brønden anlagt : 1962	Rørgennemføringer tætte	●	
	Renholdt og ryddeligt	●	
	Mærkning af boringen (DGU nr.)	●	
Boringen	Pejlemulighed	●	
	Angivelse af pejlepunkt	●	
Ingen udluftning	Prøvetagningshane	●	
	Vandtæt aflukning af borerør	●	
Pejlepunktet er: Brøndkarm, jf. Jupiter. Der pejles til brøndkarm			

Boring DGU nr. 163.209 Tilsynsrapport fra den: 28. januar 2015

Ligger på vandværksgrunden lige uden for vandværket

Boringen er udført i 1975

Frit magasin. Rovandstand 4,33 mut.

Terrænkote 4,79 m. o. DNN. Dybden er mut.

Filtersat i mut. overlejret af ca. 5 m ler.

Boringen er placeret under terræn i en tørbrønd.

Pumpestrategi: I drift samtidig med de andre boringer.

Elektronisk vandmåler



Forklaring til "Tilstand"



= god



= bør forbedres



= skal forbedres



Beskyttelseszoner

Tilstand

Bemærkning

Fredningsbæltet er vandværkets grund, som skal være indhegnet.	●	
25 m zone ikke aktuelt		
BNBO, ja		

		Tilstand	Bemærkninger
Råvandsstationen er en tørbrønd	Aflåst dæksel/lem	●	
	Alarmsikring mod hærværk		
Borerørsafslutningen er under terræn. Der er terrænfald fra brønden.	Ventilation af tørbrønden	●	Der bør sættes filter i, mod insekter m.fl.
	Tæt i bund, sider og dæksel	●	
	Tør i bund og sider	●	
Brønden anlagt :	Forerørsforsegling	●	
	Rørgennemføringer tætte	●	
	Renholdt og ryddeligt	●	
Boringen	Mærkning af boringen (DGU nr.)	●	
Ingen udluftning	Pejlemulighed	●	
Pejlepunktet er: Brøndkarm, jf. Jupiter. Der pejles til brøndkarm.	Angivelse af pejlepunkt	●	
	Prøvetagningshane	●	
	Vandtæt aflukning af borerør	●	

Indvindingstilladelse

Tilladelsesdato: 22. september 2008

Udløbsdato: 1. september 2038

Tilladt indvindingsmængde: 130.000

Kapacitetsberegninger for vandforsyningsanlægget

			2014	Bemærkninger
Forbrugsvariation	Maks. døgnfaktor	fd	1,3	
	Maks. timefaktor	ft	1,8	
Forsyningskrav	Udpumpning	m ³ /år	75.578	
	Maks. døgnforbrug	m ³ /døgn	269	
	Maks. timeforbrug	m ³ /t	20	
	Pumpekapacitet	m ³ /t	25	
	Råvandskapacitet	m ³ /t	12	
	Filterkapacitet	m ³ /t	12	
	Beholdervolumen	m ³	144	
Forsyningsevne	Indvindingstilladelse	m ³ /år	130.000	
	Mulig årsproduktion	m ³ /år	97.000	
	Døgnproduktion	m ³ /døgn	345	
	Leveringskapacitet	m ³ /t	64	
	Pumpekapacitet	m ³ /t	64	
	Råvandskapacitet	m ³ /t	15	
	Filterkapacitet	m ³ /t	40	
	Rentvandsbeholder	m ³	1.000	
Forsynings-sikkerhed	Årsforbrug	Evne/krav	1,3	
	Maks. døgn	Evne/krav	1,3	
	Maks. time	Evne/krav	3,2	
	Maks. forbrug	Timer/døgn	8,4	

Kapacitetsberegningernes forsyningskrav er beregnet efter det vandværket selv skal levere. Dog er udpumpning og beholdervolumen er ganget med 1,25, for at tage højde for det vand der kommer fra FFV.

Vandværkets kvalitetssikring:

Årligt besøg af rådgiver Jørgen Krogh Andersen, som gennemgår vandværket og kommer med forslag til forbedringer. 5 årig handleplan.

Fra mail af 25. maj 2015:

Jeg skal hermed meddele hvem der er driftansvarlig for Assensvejens Vandværk:

Helge Rosendahl (kasserer samt vandværkspasser)

Henrik Svensson (vores vvs-mand på vandværket)

Har gennemført kurserne i FVD :

Håndbog 4 Vandanalyser

Håndbog 5 Tilstandsrapport & Handlingsplan

Håndbog 6 Vandværksdrift

Samt kursus i hygiejne på vandværker

Alle med kursusbevis

Endvidere har Assensvejens Vandværk købt og installeret ledelsystemet fra Snerling Søhus Vandværk

Venlig hilsen

Helge Rosendahl

Assensvejens Vandværk

Saugstedlund 103

5600 Faaborg

telf. 40111600 - 62618026

Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen

Vandværket er ikke nødvendig for den fremtidige forsyning.

Indsatsplansarbejdet

Vandværket indgår i Faaborg-Egebjerg indsatsplan som er under udarbejdelse. BNBO vil blive en del af indsatsplanen.
