ARSS BARU Engineering and Management Consultant KSO PT. INTIMULYA MULTIKENCANA KONSULTAN REKAYASA TEKNIK

LAPORAN PROGRES BULANAN

BULAN KE

13

PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN

RINCIAN KEGIATAN	: PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA		
URAIAN KEGIATAN	: PELAKSANAAN FISIK		
NOMOR KONTRAK	: [redacted]	TANGGAL	: 18 SEPTEMBER 2024
NOMOR ADD-01/ TANGGAL	:	TANGGAL	: 09 DESEMBER 2024
NOMOR ADD-02/ TANGGAL	:	TANGGAL	: 07 FEBRUARI 2025
NOMOR ADD-03/ TANGGAL	:	TANGGAL	: 16 APRIL 2025
NOMOR ADD-04/ TANGGAL	:	TANGGAL	: 15 AGUSTUS 2025
LOKASI	: PROVINSI DI YOGYAKARTA		
TAHUN ANGGARAN	: 2024-2025		
NILAI KONTRAK	: Rp 55.999.598.000,00		
WAKTU PELAKSANAAN	: 364 HARI KALENDER		
WAKTU PEMELIHARAAN	: 180 HARI KALENDER		

Abadi Prima Intikarya

PT. ABADI PRIMA INTIKARYA

L'Avenue Office Building 25F
Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 16, RT 007 RW 009 Pancoran, Jakarta Selatan 12780
Telp. 021 - 7994666, Fax : 021 - 7991667
Email : pemasaran_apik@yahoo.com

ARSS BARU Engineering and Management Consultant PT. INTIMULYA MULTIKENCANA KONSULTAN REKAYASA TEKNIK	Pemilik : KEMENTERIAN PU SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN D.I. YOGYAKARTA No. Dok : [redacted] No. Rev : - Tanggal : 17 September 2025	Abadi Prima Intikarya

DAFTAR ISI :

LAPORAN PROGRESS BULANAN KE 13

PERIODE 01 September 2025 - 16 September 2025

→ COVER

→ DAFTAR ISI

→ LAPORAN UMUM

→ TIME SCHEDULE

→ LAPORAN PROGRES BOBOT PEKERJAAN

→ DOKUMENTASI

→ LAMPIRAN

ARSS BARU Engineering and Management Consultant PT. INTIMULYA MULTIKENCANA KONSULTAN REKAYASA TEKNIK	Pemilik : KEMENTERIAN PU SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN D.I. YOGYAKARTA No. Dok : [redacted] No. Rev : - Tanggal : 17 September 2025	Abadi Prima Intikarya

FORM LAPORAN UMUM

Nama Proyek	: PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA
Lokasi	: JL. C. SIMAJUNTAK NO.21,TERBAN, KEC. GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA
Periode Bulan ke	: 13 (TIGA BELAS) Tgl : 01 September 2025 sd 16 September 2025
Tahapan Pekerjaan	: Pekerjaan Arsitektur, MEP

I. DATA PROYEK

1. Nama Proyek : **PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA**
2. Lokasi Proyek : **JL. C. SIMAJUNTAK NO.21,TERBAN, KEC. GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA**
3. Output Kegiatan : **TERBANGUNNYA PASAR TERBAN YOGYAKARTA**
4. Sumber Dana : **APBN 2024-2025 : DIPA- 033.05.1.631127/2024**
5. Pemberi Tugas : **KEMENTERIAN PU SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN D.I. YOGYAKARTA**
6. Konsultan Manajemen Konstruksi : **PT. ARSS BARU KSO PT. INTIMULYA MULTIKENCANA**
7. Kontraktor : **PT. ABADI PRIMA INTIKARYA**
   - SPMK Tanggal : **18 September 2024**
   - Kontrak Tanggal : **18 September 2024** Nomor : [redacted]
   - ADD - 01 Tanggal : **09 Desember 2024** Nomor :
   - ADD - 02 Tanggal : **07 Februari 2025** Nomor :
   - ADD - 03 Tanggal : **16 April 2025** Nomor :
   - ADD - 03 Tanggal : **16 April 2025** Nomor :
8. Tanggal dimulainya pekerjaan : **18 September 2024**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : **364 hari kalender**
10. Tanggal Penyerahan ke I : **16 September 2025**
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : **180 Hari Kalender**
12. Tanggal Penyerahan ke II : **15 Maret 2026**

II. EVALUASI PEKERJAAN

A. Prestasi Pekerjaan .

- Prestasi sd Bulan Lalu	:	94,895%
- Prestasi Bulan Ini	:	5,105%
- Prestasi sd Bulan Ini	:	100,000%
- Rencana sd Bulan Ini	:	100,000%
- Deviasi Prestasi Kumulatif	:	0,000%

B. Waktu Pelaksanaan

- Jangka Waktu Pelaksanaan	:	364 Hari Kalender
- Waktu yang telah berjalan	:	364 Hari Kalender
- Sisa waktu pelaksanaan	:	0 Hari Kalender

C. Masalah / Hambatan

Non Teknis : :

Teknis : :

D. Saran dan tindak lanjut penyelesaian masalah.

Non Teknis :

Teknis : :

ARSS BARU Engineering and Management Consultant PT. INTIMULYA MULTIKENCANA KONSULTAN REKAYASA TEKNIK	Pemilik : KEMENTERIAN PU SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN D.I. YOGYAKARTA No. Dok : [redacted] No. Rev : - Tanggal : 17 September 2025	Abadi Prima Intikarya

FORM LAPORAN UMUM

Nama Proyek	: PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA
Lokasi	: JL. C. SIMAJUNTAK NO.21,TERBAN, KEC. GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA
Periode Bulan ke	: 13 (TIGA BELAS) Tgl : 01 September 2025 sd 31 Agustus 2025
Tahapan Pekerjaan	: Pekerjaan Arsitektur, MEP

E. Pekerjaan yang dilaksanakan dalam minggu ini.

1. Pengecatan dinding power house & RPA
2. Pekerjaan gutter & gratting Lt 1
3. Pekerjaan epoxy lantai RPA
4. Pekerjaan meja wastafel Lt 3
5. Pemasangan bollard sisi timur/selatan
6. Pengecatan finish dinding RPA & Power House
7. Pemasangan pintu besi Power House
8. Pemasangan grassblock depan RPA
9. Pemasangan rolling door RPA
10. Pekerjaan Kanopi Jendela
11. Pemasangan kaca kisi-kisi belakang
12. Pekerjaan Plafond RPA
13. Finish Listplank atap RPA & Power House
14. Pemasangan FCO Lt 1
15. Pemasangan CCTV Lt 3 selatan
16. Pemasangan pipa air bersih wastafel Lt 3
17. Pemasangan ducting Lt 1
18. Pemasangan lampu TL kios Lt 1
19. Pemasangan MCB kios Lt 1
20. Pemasangan heat detector kios Lt 3

Menyetujui,	Dibuat Oleh,
Manajemen Konstruksi	**Kontraktor**
PT. ARSS BARU KSO PT. INTIMULYA MULTIKENCANA	**PT. ABADI PRIMA INTIKARYA**
[redacted]	

Mengetahui,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

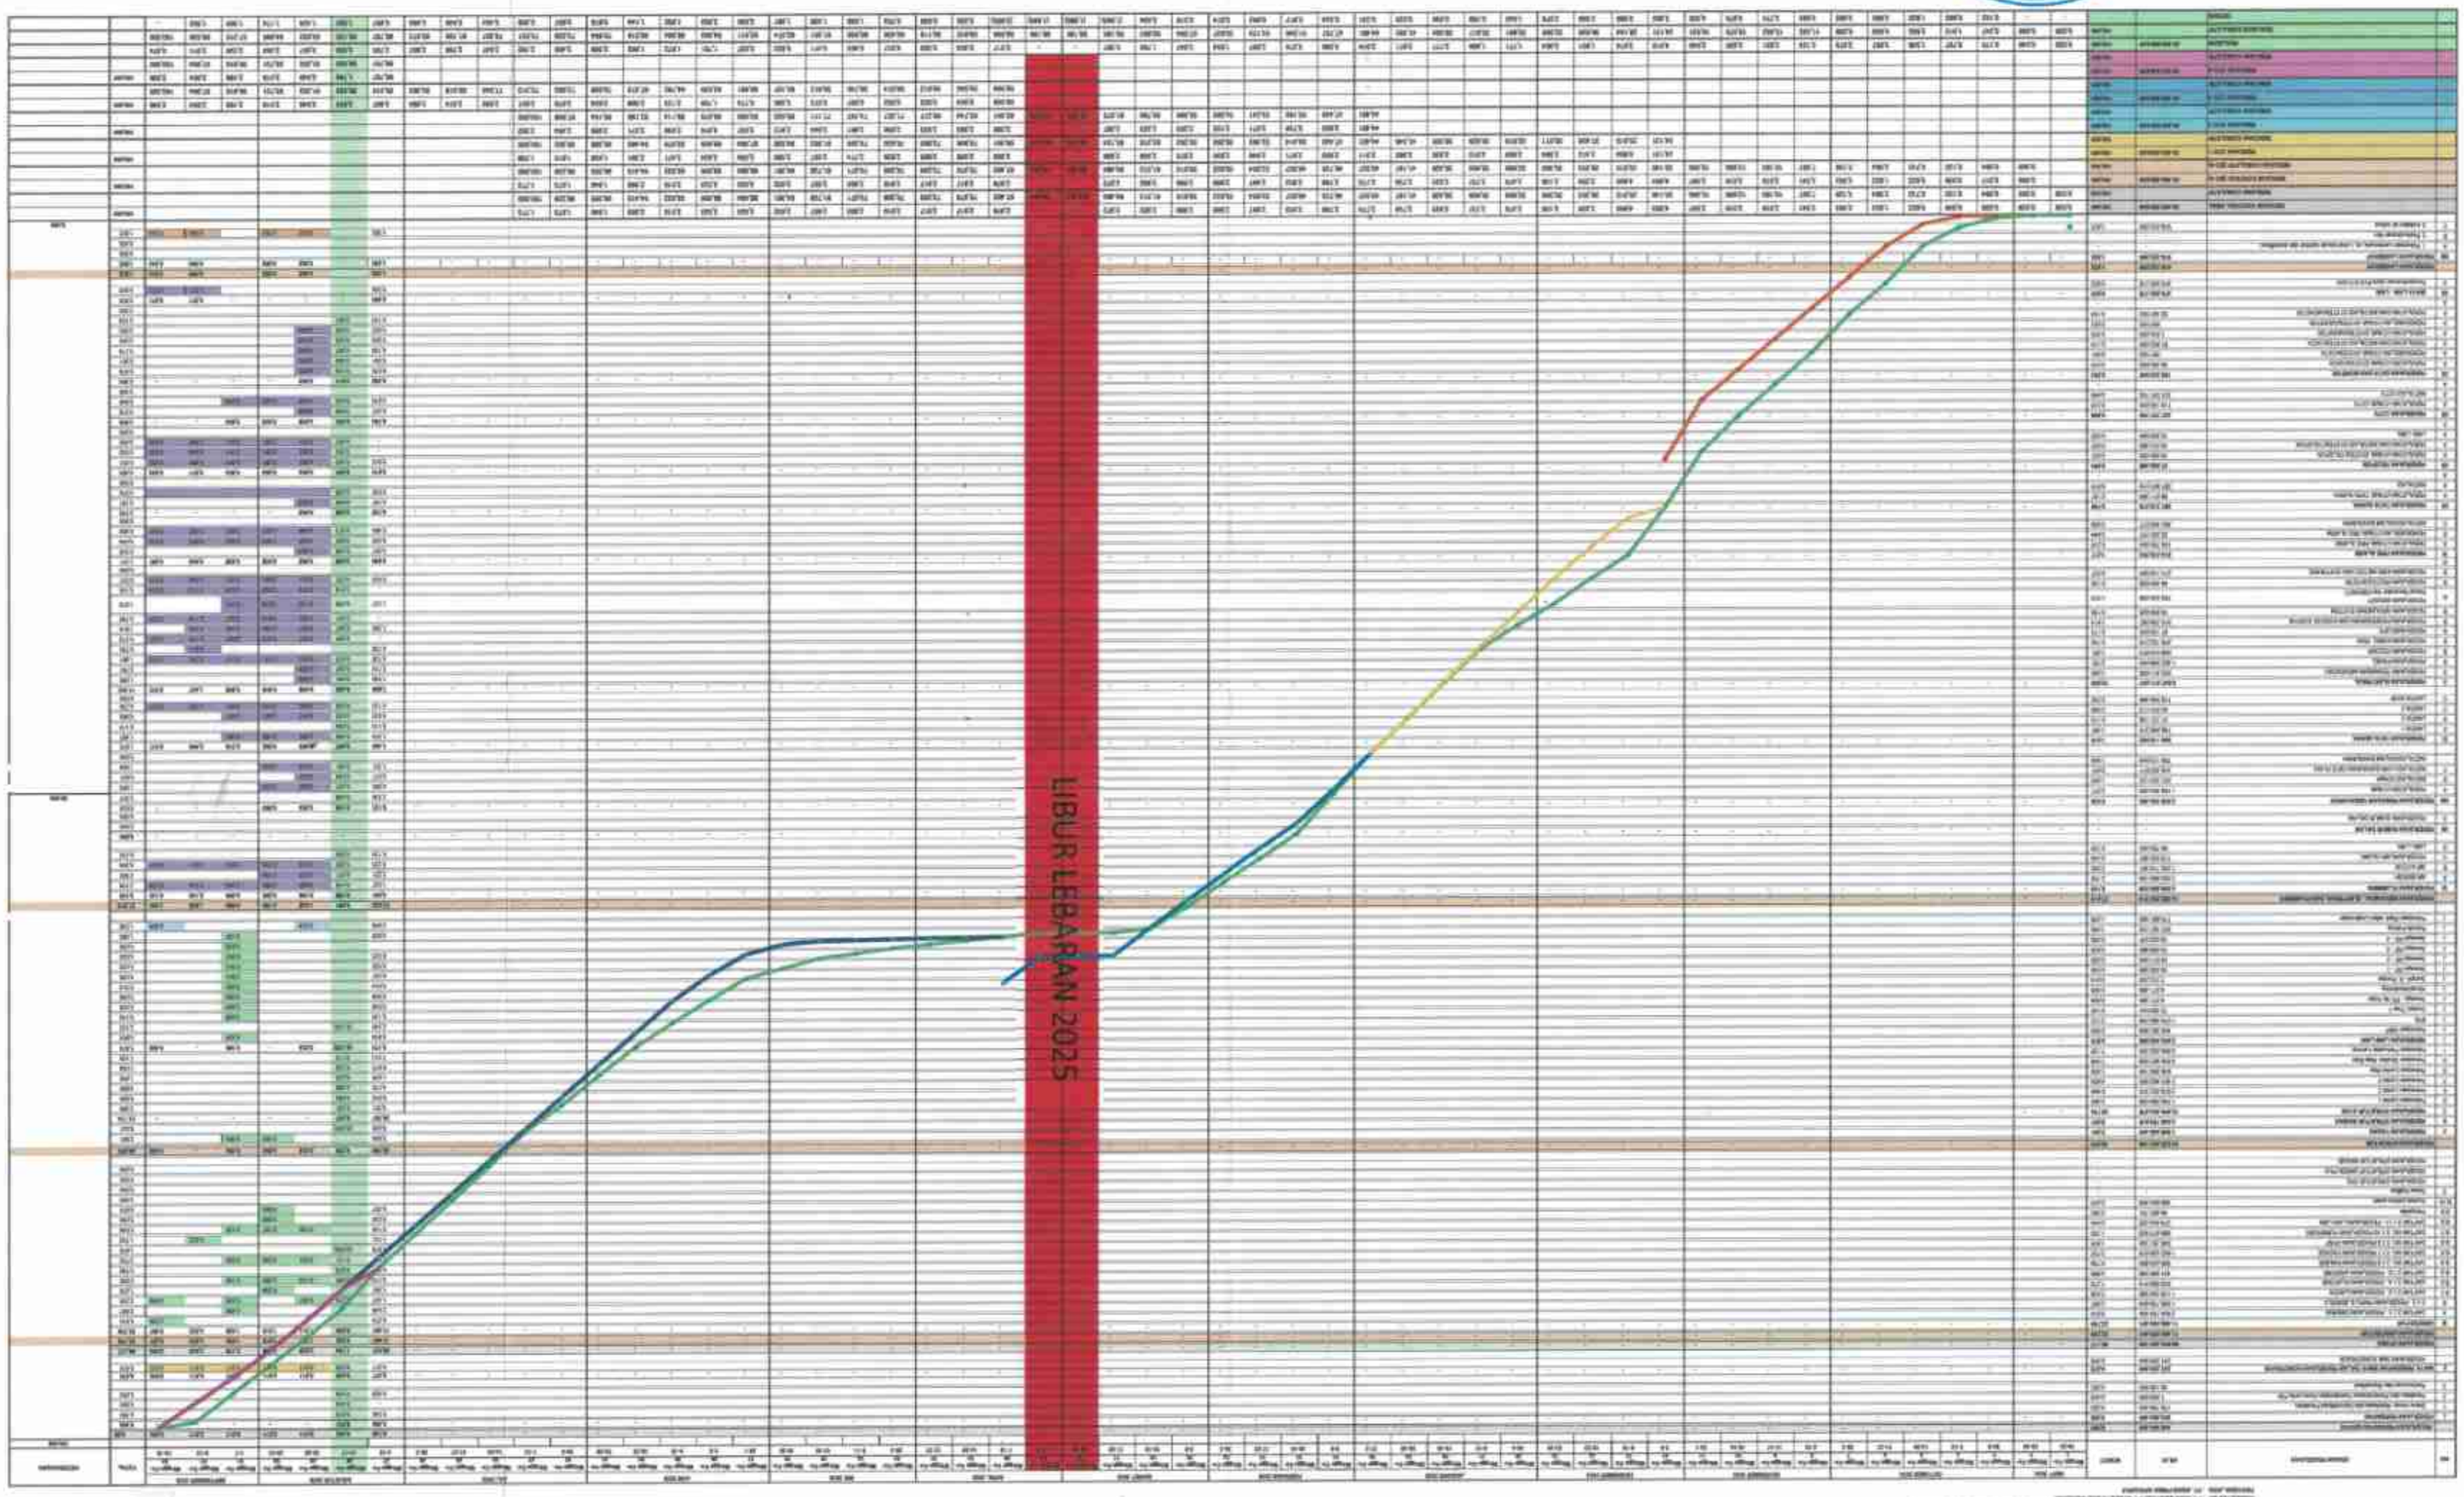

TIME SCHEDULE

REKAPITULASI

PEKERJAAN : RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA
JUMLAH LANTAI : 4 LANTAI
PERIODE BULAN KE - 13

No.	JENIS PEKERJAAN	MC-0		MC-1		MC-2		MC-3		MC-4		s/d BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI
		JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)
I.	DAFTAR NO. 1 MATA PEMBAYARAN UMUM TOTAL I :	Rp [redacted]	0,548%	Rp [redacted]	0,548%	Rp [redacted]	0,548%	Rp [redacted]	0,548%	[redacted]	0,405%	0,402%	0,003%	0,405%
I.A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp [redacted]	0,548%	Rp [redacted]	0,548%	Rp [redacted]	0,548%	Rp [redacted]	0,548%	[redacted]	0,405%	0,402%	0,003%	0,405%
II.	DAFTAR NO. 2 MATA PEMBAYARAN PERKIRAAN BIAYA PENERAPAN SISTEM KESELAMATAN TOTAL II :	Rp [redacted]	0,478%	Rp [redacted]	0,478%	Rp [redacted]	0,478%	Rp [redacted]	0,478%	[redacted]	0,478%	0,405%	0,073%	0,478%
II.A.	BIAYA PENERAPAN SMKK DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI	Rp [redacted]	0,478%	Rp [redacted]	0,478%	Rp [redacted]	0,478%	Rp [redacted]	0,478%	[redacted]	0,478%	0,405%	0,073%	0,478%
III.	DAFTAR NO. 3 MATA PEMBAYARAN UTAMA TOTAL III :	Rp [redacted]	98,391%	Rp [redacted]	98,391%	Rp [redacted]	97,464%	Rp [redacted]	97,464%	[redacted]	97,295%	92,447%	4,846%	97,295%
III.A.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp [redacted]	25,936%	Rp [redacted]	25,936%	Rp [redacted]	23,235%	Rp [redacted]	23,350%	[redacted]	22,759%	20,774%	1,985%	22,759%
III.B.	PEKERJAAN STRUKTUR	Rp [redacted]	44,444%	Rp [redacted]	44,390%	Rp [redacted]	46,695%	Rp [redacted]	46,702%	[redacted]	46,622%	46,603%	0,018%	46,622%
III.C.	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING	Rp [redacted]	28,011%	Rp [redacted]	28,065%	Rp [redacted]	27,533%	Rp [redacted]	27,412%	[redacted]	27,913%	25,070%	2,843%	27,913%
IV.	DAFTAR NO. 4 MATA PEMBAYARAN LAINNYA TOTAL IV :	Rp [redacted]	0,583%	Rp [redacted]	0,583%	Rp [redacted]	1,510%	Rp [redacted]	1,510%	[redacted]	1,822%	1,640%	0,182%	1,822%
IV.A.	PEKERJAAN LANSEKAP	Rp [redacted]	0,583%	Rp [redacted]	0,583%	Rp [redacted]	1,510%	Rp [redacted]	1,510%	[redacted]	1,822%	1,640%	0,182%	1,822%
	TOTAL I + II + III :	Rp [redacted]	100,000%	Rp [redacted]	100,000%	Rp [redacted]	100,000%	Rp [redacted]	100,000%	[redacted]	100,000%	94,895%	5,104%	100,000%
	PPN 11 % :	Rp [redacted]		Rp [redacted]		Rp [redacted]		Rp [redacted]		[redacted]				
	TOTAL :	Rp [redacted]		Rp [redacted]		Rp [redacted]		Rp [redacted]		[redacted]				
	DI BULATKAN :	Rp [redacted]		Rp [redacted]		Rp [redacted]		Rp [redacted]		[redacted]				

Mengetahui,
[redacted]

Diperiksa dan Disetujui Oleh,
[redacted]

Yogyakarta, 16 September 2025
Dibuat Oleh,
PT ABADI PRIMA INTI KARYA
[redacted]

| | | |

NO	Division Representative	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall	Sanctioned Strength	Strength Present	Shortfall
-	Thane Tata (T-01)	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Jupiter Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Kalwa Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Manpada Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Civil Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Jupiter Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Kalwa Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Manpada Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
-	Thane Civil Hospital	2.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%	1.00	nil	100.00%
01	Ambernath Kalyan Ammunition Sub - Area (Type 25) Kalyan-Ambernath Junction road station road 2000 mtrs, Kalyan-Badlapur Junction road station road 1000 mtrs, Kalyan-Badlapur Junction road station road 1000 mtrs, Kalyan-Badlapur Junction road station road 1

| | | |

| | | |

| № | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость всего | Материалы | Машины и механизмы | Оборудование | Основная З/п | Эксплуатация машин | Основная З/п | Накладные расходы | Сметная прибыль | Индекс | Сметная стоимость

| | | |

| NO | Ukuran Perusahaan | Skala Perusahaan | | | | Sektor Ekonomi | | | | Sektor Ekonomi | | | | Sektor Ekonomi

| | | |

| | | |

| | | |

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC-0					MC-1					MC-2					MC-3					MC-4					MC-5					MC MUSIM LALU		MC MUSIM INI		
		KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
-	Pasang PVC-U - PN10 + jacketing dia. 90 mm Pipa Gravitasi ke River	6,00	m	133.800,00	801.800,00	0,002%	6,00	m	133.800,00	801.800,00	0,002%	6,00	m	133.800,00	801.800,00	0,002%	6,00	m	133.800,00	801.800,00	0,002%	6,00	m	133.800,00	801.800,00	0,002%	3,00	0,001%	3,00	0,001%	6,00	0,002%
-	Pasang PVC-U - PN10 + jacketing dia. 90 mm Pipa Gravitasi ke River	4,00	m	88.100,00	352.400,00	0,001%	4,00	m	88.100,00	352.400,00	0,001%	4,00	m	88.100,00	352.400,00	0,001%	4,00	m	88.100,00	352.400,00	0,001%	4,00	m	88.100,00	352.400,00	0,001%	4,00	0,001%	-	0,000%	4,00	0,001%
-	Pasang PVC-U - PN10 + jacketing dia. 90 mm Pipa Gravitasi ke River	70,00	m	88.100,00	6.167.000,00	0,012%	70,00	m	88.100,00	6.167.000,00	0,012%	70,00	m	88.100,00	6.167.000,00	0,012%	70,00	m	88.100,00	6.167.000,00	0,012%	70,00	m	88.100,00	6.167.000,00	0,012%	70,00	0,012%	-	0,000%	70,00	0,012%
-	Pasang PVC-U - PN10 + jacketing dia. 90 mm Isolasi Roof Tank	48,00	m	88.100,00	4.276.800,00	0,008%	48,00	m	88.100,00	4.276.800,00	0,008%	48,00	m	88.100,00	4.276.800,00	0,008%	48,00	m	88.100,00	4.276.800,00	0,008%	48,00	m	88.100,00	4.276.800,00	0,008%	48,00	0,008%	-	0,000%	48,00	0,008%
3	Pemasangan Katup-katup dan kelengkapannya	2,00	bh	6.107.400,00	12.214.800,00	0,024%	2,00	bh	6.107.400,00	12.214.800,00	0,024%	2,00	bh	6.107.400,00	12.214.800,00	0,024%	2,00	bh	6.107.400,00	12.214.800,00	0,024%	2,00	bh	6.107.400,00	12.214.800,00	0,024%	2,00	0,024%	-	0,000%	2,00	0,024%
-	Pasang Gate Valve NRS dia. 100 mm	7,00	bh	4.074.300,00	28.520.100,00	0,057%	7,00	bh	4.074.300,00	28.520.100,00	0,057%	7,00	bh	4.074.300,00	28.520.100,00	0,057%	7,00	bh	4.074.300,00	28.520.100,00	0,057%	7,00	bh	4.074.300,00	28.520.100,00	0,057%	7,00	0,057%	-	0,000%	7,00	0,057%
-	Pasang Gate Valve NRS dia. 100 mm	1,00	bh	1.038.140,00	1.038.140,00	0,002%	1,00	bh	1.038.140,00	1.038.140,00	0,002%	1,00	bh	1.038.140,00	1.038.140,00	0,002%	1,00	bh	1.038.140,00	1.038.140,00	0,002%	1,00	bh	1.038.140,00	1.038.140,00	0,002%	1,00	0,002%	-	0,000%	1,00	0,002%
-	Pasang Gate Valve NRS dia. 65 mm	3,00	bh	3.738.000,00	11.214.000,00	0,022%	3,00	bh	3.738.000,00	11.214.000,00	0,022%	3,00	bh	3.738.000,00	11.214.000,00	0,022%	3,00	bh	3.738.000,00	11.214.000,00	0,022%	3,00	bh	3.738.000,00	11.214.000,00	0,022%	3,00	0,022%	-	0,000%	3,00	0,022%
-	Pasang Check Valve 50 A dia. 50 mm	3,00	bh	3.078.000,00	9.234.000,00	0,018%	3,00	bh	3.078.000,00	9.234.000,00	0,018%	3,00	bh	3.078.000,00	9.234.000,00	0,018%	3,00	bh	3.078.000,00	9.234.000,00	0,018%	3,00	bh	3.078.000,00	9.234.000,00	0,018%	3,00	0,018%	-	0,000%	3,00	0,018%
-	Pasang Check Valve 50 A dia. 65 mm	4,00	ea	4.860.000,00	19.440.000,00	0,039%	4,00	ea	4.860.000,00	19.440.000,00	0,039%	4,00	ea	4.860.000,00	19.440.000,00	0,039%	4,00	ea	4.860.000,00	19.440.000,00	0,039%	4,00	ea	4.860.000,00	19.440.000,00	0,039%	4,00	0,039%	-	0,000%	4,00	0,039%
-	Pasang Floating Valve dia. 65 mm	4,00	bh	3.640.000,00	14.560.000,00	0,029%	4,00	bh	3.640.000,00	14.560.000,00	0,029%	4,00	bh	3.640.000,00	14.560.000,00	0,029%	4,00	bh	3.640.000,00	14.560.000,00	0,029%	4,00	bh	3.640.000,00	14.560.000,00	0,029%	4,00	0,029%	-	0,000%	4,00	0,029%
-	Pasang WLC + Pengikatnya																																				
11.3	Pekerjaan Isolasi Air Bersih																																				
11.3.1	Bak Filter																																				
-	Area Taman																																				
1	Instalasi pipa atama air bersih dengan PVM80 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	7,00	m	50.700,00	355.900,00	0,001%	7,00	m	50.700,00	355.900,00	0,001%	7,00	m	50.700,00	355.900,00	0,001%	7,00	m	50.700,00	355.900,00	0,001%	7,00	m	50.700,00	355.900,00	0,001%	7,00	0,001%	-	0,000%	7,00	0,001%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 32 mm	50,00	m'	52.650,00	2.632.500,00	0,005%	50,00	m'	52.650,00	2.632.500,00	0,005%	42,36	m'	52.650,00	2.231.777,35	0,004%	42,36	m'	52.650,00	2.231.777,35	0,004%	42,36	m'	52.650,00	2.231.777,35	0,004%	42,36	0,004%	-	0,000%	42,36	0,004%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 25 mm	34,00	m'	46.000,00	1.564.000,00	0,003%	34,00	m'	46.000,00	1.564.000,00	0,003%	32,36	m'	46.000,00	1.488.662,00	0,003%	32,36	m'	46.000,00	1.488.662,00	0,003%	32,36	m'	46.000,00	1.488.662,00	0,003%	32,36	0,003%	-	0,000%	32,36	0,003%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 20 mm	1,00	m'	32.400,00	32.400,00	0,000%	1,00	m'	32.400,00	32.400,00	0,000%	3,50	m'	32.400,00	113.302,40	0,000%	3,50	m'	32.400,00	113.302,40	0,000%	3,50	m'	32.400,00	113.302,40	0,000%	3,50	0,000%	-	0,000%	3,50	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm	100,00	m'	24.300,00	2.430.000,00	0,005%	100,00	m'	24.300,00	2.430.000,00	0,005%	100,00	m'	24.300,00	2.430.000,00	0,005%	100,00	m'	24.300,00	2.430.000,00	0,005%	100,00	m'	24.300,00	2.430.000,00	0,005%	100,00	0,005%	-	0,000%	100,00	0,005%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 10 mm											37,42	m'	22.274,40	833.674,40	0,002%	37,42	m'	22.274,40	833.674,40	0,002%	37,42	m'	22.274,40	833.674,40	0,002%	37,42	0,002%	-	0,000%	37,42	0,002%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 10 mm																																				
2	Pemasangan Katup - katup dan kelengkapannya	1,00	bh	355.500,00	355.500,00	0,001%	1,00	bh	355.500,00	355.500,00	0,001%	1,00	bh	355.500,00	355.500,00	0,001%	1,00	bh	355.500,00	355.500,00	0,001%	1,00	bh	355.500,00	355.500,00	0,001%	1,00	0,001%	-	0,000%	1,00	0,001%
-	Pasang Gate Valve NRS dia. 100 mm	1,00	bh	313.843,00	313.843,00	0,001%	1,00	bh	313.843,00	313.843,00	0,001%	1,00	bh	313.843,00	313.843,00	0,001%	1,00	bh	313.843,00	313.843,00	0,001%	1,00	bh	313.843,00	313.843,00	0,001%	1,00	0,001%	-	0,000%	1,00	0,001%
-	Pasang Ball Valve NRS dia. 100 mm	1,00	bh	848.380,00	848.380,00	0,001%	1,00	bh	848.380,00	848.380,00	0,001%	1,00	bh	848.380,00	848.380,00	0,001%	1,00	bh	848.380,00	848.380,00	0,001%	1,00	bh	848.380,00	848.380,00	0,001%	1,00	0,001%	-	0,000%	1,00	0,001%
-	Pasang Ball Valve NRS dia. 65 mm	6,00	bh	262.500,00	1.575.000,00	0,003%	6,00	bh	262.500,00	1.575.000,00	0,003%	6,00	bh	262.500,00	1.575.000,00	0,003%	6,00	bh	262.500,00	1.575.000,00	0,003%	6,00	bh	262.500,00	1.575.000,00	0,003%	-	0,000%	6,00	0,003%	6,00	0,003%
3	Pasang Kran Taman dia. 15 mm																																				
4	Bak Instalasi Kran Taman dia. 40x60 cm (0,001 MC/PIPE equil 1 unit/bak)																																				
5	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
-	Total Pipa																																				
6	Instalasi pipa air bersih dengan Polypropylene Random (PPR) 20 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	2,00	m	56.700,00	113.400,00	0,000%	2,00	m	56.700,00	113.400,00	0,000%	-	bh	56.700,00	-	0,000%	-	m	56.700,00	-	0,000%	-	m	56.700,00	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 32 mm	27,00	m'	52.800,00	1.425.600,00	0,002%	27,00	m'	52.800,00	1.425.600,00	0,002%	-	m'	52.800,00	-	0,000%	-	m'	52.800,00	-	0,000%	-	m'	52.800,00	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 25 mm	6,00	m'	46.500,00	162.000,00	0,000%	6,00	m'	46.500,00	162.000,00	0,000%	-	m'	46.500,00	-	0,000%	-	m'	46.500,00	-	0,000%	-	m'	46.500,00	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm	50,00	m'	24.300,00	1.215.000,00	0,002%	50,00	m'	24.300,00	1.215.000,00	0,002%	-	m'	24.300,00	-	0,000%	-	m'	24.300,00	-	0,000%	-	m'	24.300,00	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
-	Pemasangan Katup - katup dan kelengkapannya																																				
7	Ball Valve 100																																				
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 40 mm	2,00	bh	648.500,00	1.362.700,00	0,000%	2,00	bh	648.500,00	1.362.700,00	0,000%	-	bh	648.500,00	-	0,000%	-	bh	648.500,00	-	0,000%	-	bh	648.500,00	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 20 mm	1,00	bh	358.770,00	358.770,00	0,000%	1,00	bh	358.770,00	358.770,00	0,000%	-	bh	358.770,00	-	0,000%	-	bh	358.770,00	-	0,000%	-	bh	358.770,00	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,000%
8	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
-	Total Pipa Jaga																																				
9	Instalasi pipa air bersih dengan Polypropylene Random (PPR) 20 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 20 mm	3,00	m'	40.300,00	121.000,00	0,000%	3,00	m'	40.300,00	121.000,00	0,000%	3,00	m'	40.300,00	121.000,00	0,000%	3,00	m'	40.300,00	121.000,00	0,000%	3,00	m'	40.300,00	121.000,00	0,000%	3,00	0,000%	-	0,000%	3,00	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 20 mm											5,36	m'	37.238,84	199.738,47	0,000%	5,36	m'	37.238,84	199.738,47	0,000%	5,36	m'	37.238,84	199.738,47	0,000%	5,36	0,000%	-	0,000%	5,36	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm	2,00	m'	24.300,00	48.600,00	0,000%	2,00	m'	24.300,00	48.600,00	0,000%	2,00	m'	24.300,00	48.600,00	0,000%	2,00	m'	24.300,00	48.600,00	0,000%	2,00	m'	24.300,00	48.600,00	0,000%	2,00	0,000%	-	0,000%	2,00	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm											0,90	m'	22.274,40	20.046,96	0,000%	0,90	m'	22.274,40	20.046,96	0,000%	0,90	m'	22.274,40	20.046,96	0,000%	0,90	0,000%	-	0,000%	0,90	0,000%
10	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
11.3.2	Pemompaan Air																																				
-	Toilet																																				
1	Instalasi pipa atama air bersih dengan PVM80 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	1,00	m	56.700,00	56.700,00	0,000%	1,00	m	56.700,00	56.700,00	0,000%	1,35	m	56.700,00	76.201,50	0,000%	1,35	m	56.700,00	76.201,50	0,000%	1,35	m	56.700,00	76.201,50	0,000%	1,35	0,000%	-	0,000%	1,35	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	13,00	m	46.500,00	604.500,00	0,001%	13,00	m	46.500,00	604.500,00	0,001%	17,03	m	46.500,00	792.012,30	0,001%	17,03	m	46.500,00	792.012,30	0,001%	17,03	m	46.500,00	792.012,30	0,001%	17,03	0,001%	-	0,000%	17,03	0,001%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 32 mm	16,00	m'	24.300,00	401.700,00	0,001%	16,00	m'	24.300,00	401.700,00	0,001%	16,00	m'	24.300,00	401.700,00	0,001%	16,00	m'	24.300,00	401.700,00	0,001%	16,00	m'	24.300,00	401.700,00	0,001%	16,00	0,001%	-	0,000%	16,00	0,001%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm											11,80	m'	22.274,40	262.844,32	0,000%	11,80	m'	22.274,40	262.844,32	0,000%	11,80	m'	22.274,40	262.844,32	0,000%	11,80	0,000%	-	0,000%	11,80	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm																																				
2	Pemasangan Katup - katup dan kelengkapannya	2,00	bh	355.500,00	711.000,00	0,001%	2,00	bh	355.500,00	711.000,00	0,001%	2,00	bh	355.500,00	711.000,00	0,001%	2,00	bh	355.500,00	711.000,00	0,001%	2,00	bh	355.500,00	711.000,00	0,001%	2,00	0,001%	-	0,000%	2,00	0,001%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 20 mm																																				
3	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
-	Kuang Pulang & Dab																																				
4	Instalasi pipa air bersih dengan Polypropylene Random (PPR) 50 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 25 mm	30,00	m	46.500,00	1.395.000,00	0,002%	30,00	m'	46.500,00	1.395.000,00	0,002%	44,91	m'	46.500,00	1.814.926,50	0,004%	44,91	m'	46.500,00	1.814.926,50	0,004%	44,91	m'	46.500,00	1.814.926,50	0,004%	44,91	0,004%	-	0,000%	44,91	0,004%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 25 mm											4,00	m'	46.500,00	243.006,00	0,000%	4,00	m'	46.500,00	243.006,00	0,000%	4,00	m'	46.500,00	243.006,00	0,000%	4,00	0,000%	-	0,000%	4,00	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 20 mm	6,00	m'	40.300,00	242.000,00	0,000%	6,00	m'	40.300,00	242.000,00	0,000%	7,97	m'	37.238,84	296.814,30	0,000%	7,97	m'	37.238,84	296.814,30	0,000%	7,97	m'	37.238,84	296.814,30	0,000%	7,97	0,000%	-	0,000%	7,97	0,000%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 20 mm											44,46	m'	24.300,00	1.080.378,00	0,002%	44,46	m'	24.300,00	1.080.378,00	0,002%	44,46	m'	24.300,00	1.080.378,00	0,002%	44,46	0,002%	-	0,000%	44,46	0,002%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm	91,00	m'	24.300,00	1.482.300,00	0,003%	91,00	m'	24.300,00	1.482.300,00	0,003%																								
5	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
11.3.3	Lantai 1																																				
-	Ute Wendi, Kran Taman & Pintugang Duggan																																				
1	Instalasi pipa atama air bersih dengan PVM80 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 50 mm	227,00	m	72.900,00	16.546.300,00	0,033%	227,00	m	72.900,00	16.546.300,00	0,033%	225,27	m	72.900,00	16.422.326,80	0,033%	225,27	m	72.900,00	16.422.326,80	0,033%	225,27	m	72.900,00	16.422.326,80	0,033%	225,27	0,033%	-	0,000%	225,27	0,033%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	621,00	m	56.700,00	35.210.700,00	0,070%	621,00	m	56.700,00	35.210.700,00	0,070%	514,71	m	56.700,00	29.184.303,80	0,058%	514,71	m	56.700,00	29.184.303,80	0,058%	514,71	m	56.700,00	29.184.303,80	0,058%	514,71	0,058%	-	0,000%	514,71	0,058%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 32 mm	15,00	m	46.500,00	697.500,00	0,001%	15,00	m	46.500,00	697.500,00	0,001%	51,11	m	46.500,00	2.088.674,50	0,004%	51,11	m	46.500,00	2.088.674,50	0,004%	51,11	m	46.500,00	2.088.674,50	0,004%	51,11	0,004%	-	0,000%	51,11	0,004%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 25 mm	480,00	m'	24.300,00	11.673.400,00	0,023%	480,00	m'	24.300,00	11.673.400,00	0,023%	466,00	m'	24.300,00	11.323.400,00	0,022%	466,00	m'	24.300,00	11.323.400,00	0,022%	466,00	m'	24.300,00	11.323.400,00	0,022%	466,00	0,022%	-	0,000%	466,00	0,022%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm											310,20	m'	22.274,40	6.909.672,18	0,014%	310,20	m'	22.274,40	6.909.672,18	0,014%	310,20	m'	22.274,40	6.909.672,18	0,014%	310,20	0,014%	-	0,000%	310,20	0,014%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm																																				
2	Pemasangan Katup - katup dan kelengkapannya	1,00	bh	857.420,00	857.420,00	0,002%	1,00	bh	857.420,00	857.420,00	0,002%	1,00	bh	857.420,00	857.420,00	0,002%	1,00	bh	857.420,00	857.420,00	0,002%	1,00	bh	857.420,00	857.420,00	0,002%	1,00	0,002%	-	0,000%	1,00	0,002%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 50 mm											7,21	bh	715.601,00	5.159.911,10	0,010%	7,21	bh	715.601,00	5.159.911,10	0,010%	7,21	bh	715.601,00	5.159.911,10	0,010%	7,21	0,010%	-	0,000%	7,21	0,010%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 40 mm	11,00	bh	648.380,00	7.130.180,00	0,014%	11,00	bh	648.380,00	7.130.180,00	0,014%	11,00	bh	648.380,00	7.130.180,00	0,014%	11,00	bh	648.380,00	7.130.180,00	0,014%	11,00	bh	648.380,00	7.130.180,00	0,014%	11,00	0,014%	-	0,000%	11,00	0,014%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 25 mm	3,00	bh	350.590,00	1.052.770,00	0,002%	3,00	bh	350.590,00	1.052.770,00	0,002%	3,00	bh	350.590,00	1.052.770,00	0,002%	3,00	bh	350.590,00	1.052.770,00	0,002%	3,00	bh	350.590,00	1.052.770,00	0,002%	3,00	0,002%	-	0,000%	3,00	0,002%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 15 mm	34,00	bh	209.000,00	6.626.000,00	0,013%	34,00	bh	209.000,00	6.626.000,00	0,013%	34,00	bh	209.000,00	6.626.000,00	0,013%	34,00	bh	209.000,00	6.626.000,00	0,013%	34,00	bh	209.000,00	6.626.000,00	0,013%	34,00	0,013%	-	0,000%	34,00	0,013%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 15 mm	34,00	bh	440.500,00	15.147.000,00	0,030%	34,00	bh	440.500,00	15.147.000,00	0,030%	34,00	bh	440.500,00	15.147.000,00	0,030%	34,00	bh	440.500,00	15.147.000,00	0,030%	34,00	bh	440.500,00	15.147.000,00	0,030%	34,00	0,030%	-	0,000%	34,00	0,030%
3	Pasang Water Meter dia. 15 mm																																				
4	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
-	Toilet 1 (Sampling GMT)																																				
5	Instalasi pipa air bersih dengan Polypropylene Random (PPR) 50 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	25,00	m'	56.700,00	1.417.500,00	0,003%	25,00	m'	56.700,00	1.417.500,00	0,003%	26,23	m'	56.700,00	1.487.241,00	0,002%	26,23	m'	56.700,00	1.487.241,00	0,002%	26,23	m'	56.700,00	1.487.241,00	0,002%	26,23	0,002%	-	0,000%	26,23	0,002%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 32 mm	26,00	m'	52.800,00	1.372.800,00	0,002%	26,00	m'	52.800,00	1.372.800,00	0,002%	25,46	m'	52.800,00	1.344.626,40	0,002%	25,46	m'	52.800,00	1.344.626,40	0,002%	25,46	m'	52.800,00	1.344.626,40	0,002%	25,46	0,002%	-	0,000%	25,46	0,002%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 25 mm	67,00	m'	24.300,00	1.628.100,00	0,003%	67,00	m'	24.300,00	1.628.100,00	0,003%	55,00	m'	24.300,00	1.336.722,00	0,002%	55,00	m'	24.300,00	1.336.722,00	0,002%	55,00	m'	24.300,00	1.336.722,00	0,002%	55,00	0,002%	-	0,000%	55,00	0,002%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 15 mm																																				
6	Pemasangan Katup - katup dan kelengkapannya	4,00	bh	646.500,00	2.586.000,00	0,005%	4,00	bh	646.500,00	2.586.000,00	0,005%	4,00	bh	646.500,00	2.586.000,00	0,005%	4,00	bh	646.500,00	2.586.000,00	0,005%	4,00	bh	646.500,00	2.586.000,00	0,005%	4,00	0,005%	-	0,000%	4,00	0,005%
-	Pasang Ball Valve 100 dia. 40 mm																																				
7	Fixture unit (WC, Washbsin, Kitchen Sink, Urinoir, Jet S																																				
-	Hand Shower, Shower, Jacitor, Kran taman) (dikaya wrafish)																																				
-	Toilet 2 (Sampling Ruang Pelatihan)																																				
8	Instalasi pipa air bersih dengan Polypropylene Random (PPR) 50 - PN10																																				
-	termasuk galian/timbunan, support, fitting dan aksesorisnya :																																				
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 40 mm	21,00	m'	56.700,00	1.204.100,00	0,000%	21,00	m'	56.700,00	1.204.100,00	0,000%	21,91	m'	56.700,00	1.242.240,30	0,002%	21,91	m'	56.700,00	1.242.240,30	0,002%	21,91	m'	56.700,00	1.242.240,30	0,002%	21,91	0,002%	-	0,000%	21,91	0,002%
-	Pasang PVM80 - PN10 dia. 32 mm	20,00	m'	52.800,00	1.074.200,00	0

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

BIC	Description of Work	Quantity	Unit	Rate	Amount	Quantity	Unit	Rate	Amount	Quantity	Unit	Rate	Amount	Quantity	Unit	Rate	Amount	Quantity	Unit	Rate	Amount	Quantity	Unit	Rate	Amount	Quantity	Unit	Rate	Amount
001	Drawing: PRTV Drawings Drawing Upward Rate	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00
2	Drawing: MCV Drawings Upward Drawing Rate	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00	1.00	nos	80,000.00	80,000.00
3	Drawing: Drawing Upward Rate	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00
-	Add Dimension for Years																												
4	Drawing: TC Drawing Duty Rate	2.00	nos	2,500.00	5,000.00	2.00	nos	2,500.00	5,000.00	2.00	nos	2,500.00	5,000.00	2.00	nos	2,500.00	5,000.00	2.00	nos	2,500.00	5,000.00	2.00	nos	2,500.00	5,000.00	2.00	nos	2,500.00	5,000.00
-	Drawing: Drawing Rate	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00
5	Drawing: Drawing Rate	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00	1.00	nos	5,000.00	5,000.00
-

Page 25-of-25

| | | |

| NO | DESIGNS REQUIREMENTS | | |

| NO | DESIGN PARAMETERS | | |

| NO | DESIGN DESCRIPTION | MATERIAL | | |

NO	DESCRIPTION OF WORK	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
	TOTAL PRELIMINARY																																								
	JOB NO. 1 PRELIMINARY LABOUR COST																																								
-	Temporary drainage diversion in Canal 3000 + 7000 & 7100 + 7170 + 7270 & 7370

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC-0					MC-1					MC-2					MC-3					MC-4					MENGANGGUR		MENGAWAS		MENGAWAS	
		KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA JUMLAH	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA JUMLAH	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA JUMLAH	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA JUMLAH	BOBOT (%)	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA JUMLAH	BOBOT (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)

ARSS BARU PT. INTIMULYA MULTIKENCANA	Pemilik : KEMENTERIAN PU SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN D.I. YOGYAKARTA No. Dok : [redacted] No. Rev : - Tanggal : 17 September 2025	Abadi Prima Intikarya

DOKUMENTASI

Nama Proyek	: PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA
Lokasi	: JL. C. SIMAJUNTAK NO.21,TERBAN, KEC. GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA
Periode Bulan ke	: 13 (TIGA BELAS) Tgl : 01 September 2025 sd 16 September 2025
Tahapan Pekerjaan	: Pekerjaan Arsitektur, MEP

ARSS BARU PT. INTIMULYA MULTIKENCANA KONSULTAN REKAYASA TEKNIK	Pemilik : KEMENTERIAN PU SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN D.I. YOGYAKARTA No. Dok : [redacted] No. Rev : - Tanggal : 17 September 2025	Abadi Prima Intikarya

DOKUMENTASI

Nama Proyek	: PROYEK RENOVASI PASAR TERBAN YOGYAKARTA
Lokasi	: JL. C. SIMAJUNTAK NO.21,TERBAN, KEC. GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA
Periode Bulan ke	: 13 (TIGA BELAS) Tgl : 01 September 2025 sd 16 September 2025
Tahapan Pekerjaan	: Pekerjaan Arsitektur, MEP
