Tidsplan for kortlægningsområde Djurs Vest.

Delaftale	Blok	Delopgave	Aktiviteter
Trin 1			
3	1	a-d	Dataindsamling 1
	2	a-c	Dataindsamling 2
	3	a-e	Sammenstilling af data
	4	a-d	Rapport og afslutning
	Forslag til møder		
Boringsregistreringer og pejlinger			
4	1	a,b,c og e	Gennemgang, vurdering og pejling af brønde/boringer
	2	a	Indmåling af pejlbare boringer og brønde
	3	a-c	Planlægning/gennemførelse af synkronpejling
	4	a-c	Rapportering og indberetning af data
	Forslag til møder		
Vandprøvetagning			
18	1		Planlægning
			Udtagning af vandprøver der pejles
			Udtagning af vandprøver der ikke pejles
			Kontrol af analyse resultater og rapportering
Geologiske modeller			
19	1	a	Geologisk forståelsesmodel
	Forslag til møder		
Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder (option)			
21	1	a	Arealanvendelse og planmæssige forhold
	2	a-c	Landbrugets forureningskilder
	3	a	Øvrige forureningskilder
	4	b	Afrapportering
	Forslag til møder		
Punktkilder			
22	1	a-d	Indsamling af data og litteraturgennemgang
	2	a og b	Samstilling og prioritering
	3	a og c	Rapport
	Forslag til møder		
Forslag til møder			

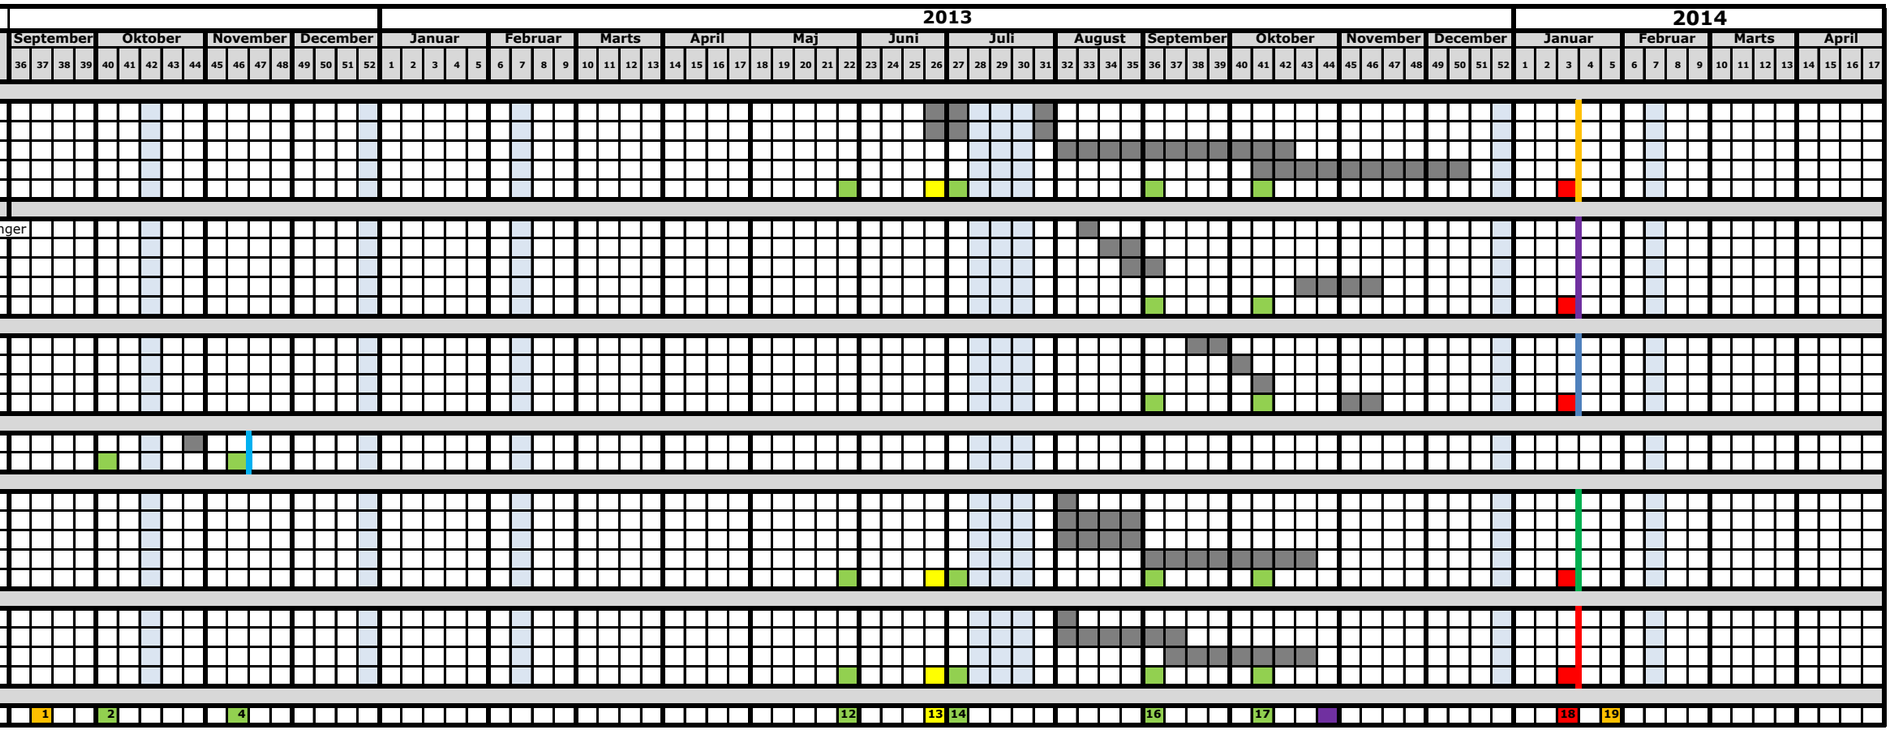

Perioder med ferie	Milepæl A
Opstarts- / afslutningsmøde	Milepæl B
Arbejdsmøder	Milepæl C
Følgegruppemøde	Milepæl D
Milepælsmøde hos NST	Milepæl E
Feltekskursion	Milepæl F
